



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
SINALOYA**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

NOVIEMBRE 2016

SCT SINALOA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

Obras

MDP

Km

A la fecha, la SCT invierte

160

11,648.1

12,364.4

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



72 CARRETERAS



74 CAMINOS RURALES



2 FERROVIARIO




6 PUERTOS



4 AEROPUERTOS


ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

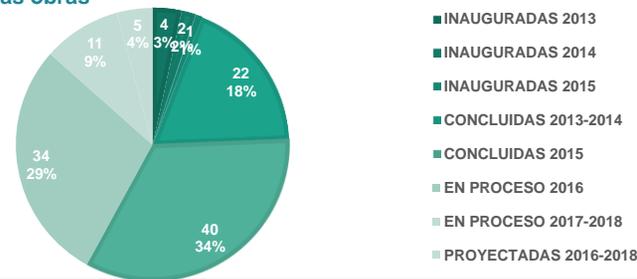

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		251,407.0	251,407.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		251,407.0	251,407.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL		231,853.0	231,853.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		18.0	18.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		18.0	18.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	51.40	51.52	52.60	155.52
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	18	18	18	18
JORNALES	609,272	571,062	518,572	1,698,906
BENEFICIARIOS	14,687	16,186	19,860	50,733
LONGITUD CAMINOS	1,269.89	1,151.10	477	2,420.99

Fecha de recepción: Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante Oficio No.: SCT. 6.24.01.2622/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante el Oficio No. 6.0.1-1643/2016 enviado por la DGAPDCST

AVANCE EN PROGRAMAS

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,954			1,954
INMUEBLES ESCOLARES	1,608			1,608
CENTROS DE SALUD	150			150
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	117			117
OFICINAS DE GOBIERNO	74			74
ESPACIOS PÚBLICOS	4			4
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	1			1

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	1,901	45	0
INAUGURADAS 2015	1	1,758	38	0
CONCLUIDAS 2015	1	143	7	0
CARRETERAS FEDERALES	72	2,545	8,664	0
INAUGURADAS 2013	4	312	4	0
CONCLUIDAS 2013-2014	5	733	17	0
CONCLUIDAS 2015	19	494	6,047	0
EN PROCESO 2016	23	551	2,400	0
EN PROCESO 2017-2018	1	311	9	0
CONCLUIDAS 2016	20	144	187	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	74	2,930	3,628	0
INAUGURADAS 2014	1	22	8	0
CONCLUIDAS 2013-2014	15	499	99	0
CONCLUIDAS 2015	20	567	178	0
EN PROCESO 2016	11	119	24	0
EN PROCESO 2017-2018	6	1,421	2,855	0
CONCLUIDAS 2016	21	301	464	0
FERROVIARIO	2	1,654	27	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	28	2	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1,626	24	0
PUERTOS	6	2,537	1	0
INAUGURADAS 2014	1	200	0	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	70	-	0
EN PROCESO 2017-2018	1	1,389	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	3	878	1	0
AEROPUERTOS	4	81	-	0
EN PROCESO 2017-2018	3	71	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	10	-	0
Total general	160	11,648	12,364	0



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	PASO DEPRIMIDO ENTRE LOS BOULEVARES LOLA BELTRAN Y ROLANDO ARJONA	08/10/2012	15/09/2013	114.00	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN INAUGURADA 01-SEP-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN.	0.47	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450021	0
2	PASO DEPRIMIDO JESUS KUMATE	08/10/2012	29/10/2013	108.70	INAUGURADA 01-NOV-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.48	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450022	0
3	ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 15 BLVD. LOLA BELTRAN.	09/09/2013	23/12/2013	59.80	INAUGURADA 22-DIC-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	2.23	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	13096450022	0
4	PASO DEPRIMIDO VILLAS DEL RIO.	16/07/2013	30/11/2013	29.40	INAUGURADA 01-NOV-13 POR GOBERNADOR DEL ESTADO Y PRESIDENTE MUNICIPAL	0.60	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450027	0
5	INSTALACION PARA GRANEL AGRICOLA TOPOLOBAMPO	01/09/2013	30/11/2014	200.00	INAUGURADA 09-DIC-14	0.11	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	0609J2W0009	PNI082
6	E.C. NAVOLATO- EL CASTILLO-LA CURVA- SAN PEDRO	22/04/2014	21/08/2014	21.93	RECURSOS FONDEN	8.00	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
7	LIBRAMIENTO MAZATLAN DE CUOTA	01/02/2012	31/12/2014	1,758.00	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION, LA TRONCAL YA SE PUSO EN OPERACIÓN, FALTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMALES. INAUGURADA 29-ABR-15	38.00	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI488
8	PUENTE RIO BALUARTE CARRETERA: TEPIC – MAZATLAN, TRAMO: LIM.EDOS.NAY./SIN.-MAZATLAN KM. 221+278	01/11/2013	30/11/2014	268.46	CONTRATO 201425CBA066W002014 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA CARATULA Y TARJETA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS. COORD. FINAL LATITUD: 22.99710 Y LONG: -105.851	0.72	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13092110006	0
9	ACCESO NORTE KM 4+460 AL 13+900	16/10/2010	30/11/2013	215.00		9.44	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	12096450020	0
10	PSV ENTRADA NORTE DE MAZATLAN	01/10/2012	31/07/2013	145.00	NO ES SUSCEPTIBLE DE INAUGURAR OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN	0.58	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	10096450015	0
11	SAN PEDRO- NAVOLATO	01/05/2014	01/12/2014	76.50	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE.	14.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
12	CARRETERA: CULIACAN – LOS MOCHIS TRAMO: ACCESO NORTE DE CULIACAN DEL KM. 13+900 AL KM. 16+000	16/04/2014	30/11/2014	70.50		2.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	10096450008	0
13	CONSTRUCCION DEL MUELLE PARA CRUCEROS	04/02/2013	10/03/2014	70.00		400 M2	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
14	VILLA UNION LA AMAPA	01/06/2013	01/06/2014	60.09	2013 Y 2015 MEDIANTE CONVENIO DE RECURSOS A GOB DEL EDO SE MODERNIZARON 4.6 KMS CON 25.0 MDP Y 3.9 KMS CON 14.7 MDP RESPECTIVAMENTE. EL CENTRO SCT EN 2014 MODERNIZO 4.5 KMS CON	13.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450002	0
15	IMALA - SANALONA.	01/04/2013	01/06/2014	56.69	N/A	9.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450001	0
16	CULIACAN-NAVOLATO (TR. CULIACAN-SAN PEDRO) 0+000 - 9+000	16/05/2014	15/09/2014	56.06	RECURSOS FONDEN	9.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
17	DIMAS - BARRAS DE PIAXTLA	01/05/2013	01/06/2014	41.15	2013: 3.2 KMS Y 8.51 MDP 2014: 2.5 KMS Y 10.2 MDP	8.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450029	0
18	CARRETERA ANGOSTURA-SALVADOR ALVARADO.	01/05/2013	01/12/2013	34.08	N/A	3.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13096450015	0
19	BACHIMETO-ROSA MORADA	18/08/2014	18/12/2014	31.20	FONDOS FONDEN	11.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
20	PUENTE: PORTACELI	01/11/2012	01/12/2013	30.00	N/A	0.27	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450019	0
21	CONSTRUCCION DE ESPUELAS PARA FFCC	18/03/2014	30/12/2014	28.23	N/A	2.40	CONCLUIDAS 2013-2014	FERROVIARIO	1109J2W0006	0
22	CONSTRUCCION TAMAZULA EL AMOLE.	01/08/2013	01/08/2014	27.90	INVERSIÓN 2013: 7.78 MDP 2.4 KMS 2014: 9.91 MDP 2.2 KMS	6.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450014	0
23	VILLA MORELOS - LA CURVA (5.9 KM).	01/09/2013	01/06/2014	24.06	INVERSIÓN 2013: 10.56 MDP Y 4.0 KMS 2014: 6.60 MDP Y 4.0 KMS	5.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450020	0
24	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ARRAYANES CHELE.	01/10/2013	01/06/2014	21.46	AÑO 2013 SE INVIRTIERON 6.07 MDP. AÑO 2014 SE INVIRTIERON 10.35 MDP	0.12	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450010	0
25	EL VERGEL - COL. HIDALGO - LAS AGUAMITAS	05/05/2014	04/09/2014	19.29	FONDOS FONDEN INVERSIÓN 2012: 6.6 MDP 2.6 KMS	7.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
26	E.C. INTERNACIONAL MEXICO 15 - LOS ANGELES DEL TRIUNFO	01/05/2012	01/08/2014	18.54	INVERSIÓN 2014: 4.9 MDP 1.4 KMS INVERSIÓN 2015 MEDIANTE CONVENIO DE REASIGNACIÓN A GOB DEL ESTADO: 14 MDP 7	5.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450006	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
27	EL PROGRESO-EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	01/05/2012	01/08/2014	17.99	AÑO 2012 SE INVIRTIERON 12.17 MDP PARA 3.0 KMS. AÑO 2014 SE INVIRTIO 4.5 MDP PARA 1.2 KMS.	4.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450008	0
28	E.C.F. MEXICO 15 - BEBELAMA DE SAN LORENZO.	01/08/2013	01/12/2013	14.06	N/A	2.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450004	0
29	CARRETERA MEXICO 15 - EL MORAL.	01/05/2013	01/09/2013	4.00	OBRA REALIZADA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS EN 2013 POR 4.0 MDP.	0.78	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450011	0
30	AUTOPISTA BENITO JUAREZ CUERPO A KM.107+000 AL 110+00	05/08/2014	28/02/2015	143.34	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE	7.00	CONCLUIDAS 2015	AUTOPISTAS		0
31	TRABAJOS FALTANTES PIV PEDRO INFANTE	16/04/2015	10/11/2015	126.40	EN PROCESO DE FORMALIZAR LAS ACTAS DE CIERRE DEL CONTRATO.	0.44	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092100005	0
32	PSV GABRIEL LEYVA	01/06/2015	31/12/2015	100.30	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE FORMALIZAR LAS ACTAS DE CIERRE DEL CONTRATO.	1.40	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096450014	0
33	PSV ENTRADA SUR MAZATLAN	01/06/2015	31/12/2015	94.40	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE FORMALIZAR LAS ACTAS DE CIERRE DEL CONTRATO.	1.10	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096450013	0
34	BADIRAGUATO-SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	01/06/2014	31/03/2015	89.30	SE REALIZO CONTRATO POR 89.3 MDP PARA 8.0 KMS DE LOS CUALES SE EJERCIERON SOLO 47.12 MDP YA QUE LA SHCP REALIZO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS.EN 2015 SE PAGO ADEUDO 2014 POR 8.13 MDP	8.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096450004	0
35	CAIMANERO-EL TIGRE- CONSTITUYENTES- COL. INDEPENDENCIA	22/05/2014	31/03/2015	74.70	FONDOS FONDEN ESTE CONTRATO SE MANDO A JURÍDICO PARA SU RECLAMACIÓN DE FIANZA.	28.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
36	SINALOA DE LEYVA- OCORONI	04/08/2014	15/02/2015	69.70	FONDOS FONDEN	25.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
37	E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL – PROTOMARTIR	16/05/2014	31/03/2015	64.63	FONDOS FONDEN ESTE CONTRATO SE MANDO A JURÍDICO PARA SU RECLAMACIÓN DE FIANZA.	23.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
38	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM, TR LIM. DGO./SIN-T VILLA UNION	16/04/2015	15/10/2015	45.46	CONTRATO 201525CBA029W002515 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS. COORD. DE TERMINO LAT: 23.42147 Y LONG: -105.86	18.20	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
39	PROTOMARTIR-GATO DE LARA	18/08/2014	15/01/2015	41.92	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE	14.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
40	E.C. ANGOSTURA- LA REFORMA- COSTA AZUL	16/05/2014	31/03/2015	41.27	FONDOS FONDEN ESTE CONTRATO SE MANDO A JURÍDICO PARA SU RECLAMACIÓN DE FIANZA.	15.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
41	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN BACHEO Y CARPETA DE 10.0 CM., TRAMO LIM. NAY./SIN.-MAZATLAN,	29/04/2015	13/10/2015	31.18	CONTRATO 201525CBA028W002515 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y CIERRE ADMINISTRATIVO (OF SCT 6 24 413 073 Y ANEXOS). COORD. DE TERMINO LAT.23	13.30	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
42	CONSERVACION PERIODICA , TRAMO LIM. DGO./SIN. - T VILLA UNION,	12/05/2015	11/10/2015	26.18	CONTRATO 201525CBA032W002515 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS, COORD. DE TERMINO. LAT.23.40265 Y LONG.-105.92030	10.80	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
43	GUASAVE-TAMAZULA	01/09/2015	30/11/2015	20.64		6.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
44	AGUARUTO-SAN MANUEL-AUTOPISTA (CULIACÁN-MAZATLÁN)	01/09/2015	30/11/2015	20.49		6.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
45	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	01/09/2015	30/11/2015	13.52		7.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
46	CULIACAN-SANALONA DEL KM 19+800 AL KM 23+000.	24/03/2015	21/07/2015	12.76	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
47	VILLA UNION-WALAMO-LOS POZOS DEL KM 4+500 AL KM 10+500 T.A.	25/03/2015	22/07/2015	12.76	OBRA CON CIERRE ADMINISTRATIVO	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
48	EJIDO PLAN DE SAN LUIS-BACHOMOBAMPO 2	01/07/2015	15/11/2015	12.66	ACTAS DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS EN PROCESO DEBIDO A PAGOS PENDIENTES A EMPRESA.	8.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
49	ACCESO AL QUELITE ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 AL POBLADO DEL QUELITE	01/09/2015	30/11/2015	12.49	ACTAS DE FINIQUITO Y ADMINISTRATIVAS EN PROCESO DEBIDO A PAGOS PENDIENTES A LA EMPRESA.	5.10	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
50	MEXICO 15 -SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 6+100 EN TRAMOS AISLADOS;	16/03/2015	13/07/2015	12.41	N/A	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
51	CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5.0 CM COMPACTOS DEL KM 171+920 AL KM 175+380 Y DEL KM 177+075 AL KM. 177+346 CUERPO "A" DE LA CARRETERA CULIACÁN – LOS MOCHIS CON UNA META DE 5.73 KM,	01/09/2015	31/10/2015	12.15	"CONTRATO 201525CBA061W002515 CAMPO DOCUMENTOS FUENTES INCLUYE TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS, COORD. TERMINO: LAT: 25.7246527778 Y LONG: -108.7453972222	5.73	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
52	E.C. INT. - COMPUERTAS -E.C. L.M.-AHOME DEL KM 2+000 AL KM 5+400.	24/03/2015	21/07/2015	12.11	N/A	3.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
53	CULIACANCITO - ENTRONQUE A EL TAMARINDO DEL KM 8+800 AL KM 12+300.	24/03/2015	21/07/2015	11.88	N/A	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
54	E.C.(MEX 15-EST. DIMAS)-PIAXTLA DE ABAJO DEL Y MEXICO 15-ESTACION DIMAS DEL KM 13+500 AL KM 16+200.	25/03/2015	22/07/2015	11.56	N/A	3.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
55	MEXICO 15 - ESTACION DIMAS DEL KM 17+800 AL KM 21+800 ; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA	25/03/2015	22/07/2015	11.44	NA.	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
56	MEXICO 15-EJ. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 2+000 AL KM 5+700	27/03/2015	24/07/2015	11.09	NA.	3.70	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
57	PLAYA COLORADA-EL EBANO	01/09/2015	30/11/2015	9.50		2.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
58	BARRERA DE PROTECCION PARA NIVEL DE CONTENCIÓN 4 O SUPERIOR, EN RED FEDERAL DE CARRETERAS 5350 M	01/04/2015	15/10/2015	7.48	CONTRATO 201525CBA022W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCION. COORD. DE TERMINO, LAT.23.18940 Y LONG: -106.20913	5449.0 M.L.	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
59	TRABAJOS DE ATENCIÓN A DOS PUNTOS DE CONFLICTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES, PUENTE JUAN JOSÉ RÍOS Y PUENTE LEYVA SOLANO	16/11/2015	31/12/2015	7.40	CONTRATO 201525CBA005W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, OBRA EN PROCESO. COORD LEYVA SOLANO LATITUD. 25.8815583333 LONGITUD. -106.041014444	2 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	0
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, 2DA. ETAPA.	01/04/2015	15/10/2015	6.28	CONTRATO 201525CBA021W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERCHOS.CORRD. DE TERMINO LAT.23.18940 Y LONG.-106.20913	139.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, 1RA. ETAPA.	01/04/2015	15/10/2015	6.25	CONTRATO 201525CBA020W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERCHOS, COORD. DE TERMINO LAT.23.26387 Y LONG.-106.41369	139.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
62	RENIVELACION Y MICROCARPETA PASO POR EL BURRION	16/04/2015	15/07/2015	6.14	CONTRATO 201525CBA026W002515 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO Y FINIQUITO COORDENADAS DE TERMINO: LATITUD: 25.5532277778	5.60	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
63	CONSERVACION DE TRAMOS, TR LIM. NAY./SIN-MAZATLAN, CARRETERA TEPIC-MAZATLAN	16/02/2015	30/11/2015	5.53	CONTRATO 201525CBA002W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA CARATULA Y TARJETA DEL CONTRATO Y ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS, COORD. DE TERMINO LAT:23.02640	83.87	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
64	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE DE SINALOA	01/04/2015	15/10/2015	5.01	CONTRATO 201525CBA023W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO Y FINIQUITO, COORD. DE TERMINO LAT.23.18940 Y LONG.-106.20913	5,400.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
65	CONSERVACION DE TRAMOS EN 92.40 KM,TR LIM. DGO. /SIN. – ENT. VILLA UNION, CARRETERA DURANGO	16/02/2015	30/11/2015	4.98	CONTRATO 201525CBA003W002015 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA CARATULA Y TARJETA DEL CONTRATO, COORD. DE TERMINO LAT.23.26387, LONG.-106.41369	92.40	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
66	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.9 KM,TR LIM.DGO/SIN.–ENT.VILLA UNION, CARRETERA DGO-MAZATLAN.	16/02/2015	30/11/2015	3.96	CONTRATO 201525CBA004W002015 CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS, COORD. DE TERMINO LAT.23.18940 Y LONG: -106.20913	95.90	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
67	CONSERVACION DE 37.50 KM, DE RED SECUNDARIA,TR PERICOS-BADIRAGUATO CARRETERA PERICOS-PARRAL +	16/02/2015	30/11/2015	2.30	CONTRATO 201525CBA005W002015 CAMPO DOCUMENTOS FUENTES INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS, COORD. DE TERMINO LATITUD: 25.3794444444 Y LONGITUD: -107.5408444444	37.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
68	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE GRANULOMETRÍA DENSA EN T.A. DEL KM 162+555 AL KM 179+000, TRAMO: LIM. EDOS. NAY./SIN.- MAZATLÁN, CON UNA META DE 1.59 KM	16/07/2015	31/07/2015	2.27	CONTRATO 201525CBA050W002515 EN EL CAMPO DE DOCUMENTOS FUENTES SE INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO Y EL ACTA DE EXT DE DERECHOS Y OBLIGACIONES COORD. DE TERMINO LAT.22.72134 LONG:-105.61707	1.59	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
69	CONSERVACION EN 40 PUENTES, TRAMOS LIM.NAY./SIN. CARRETERA TEPIC-MAZATLAN,	16/04/2015	30/11/2015	0.79	CONTRATO 201525CBA025W002515 CAMPO DOCUMENTOS FUENTES INCLUYE LA TARJETA Y CARATULA DEL CONTRATO, FINIQUITO Y ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS, COORD. DE TERMINO LAT.23.26387 Y LONG.-106.41369	40 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110005	0
70	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUASAVE-LAS GLORIAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+200	01/06/2015	30/06/2016	67.70	OBRA CON RECURSOS FONDEN SUSPENSIÓN TEMPORAL EN TRAMITE POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.	29.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
71	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	16/03/2016	29/09/2016	28.00		107.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096450004	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
72	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	18/04/2016	17/08/2016	27.85	OBRA CONTRATADA 201625CBA046W002016, LATITUD TERMINO: 23.19255 Y LONGITUD DE TERMINO: -106.24513	17.40	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
73	ALCOYONQUI-LAS FLECHAS	01/03/2016	14/09/2016	21.12		4.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096450003	0
74	ILAMA- HIGUERAS DE JACOBA, TRAMO LA ILAMA - LA PRESA.	01/03/2016	12/10/2016	20.00	OBRA CONTRATADA	4.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096450015	0
75	Angostura-Guamuchil	18/03/2016	03/10/2016	19.20	OBRA CONCLUIDA CON CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO	1.95	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450002	0
76	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	01/05/2016	14/08/2016	17.75	OBRA CONTRATADA 201625CBA049W002016, LATITUD TERMINO: 26.1577972222222 Y LONGITUD TERMINO: -109.050833333333	11.42	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
77	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	01/05/2016	14/08/2016	16.22	OBRA CONTRATADA 201625CBA050W002016, LATITUD TERMINO: 26.0536888888889 Y LONGITUD TERMINO: -109.017655555556	7.60	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
78	E.C. INT. COMPUERTAS-E.C. L.M.-AHOME	16/02/2016	30/06/2016	12.48	OBRA CONCLUIDA, CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO POR ADEUDOS.	1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
79	ESCUINAPA - TEACAPAN	01/08/2016	31/10/2016	11.46	INICIÓ EL 01/08/2016	2.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
80	MÉXICO 15 - EL RECODO	01/08/2016	31/10/2016	11.08	INICIÓ EL 01/08/2016	3.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
81	FRESADO DE 10.0 CM Y CARPETA DE 10.0 CM	16/06/2016	15/09/2016	10.82	OBRA CONTRATADA 201625CBA068W002016, LATITUD DE TERMINO 23.199289 Y LONGITUD DE TERMINO -106.359919.	9.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
82	MÉXICO 15-EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	16/02/2016	30/06/2016	10.50	OBRA CONCLUIDA CON CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO POR ADEUDOS	2.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
83	CULIACÁN-SANALONA	16/02/2016	30/06/2016	10.20	OBRA CONCLUIDA CON CIERRE ADMINISTRATIVO	3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
84	MOCORITO-SAN BENITO	01/03/2016	31/08/2016	9.60	OBRA CONTRATADA DEL KM 23+800 AL KM 25+200 POR ESTE CENTRO, Y EN PROCESO DEL KM 23+000 AL KM 23+800 POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE REASIGNACIÓN	14.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450005	0



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
85	E.C. MEXICO 15-15 DE SEPTIEMBRE-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	01/03/2016	15/10/2016	9.60		2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450004	0
86	CINCO DE MAYO-JUAN ALDAMA	01/03/2016	31/08/2016	9.60	OBRA CONCLUIDA CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO	3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450017	0
87	ROSA MORADA-AGUA PEPITO	01/03/2016	31/08/2016	9.60	OBRA CONTRATADA	2.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450002	0
88	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	16/04/2016	15/09/2016	9.50	OBRA CONTRATADA	3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
89	E.C. (EL FUERTE-CHOIX) EL BABU-BAYMENA	19/04/2016	20/10/2016	9.21		1.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096450009	0
90	CALLE 5,, TRAMO: E.C. INT. MÉXICO 15-CALLE 300	01/03/2016	31/08/2016	9.21	OBRA CONTRATADA	2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096450016	0
91	E.C. PERICOS-RECOVECO-ESTACION RETES	04/07/2016	02/11/2016	8.30	OBRA EN PROCESO	4.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
92	CALLE 800, VALLE DEL CARRIZO	01/03/2016	31/08/2016	7.68	OBRA CONTRATADA	2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096450012	0
93	FRESADO Y MICROCARPETA DE 3.0 CM.	23/03/2016	30/06/2016	7.51	OBRA CONTRATADA 201625CBA025W002016, LATITUD DE TERMINO: 25.2529861111111 Y LONGITUD: -107.624561111111	8.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
94	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	15/02/2016	13/07/2016	7.38	OBRA CONTRATADA 201625CBA009W002016, COORD. DE TERMINO LAT.25.8294055555556 Y LONG -108.969838888889	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
95	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	26/06/2016	6.54	OBRA CONTRATADA 201625CBA027W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.31125 Y LONGITUD: -106.00854	21.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
96	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	26/06/2016	6.44	OBRA CONTRATADA 201625CBA026W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.16007 Y LONGITUD: -106.08683	23.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
97	RENIVELACIONES AISLADAS Y RIEGO DE SELLO	16/06/2016	14/09/2016	5.95	OBRA CONTRATADA 201625CBA066W002016, LATITUD DE TERMINO 25.800067 Y LONGITUD DE TERMINO -108.943853.	13.25	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
98	RIEGO DE SELLO	31/03/2016	14/07/2016	5.46	OBRA CONTRATADA 201625CBA029W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.47949 Y LONGITUD: -105.83604	17.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
99	MICROCARPETA DE 3.0 CM.	29/03/2016	11/06/2016	5.10	OBRA CONTRATADA 201625CBA028W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.2882 Y LONGITUD: -106.0594	7.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
100	CONSERVACIÓN RUTINARIA AHOME, FUERTE, CHOIX	16/02/2016	30/06/2016	4.50		270.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
101	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	11/06/2016	4.45	OBRA CONTRATADA 201625CBA30W002016, LATITUD DE TERMINO: 22.5528 Y LONGITUD: -105.55753	12.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
102	FRESADO DE 5.0 CM Y CARPETA DE 5.0 CM	16/06/2016	30/08/2016	3.81	OBRA CONTRATADA 201625CBA067W002016, LATITUD DE TERMINO 23.167694 Y LONGITUD DE TERMINO -106.272633.	3.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
103	RIEGO DE SELLO	31/03/2016	29/05/2016	3.72	OBRA CONTRATADA 201625CBA31W002016, LATITUD DE TERMINO: 24.02931 Y LONGITUD: -106.78024	9.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
104	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMPLIACIÓN TRANSVERSAL	01/05/2016	15/08/2016	3.47	OBRA CONTRATADA 201625CBA047W002016, LATITUD TERMINO: 24.265 Y LONGITUD TERMINO: -107.072333333333	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0
105	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUSTITUCIÓN DEL PREESFUERZO LONGITUDINAL EXTERNO	01/05/2016	30/07/2016	3.44	OBRA CONTRATADA 201625CBA048W002016, LATITUD TERMINO: 22.5301666666667 Y LONGITUD TERMINO: -105.445833333333	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0
106	TAMAZULA EL AMOLE	01/03/2016	31/08/2016	2.80	OBRA CONCLUIDA CON CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO	0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450014	0
107	SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/03/2016	28/07/2016	2.51	OBRA CONTRATADA 201625CBA010W002016, COORD. DE TERMINO LAT.25.8294055555556 Y LONG -108.969838888889	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
108	FRESADO Y MICROCARPETA	16/06/2016	31/07/2016	2.50	OBRA CONTRATADA 201625CBA073W002016, LATITUD DE TERMINO 25.806947 Y LONGITUD DE TERMINO -108.955916.	1.20	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
109	CONSTRUCCIÓN DE 5 PARADEROS DE AUTOBUSES	16/06/2016	29/09/2016	1.48	OBRA CONTRATADA 201625CBA070W002016.	26.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
110	BARRERA DE PROTECCIÓN	16/03/2016	28/07/2016	1.31	OBRA CONTRATADA 201625CBA021W002016, LATITUD TERMINO: 24.6328222222222 Y LONGITUD TERMINO: -107.267269444444	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
111	MODERNIZACION ENTRONQUE MEXICO 15-AHOME	01/10/2014	dic-16	375.00	OBRA EN PROCESO: PRIMERA ETAPA CON UNA INVERSIÓN DE 55.5 MDP, CONCLUIDA; SEGUNDA ETAPA CON UNA INVERSIÓN DE 111.7 MDP, CONCLUIDA; TERCERA ETAPA CON UNA INVERSIÓN	9.2	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	12096450020	0
112	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECUPERACION DE PAVIMENTO Y CARPETA	01/09/2016	24/12/2016	28.00	KM 122+000 AL KM 132+000 CPO. "B" CARRETERA CULIACÁN-LOS MOCHIS, CON UNA META DE 10.00 KM, EN EL ESTADO DE SINALOA 2016 25 CB A 084 W 00 2016	--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
113	RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO	16/06/2016	30/11/2016	24.19	OBRA CONTRATADA 201625CBA065W002016, LATITUD DE TERMINO 26.399025 Y LONGITUD DE TERMINO -109.011119.	49.47	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
114	PUENTE EL QUELITE - MARMOL	16/04/2016	nov-16	19.20		10	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450015	0
115	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECICLADO EN PLANTA EN CALIENTE (RAP)	01/08/2016	01/12/2016	17.05	OBRA CONTRATADA 201625CBA078W002016. LATITUD DE TERMINO Y LONGITUD DE TERMINO.	--	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
116	E.C. MEXICO 15-RANCHO VIEJO-ENTRONQUE AUSTOPISTA BENITO JUAREZ	16/04/2016	15/11/2016	14.40	OBRA CONTRATADA	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096450007	0
117	PUENTE ULTIMO VADO	16/04/2016	15/11/2016	14.40	INICIO EL 16 DE ABRIL DEL 2016	PUENTE	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450006	0
118	PUENTE LAS HABITAS	16/04/2016	15/11/2016	14.40		PUENTE	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096450005	0
119	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	16/07/2016	15/11/2016	10.79	OBRA CONTRATADA 201625CBA074W002016. LATITUD DE TERMINO Y LONGITUD DE TERMINO.	4.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
120	E.C. (INTERNACIONAL MÉXICO 15-SAN JOSÉ DE LA BRECHA)-PLAYA BUENA VISTA	16/04/2016	15/11/2016	10.52	OBRA CONTRATADA	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450014	0
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/08/2016	15/11/2016	10.00	LIM. EDOS. DGO./SIN. - ENT. VILLA UNION KM. 198+500 - 294+400 LIM. EDOS.NAY./SIN. - MAZATLÁN KM. 144+600 - 282+000 MAZATLÁN - CULIACÁN KM.0+000 - 215+300	SEÑALAMIENTO VERTICAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/08/2016	15/11/2016	9.00	MAZATLÁN-CULIACÁN KM 75+000 - 192.300, 206+500 AL 215+300 PIGGY BACK - ENT. COSTA	SEÑALAMIE NTO HORIZONT A	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/08/2016	15/11/2016	9.00	LIM.EDOS.DGO./SIN.-ENT. VILLA UNION KM 198+500 - 294+400 MAZATLÁN-CULIACÁN KM 0+000 - 75+000	SEÑALAMIE NTO HORIZONT A	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
124	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN RENIVELACIONES DE TRAMOS AISLADOS	12/09/2016	30/11/2016	8.20	LIM.EDOS.NAY./SIN.-MAZATLÁN KM 144+600 - 292+000 2016 25 CB A 080 W 00 2016 TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN RENIVELACIONES DE TRAMOS AISLADOS CULIACÁN-LOS MOCHIS KM 45.2 - 94.0 (T.A.)	--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
125	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES, RUIZ CORTINEZ NO. 3	01/09/2016	09/12/2016	8.00	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES, RUIZ CORTINEZ NO. 3 UBICADO EN EL KM 172+370 DEL TRAMO GUASAVE - LOS MOCHIS, CARRETERA CULIACÁN - LOS MOCHIS Y	PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0
126	CSV RUT 137.972 KM LOS MOCHIS-CIUDAD OBREGON	16/06/2016	30/11/2016	7.39	OBRA CONTRATADA 201625CBA063W002016, LATITUD DE TERMINO: 26.5990138888889 Y LONGITUD:-109.010997222222	137.97	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
127	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	16/06/2016	31/12/2016	7.37	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS 201625CBA072Y002016.	696.90	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES		0
128	CSV RUT 137.074 KM MAZATLAN-CULIACAN	16/06/2016	nov-16	7.34	OBRA CONTRATADA 201625CBA058W002016, LATITUD DE TERMINO: 24.8049833333333 Y LONGIUTUD: -107.383283333333.	137.074	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
129	CSV RUT 95.9 KM DURANGO-MAZATLAN	16/06/2016	30/11/2016	6.98	OBRA CONTRATADA 201625CBA064002016, LATITUD DE TERMINO 23.1894 Y LONGITUD DE TERMINO - 106.20913.	95.90	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
130	CSV RUT 127.568 KM LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO	16/06/2016	nov-16	6.83	OBRA CONTRATADA 201625CBA062W002016, LATITUD DE TERMINO: 25.829294 Y LONGITUD:-108.969839	127.568	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
131	E.C. CULIACÁN-HUIZACHES-ANTORCHISTA	16/02/2016	30/11/2016	6.50	OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE	1.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
132	CSV RUT 119.75 KM MAZATLAN-CULIACAN	16/06/2016	nov-16	6.41	OBRA CONTRATADA 201625CBA057W002016, COORD. DE TERMINO. LAT.24.05269722 Y LONG-106.7942639.	119.75	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
133	CSV RUT 83.87 KM TEPIC-MAZATLÁN	16/02/2016	30/11/2016	5.66	OBRA CONTRATADA 201625CBA006W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.0264 Y LONGIUTUD: -105.92537.	83.87	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
134	CSV RUT 96.00 KM TEPIC-MAZATLÁN	16/02/2016	nov-16	5.44	OBRA CONTRATADA 201625CBA008W002016, CON LATITUD DE TERMINO 23.26387 Y LONGITUD DE TERMINO -106.41369	4.9	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
135	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	12/09/2016	15/11/2016	5.00	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, PROGRAMA DE BACHEO INTENSIVO RED FEDERAL	--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
136	5 HERMANOS-CASAS BLANCAS	02/05/2016	01/12/2016	4.80	OBRA CONTRATADA	1.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450025	0
137	CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE UE	16/04/2016	nov-16	4.80	OBRA CONTRATADA	0.06	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALI	13096450019	0
138	CSV RUT 88.20 KM PERICOS-PARRAL	16/06/2016	30/11/2016	4.72	OBRA CONTRATADA 201625CBA060W002016, LATITUD DE TERMINO: 25.24305 Y LONGITUD:-107.90213888888	88.20	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
139	CSV RUT 84.077 KM CULIACAN-LOS MOCHIS	16/06/2016	30/11/2016	4.50	OBRA CONTRATADA 201625CBA061W002016, LATITUD DE TERMINO: 25.511797222222 Y LONGITUD:-108.344988888889	84.08	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
140	SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	16/06/2016	31/12/2016	4.12	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS 201625CBA071Y002016.	696.60	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES		0
141	CSV RUT 68.935 KM MAZATLAN-CULIACAN	16/06/2016	30/11/2016	3.69	OBRA CONTRATADA 201625CBA059W002016, LATITUD DE TERMINO: 24.592638888888 Y LONGITUD:-107.4447	68.94	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
142	VILLA MORELOS-LA CURVA	02/05/2016	01/12/2016	2.30	OBRA CONTRATADA	0.52	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450020	0
143	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 166 PUE	16/06/2016	nov-16	2.18	OBRA CONTRATADA 201625CBA069W002016.	PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0
144	CSV RUT PTES 123 KM TEPIC-MAZATLÁN, DURANGO-MAZATLÁN Y MAZATLAN-CULIACAN	16/02/2016	30/11/2016	1.89	OBRA CONTRATADA 201625CBA007W002016, CON LATITUD DE TERMINO 23.26387 Y LONGITUD DE TERMINO -106.41369	123 PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0
145	MODERNIZACION DEL PUERTO DE MAZATLAN	01/10/2013	31/12/2018	1,389.00	N/A	PUERTO	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	1209J2T0003	PNI661
146	CULIACAN – PARRAL (ESTADOS: SINALOA - CHIHUAHUA)	01/12/2013	01/11/2017	768.87	DE 2004 HASTA 2012 SE INVIRTIERON 463.47 MDP EN 74.0 KMS Y EN 2014 SE INVIRTIÓ 52.86 MDP EN 8.0 KMS HASTA NIVEL BASE . EN 2015 SE	140.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096450004	PE
147	EJE INTERREGIONAL: TOPOLOBAMPO – CHIHUAHUA; TRAMO: SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX.	16/04/2010	31/12/2018	534.39	2010-38.95 MDP; 2011-119.48 MDP; 2012-38.41 MDP; 2013-15.43 MDP; 2014-17.80 MDP; 2015-SIN RECURSOS. 2016-76.8 MDP	906.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096450009	0
148	LIBRAMIENTO DE ESCUINAPA	01/09/2016	31/12/2018	311.00	SE CONSIDERA COMO PRIMERA ETAPA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA ESTACADA Y LA MODERNIZACIÓN DEL KM 24+000 AL 26+000. OBRA	9.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12092100007	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
149	E.C. CULIACAN-SANALONA-ALCOYONQUI- E.C. A LO DE BARTOLO.	01/08/2013	31/12/2018	37.85	EN 2013 SE INVIRTIERON 24.95 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 4.15 MDP.	920.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	1309640009	0
150	E.C.F. MEXICO NO. 15 - LOMA DE TECUYO	01/05/2013	31/12/2018	37.77	EN 2013 NO SE ASIGNARON RECURSOS. EN 2013 SE INVIRTIERON 6.45 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 8.85 MDP.	850.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450015	0
151	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LOS MOCHIS	01/01/2015	01/01/2018	29.50	N/A	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		0
152	CALLE 6, TRAMO MEXICO 15- CANAL ALTO	01/06/2012	31/12/2018	27.85	EN 2012 SE INVIRTIERON 9.60 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 4.50 MDP	2.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450018	0
153	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MAZATLAN	01/08/2016	dic-18	23.43	N/A	AEROPUER1	EN PROCESO 2017-	AEROPUERTOS		PNI005
154	AMPLIACION DEL AEROPUERTO CULIACAN	01/08/2016	31/12/2018	18.30	N/A	AEROPUER TO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI016
155	CINCO HERMANOS - CASA BLANCA.	01/03/2014	01/12/2018	14.54	EN 2014 SE INVIRTIERON 6.76 MDP. EN 2015 NO SE ASIGNARON RECURSOS.	37.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450025	0
156	LIBRAMIENTO FERROVIARIO CULIACAN	30/01/2017	31/12/2018	1,626.00	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2015	24.20	PROYECTADAS 2016-2018	FERROVIARIO	14093110018	PE
157	INSTALACIÓN PARA CONCENTRADO DE COBRE EN TOPOLOBAMPO.	30/01/2017	30/12/2017	423.80	OBRA SUSPENDIDA	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		PNI268
158	REPARACION DEL ROMPEOLAS DEL CRESTON Y CHIVO:	01/01/2017	dic-18	300.00		0.81	PROYECTADAS 2017-	PUERTOS	1109J2T0005	0
159	OBRA DE ATRAQUE SUR EN TERMINAL DE TRANSBORDADORES	30/01/2017	29/12/2017	154.00	N/A	0.13	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
160	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CULIACAN.	01/01/2017	31/12/2018	10.00	N/A, SE REALIZARA EL PROXIMO AÑO POR ASA	1 TANQUE	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE
