



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
SAN LUIS POTOSÍ**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**ABRIL 2017**


# SCT SAN LUIS POTOSI 2013-2018

## BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ABRIL 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes


- 6 AUTOPISTAS
- 27 CARRETERAS
- 38 CAMINOS RURALES
- 0 FERROVIARIO
- 0 PUERTOS
- 1 AEROPUERTO

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

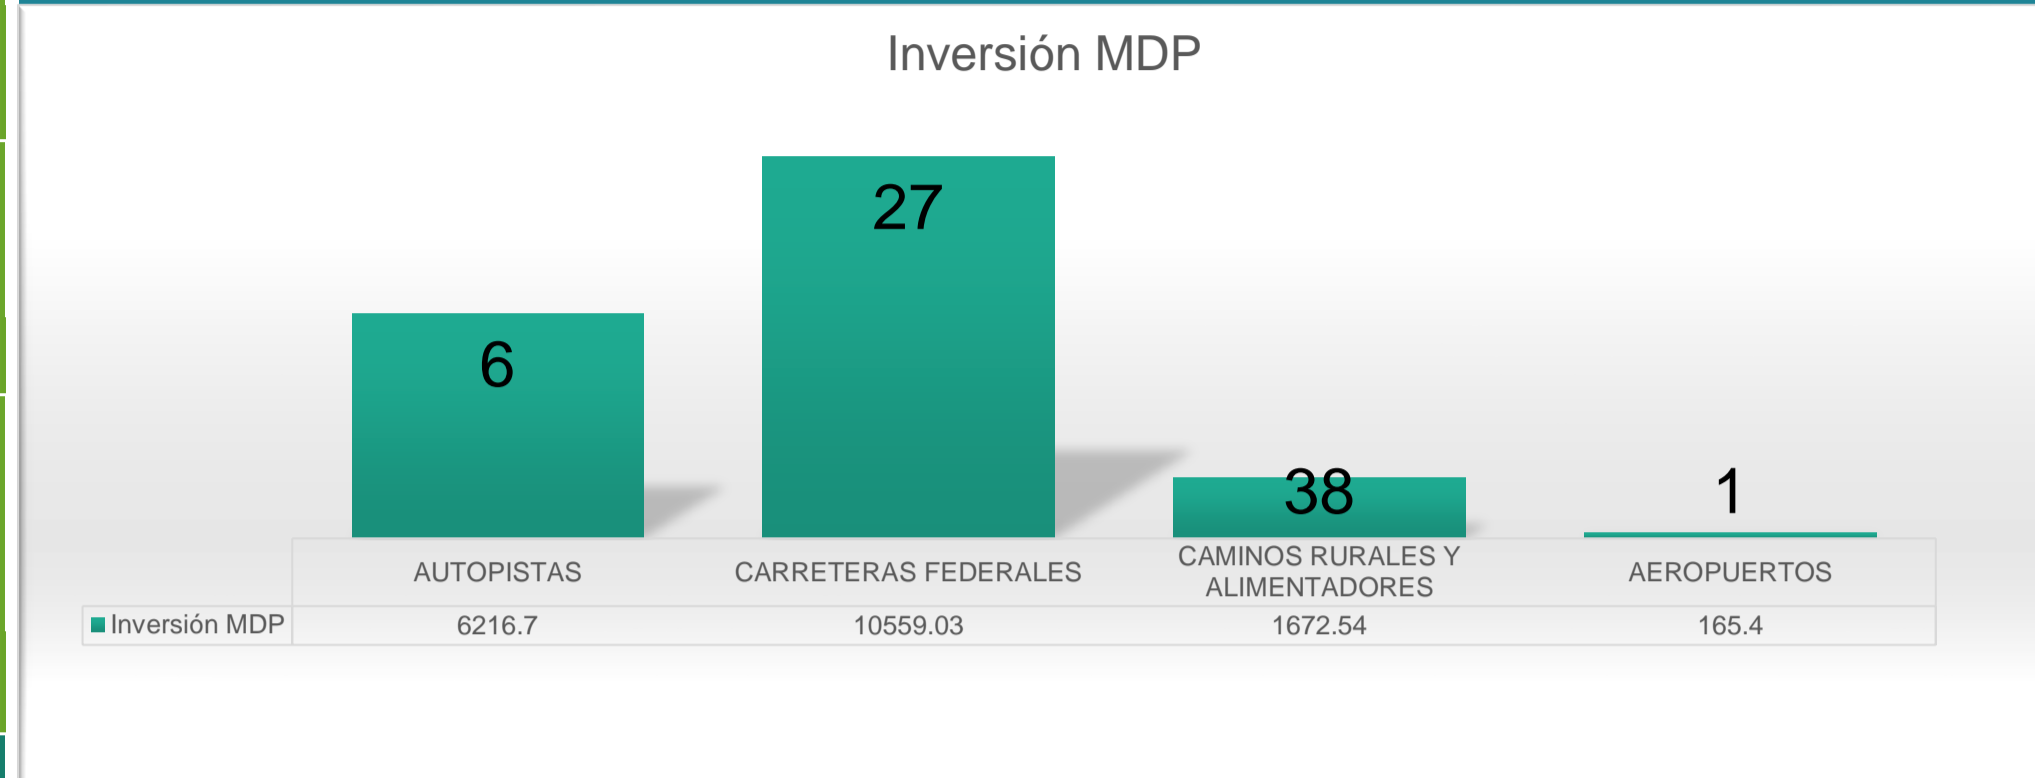

### ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

#### Cuenta de Denominación

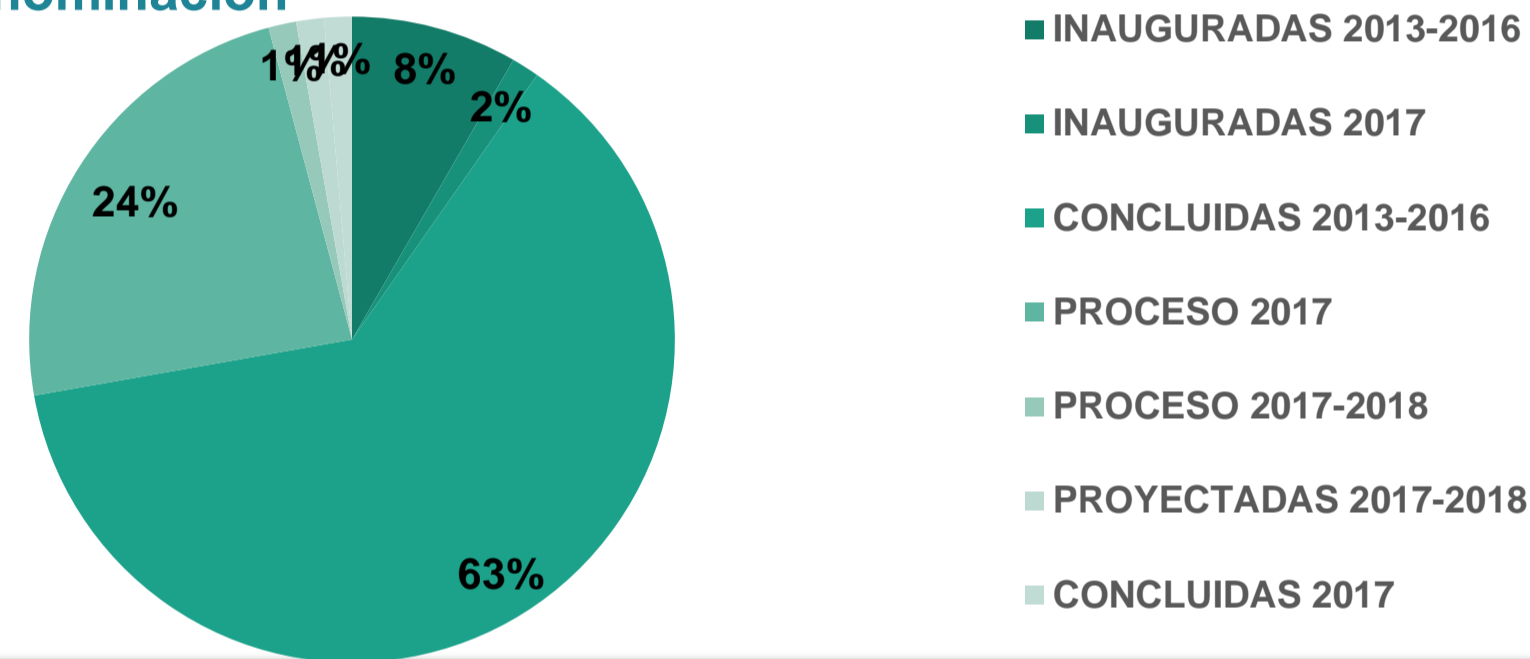

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	280,729.0	280,729.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	85,301.0	85,301.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL	---	283,184.0	283,184.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	58.0	58.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	58.0	58.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INVERSION	58.33	57.88	58.20	26.90	201.31
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	52	53	58	54	58
JORNALES	739,439	630,849	573,497	251,848	2,195,633
BENEFICIARIOS	16,264	15,075	17,690	77,532	126,561
LONGITUD CAMINOS	1,543.72	1,255.00	---	---	2,798.72
	---	---	313	162	475

Fecha de recepción: Lunes, 03 de Abril de 2017, mediante Oficio No.: 6.23.1.012/17 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 03 de Abril de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/326/2017 enviado por la DGAPDCST.

Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

72

18,613.7

9,413.9

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>6</b>	<b>6,216.70</b>	<b>1,103.40</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2013-2016	4	4,135.00	1,039.30	0
INAUGURADAS 2017	1	1,531.70	24.10	0
CONCLUIDAS 2013-2016	1	550.00	40.00	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>27</b>	<b>10,559.03</b>	<b>4,341.18</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2013-2016	2	1,423.40	202.70	1
CONCLUIDAS 2013-2016	11	3,815.15	2,093.54	0
CONCLUIDAS 2017	1	4,930.00	-	0
PROCESO 2017	12	323.73	2,044.94	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	66.75	-	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>38</b>	<b>1,672.54</b>	<b>3,969.34</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2016	33	1,276.64	3,517.80	0
PROCESO 2017	5	395.90	451.54	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>165.40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
PROCESO 2017-2018	1	165.40	-	0
<b>Total general</b>	<b>72</b>	<b>18,613.67</b>	<b>9,413.92</b>	<b>1</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
<b>INVERSIÓN</b>	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,314	322	1,636
INMUEBLES ESCOLARES	932	---	---
CENTROS DE SALUD	217	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	128	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	33	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	4	---	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-TAMPICO	jun-11	sep-13	557.00	946.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	10096440014	PNI454
2	RIOVERDE-CIUDAD VALLES (PPS)	ago-08	sep-13	182.00	13.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	NA	PNI171
3	LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE SAN LUIS POTOSI	jun-11	may-14	1,166.00	31.20	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	NA	PNI305
4	CG-049 ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EN SUS TRAMOS NORTE Y PONIENTE.	may-13	feb-15	1,009.70	194.00	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	12096440010	PNI463
5	AUTOPISTA CIUDAD VALLES - TAMUIN	ago-11	jul-16	2,230.00	49.10	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	N/A	PNI535
6	LIBRAMIENTO VILLA DE REYES	jun-10	jul-16	413.70	8.70	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440008	---
7	LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI	oct-14	ene-17	1,531.70	24.10	INAUGURADAS 2017	AUTOPISTAS	NO APLICA	PE
8	MATEHUALA - CIUDAD VICTORIA	feb-09	dic-12	276.87	2,913.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096440010	PE
9	LOS ANGELES - MARAVILLAS Y RAMAL A NORIA DE LOS CONOS.	mar-12	jul-13	15.74	5.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440013	---
10	LA PROVIDENCIA - LLANO GRANDE	abr-13	jul-13	4.46	1.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440014	---
11	CAÑAS-IGNACIO ALLENDE (PUENTE)	abr-13	ago-13	6.00	0.07	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096440006	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
12	SAN JOSE DEL GRITO- LAS CRUCES - YOLIAT - SAN FRANCISCO	may-07	oct-13	126.30	93.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	6096440021	---
13	SANTA ANITA -PALO DE ARCO-TANCHACHIN	may-10	oct-13	45.45	15.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440001	---
14	CONSTRUCCION DEL PUENTE TONATICO.	ago-13	nov-13	8.32	0.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440014	---
15	TAPONA - POCITOS - PEYOTE	mar-12	dic-13	16.75	6.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440006	---
16	LAS CRUCES - LIMITES DE LOS ESTADOS SLP - ZAC.	jul-13	may-14	10.88	4.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440008	---
17	E.C.F. MEXICO NO. 57- EL JARALITO, TRAMO TEXAS-EL JARALITO.	mar-14	jun-14	5.82	1.56	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440026	---
18	PUENTE VEHICULAR PUENTE LA MAROMA	mar-14	jul-14	2.79	0.02	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440003	---
19	RAMAL A REAL DE CATORCE; TR: KM. 0+000 AL KM. 21+000.	abr-13	jul-14	10.40	21.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440018	---
20	VENADO - EL EPAZOTE	abr-13	ago-14	46.07	20.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440008	---
21	PUENTE: VEHICULAR EN ARROYO XOCHITITLA	abr-14	sep-14	0.99	0.09	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440001	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
22	BOULEVARD EN LA CARRETERA VALLES 85	dic-11	dic-14	39.20	1.66	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440019	---
23	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS	feb-16	dic-16	312.64	375.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
24	EL CHILARES - LA MAROMA (SAN LUIS POTOSI APOYO A CONAGUA CG 052 PRESA LA MAROMA)	dic-14	dic-16	200.00	21.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440013	PE
25	CONST. PUENTE E.C.(RIO VERDE-SLP) -LA MEDIA LUNA,TRAMO:E C 70	abr-16	dic-16	13.37	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440004	---
26	MORELOS-JUAN SARABIA-EL BOZAL-LAVICTORIA-LA MERCED	mar-16	dic-16	12.93	4.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440010	---
27	LOS CARRIZOS-COXCATLAN-AXTLA	mar-16	dic-16	12.70	3.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440010	---
28	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN TAMUÍN-SANTA MARTHA	feb-16	dic-16	11.49	3.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440012	---
29	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO WADLEY SAN JOSE DE CORONADOS	feb-16	dic-16	11.48	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440013	---
30	LA CUESTA-TANCANHUITZ	feb-16	dic-16	11.29	2.12	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440003	---
31	LA ESPERANZA-SANTA ELENA	feb-16	dic-16	10.61	3.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440015	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
32	TANCANHUITZ-HUEHUETLAN	feb-16	dic-16	9.59	2.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440012	---
33	EST. MOCTEZUMA-MATANZAS	feb-16	dic-16	9.56	3.01	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440002	---
34	RAMAL SAN SEBASTIÁN	feb-16	dic-16	9.49	3.42	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440006	---
35	AQUISMÓN-XOLMON-UNIÓN DE GUADALUPE	feb-16	dic-16	9.39	2.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440015	---
36	TANLAJAS-SAN ANTONIO-EL PUENTE	abr-16	dic-16	7.59	3.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096440007	---
37	SAN CIRO DE ACOSTA-VAQUEROS-E.C. 70 (RAMAL LA LUZ)	feb-16	dic-16	6.69	2.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096440001	---
38	E.C. 57-SAN FRANCISCO	feb-16	dic-16	5.29	1.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440013	---
39	EL HERRERO-LA LUZ	feb-16	dic-16	5.09	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440001	---
40	MODERNIZACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CERRITOS-SAN JOSE DE TURRUBIARTES-LAS POZAS-RINCONADA	abr-16	dic-16	5.00	1.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440020	---
41	VALLE DE SAN JUAN-RINCÓN DEL REFUGIO	feb-16	dic-16	3.99	0.87	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440004	---
42	SAN CIRO DEACOSTA-CORRAL QUEMADO	feb-16	dic-16	0.79	0.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440011	---
43	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	dic-16	1,345.00	SEÑALAMIE NTO HORIZONT A	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
44	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-16	dic-16	251.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
45	CONSERVACION PERIODICA	feb-16	dic-16	98.35	55.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
46	RECONSTRUCCION DE PUENTES	may-16	dic-16	40.99	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
47	BARRERA DE PROTECCION	feb-16	dic-16	15.58	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
48	CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES	may-16	dic-16	3.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
49	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	dic-16	1,282.73	1,280.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
50	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (CPCC)	ene-16	dic-16	754.54	754.54	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	---
51	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-EBANO	feb-15	dic-16	550.00	40.00	CONCLUIDAS 2013-2016	AUTOPISTAS	10096440014	PNI454
52	BARRERA DE PROTECCION	feb-16	dic-16	15.58	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
53	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ene-16	mar-17	4,930.00	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
54	DAMIAN CARMONA- EL AGUACATE	mar-17	jun-17	10.00	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440027	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
55	PRESA VERDE - GALLOS BLANCOS	mar-17	jun-17	4.90	0.88	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440023	---
56	MAGDALENO CEDILLO-ZAMACHIHUE	mar-17	jul-17	10.00	4.20	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096440002	---
57	AGUA ZARCA-PAPAGAYOS	mar-17	jul-17	10.00	3.40	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440021	---
58	CD. VALLES-CHANTOL-LAS HUERTAS	mar-17	jul-17	9.22	2.24	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	08096440004	---
59	CAMINO TLAETLA-PILATENO, EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	mar-17	jul-17	7.79	2.00	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440004	---
60	SAN FRANCISCO-CERRO GRANDE-XINICTLE	mar-17	jul-17	5.74	3.80	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440017	---
61	EC. QUINTA CHILLA-TAMACOL	mar-17	jul-17	6.00	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440025	---
62	RECONSTRUCCION DE PUENTES 2017	mar-17	ago-17	9.00	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110003	---
63	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS 2017	feb-17	ago-17	362.37	438.14	PROCESO 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ABRIL DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
64	CONSERVACION PERIODICA 2017	mar-17	sep-17	77.98	48.40	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
65	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 2017	feb-17	oct-17	30.14	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
66	BARRERA DE PROTECCIÓN 2017	feb-17	oct-17	4.00	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
67	SEÑALAMIENTO VERTICAL 2017	feb-17	oct-17	3.00	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
68	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS (CPCC) 2017	ene-17	dic-17	100.00	754.54	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	---
69	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017	feb-17	dic-17	64.29	1,236.88	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
70	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017	feb-17	dic-17	5.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
71	MODERNIZACION AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI	dic-16	dic-18	165.40	TERMINAL	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI003
72	CIUDAD VALLE -TAMPICO ENT. LIB. TAMUIN-PANUCO	abr-17	sep-17	66.75	4 CARRILES	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096440014	---
