



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
BAJA CALIFORNIA**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

DICIEMBRE 2017



SCT BAJA CALIFORNIA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, DICIEMBRE 2017

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR



2 AUTOPISTAS



36 CARRETERAS



16 CAMINOS RURALES



1 FERROVIARIO




8 PUERTOS



3 AEROPUERTOS

Inversión MDP

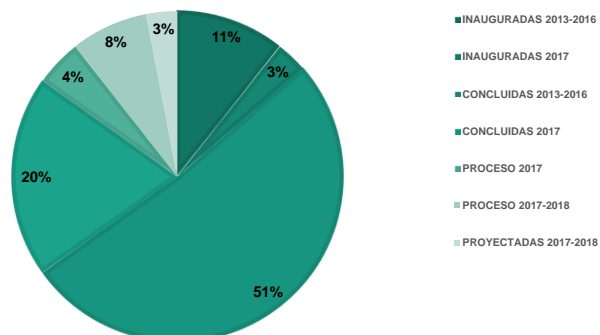

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **Obras 66**, **MDP 11,682.5**, **Km 9,570.1**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	1,369.55	4.75	0
CONCLUIDAS 2013-2016	1	19.55	1.00	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	1,350.00	3.75	0
CARRETERAS FEDERALES	36	5,262.43	8,647.26	1
INAUGURADAS 2013-2016	2	873.54	100.23	1
INAUGURADAS 2017	2	791.30	14.41	0
CONCLUIDAS 2013-2016	20	1,313.35	6,448.04	0
CONCLUIDAS 2017	7	356.68	6.68	0
PROCESO 2017	3	411.06	2,009.90	0
PROCESO 2017-2018	2	1,516.50	68.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16	137.92	892.90	0
INAUGURADAS 2013-2016	1	19.96	2.00	0
CONCLUIDAS 2013-2016	10	69.49	880.90	0
CONCLUIDAS 2017	5	48.47	10.00	0
PUERTOS	8	1,184.19	-	0
INAUGURADAS 2013-2016	3	42.89	-	0
CONCLUIDAS 2013-2016	3	90.10	-	0
PROCESO 2017-2018	1	593.60	-	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	457.60	-	0
AEROPUERTOS	3	869.00	0.18	0
INAUGURADAS 2013-2016	1	185.00	-	0
PROCESO 2017-2018	2	684.00	0.18	0
FERROVIARIO	1	2,859.44	25.00	1
CONCLUIDAS 2017	1	2,859.44	25.00	1
Total general	66	11,682.53	9,570.09	2

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	177.09	-	177.09
TELEVISIONES ENTREGADAS	63,942	0	63,942
MUNICIPIOS ENTREGADOS TC	3		3
BENEFICIARIOS TDT	66,484		66,484



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	186.36
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	32.79
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	153.57
SITIOS CONTRATADOS	1,303

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL					
INVERSIÓN EJERCIDA PET	29.93	32.55	28.30	14.92	105.69
BENEFICIARIOS PET	4,456	5,072	4,224	2,689	16,441
CAMINOS PET	0	0	120	46	166
JORNALES PAGADOS PET	340,523	340,181	278,789	127,593	1,087,086
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	4	5	5	5	5
LONGITUD PET	813	158	0	408	1,379



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	920,092	37%
HOGARES CON INTERNET	698,620	46%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,345,488	12%
USUARIOS DE INTERNET	2,444,339	39%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	177.09
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	105.69
MÉXICO CONECTADO	186.36

Fecha de recepción: Martes 5 de diciembre de 2017, mediante Oficio No.: 6.2.DG.487/2017 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Miércoles 6 de diciembre de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/773/2017 enviado por la DGAPDCST.

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

Programas

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2 DEL PUERTO ENSENADA	nov-12	sep-13	10.13	10,000m2	INAUGURADAS 2013-2016	PUERTOS	1109J2R0009	---
2	ECF 3 - CARMEN SERDAN	feb-14	sep-14	19.96	2.00	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096220023	---
3	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2	nov-13	dic-14	12.10	9500m2	INAUGURADAS 2013-2016	PUERTOS	1109J2R0009	---
4	SEGUNDO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA	ene-13	abr-15	203.04	0.228	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	07096220001	PE
5	MODERNIZACION MALECON	oct-14	abr-15	20.66	MALECON	INAUGURADAS 2013-2016	PUERTOS	1209J2R0002	---
6	PUERTA DE LAS CALIFORNIAS. CRUCE FRONTERIZO EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA	jul-13	nov-15	185.00	CRUCE FRONTERIZO	INAUGURADAS 2013-2016	AEROPUERTOS		---
7	CG-124 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TIJUANA - ROSARITO - TECATE,	jun-14	mar-16	670.50	100.00	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007 14092110003 13092110003.	PNI328
8	CONSTRUCCION ENTRONQUE EL FARO KM38+600 CARRET. MEXICALI-SAN FELIPE	oct-14	may-15	75.70	0.71	INAUGURADAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	08096220003	---
9	TECATE - EL SAUZAL	ene-13	abr-17	715.60	13.7	INAUGURADAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	09096220001	PE
10	AMPLIACION MUELLE DE CABOTAJE EN EL PUERTO DE ENSENADA	dic-11	mar-13	19.50	1,000 m²	CONCLUIDAS 2013-2016	PUERTOS	1009J2R0002	---
11	MEXICALI – SAN FELIPE, TRAMO: EL FARO – SAN FELIPE, DEL KM 106+000 AL KM 111+000, INCLUYENDO 06 ESTRUCTURAS	jun-13	dic-13	108.50	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	06096220004	PNI202

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
12	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS DEL KM 31+900 AL KM 36+500 INCLUYE: UN (1) PUENTE KM 32+340 UN (1) ENTROQNUE	feb-14	may-14	140.40	4.6 1 PUENTE Y 1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	09096220001	---
13	EL CONDOR - JOSE MA. PINO SUAREZ	feb-14	sep-14	17.59	2.00	CONCLUIDAS 2013- 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096220020	---
14	CARRETERA ENSENADA - LAZARO CARDENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNTA COLNETT DEL KM. 78+700 AL 87+258, INCLUYE PUENTE BUENOS AIRES EN EL KM 84+784,	feb-14	dic-14	102.30	8.50	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	08096220002	---
15	LIBRAMIENTO DE ENSENADA (PRIMERA ETAPA (TERRACERIA)	feb-14	feb-15	139.40	2.1	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	07096220005	PE
16	MEXICALI-LAGUNA CHAPALA TRAMO PUERTECITOS - LAGUNA CHAPALA SUBTRAMO DEL KM. 146+000 AL KM. 170+500. PUENTE KM. 158+055	oct-13	mar-15	236.60	24.50	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	06096220004	---
17	AMPLIACION CRUCE INTERNACIONAL PUERTA MEXICO/SAN ISIDRO EL CHAPARRAL	dic-14	abr-15	19.55	1.00	CONCLUIDAS 2013- 2016	AUTOPISTAS	10096220001	PN1141
18	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS.	ago-14	sep-15	47.60	TRES (3) PUENTES	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	09096220001	---
19	BARRERA DE PROTECCION	may-15	oct-15	14.87	8.80	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
20	PAQUETE DE DIEZ (10) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-15	oct-15	6.50	114.37	CONCLUIDAS 2013- 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
21	MODERNIZACION DE LA CARRETERA: ENSENADA - LAZARO CARADENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNT COLONET	abr-15	nov-15	44.16	3.14	CONCLUIDAS 2013- 2016	CARRETERAS FEDERALES	08096220002	---
22	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	jun-15	nov-15	8.08	150.85	CONCLUIDAS 2013- 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
23	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-15	dic-15	65.61	1,842.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
24	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ago-15	dic-15	14.59	819.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
25	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ago-15	dic-15	3.17	1,818.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
26	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	ago-15	dic-15	0.99	98 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110005	---
27	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	sep-15	dic-15	105.06	55.8	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	---
28	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2	dic-14	dic-15	39.71	9500m2	CONCLUIDAS 2013-2016	PUERTOS	1109J2R0009	---
29	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL ENTRONQUE NODO PEMEX	abr-15	dic-15	51.40	1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096220002	---
30	MODERNIZACION DEL MALECON	nov-15	dic-15	30.89	MALECON	CONCLUIDAS 2013-2016	PUERTOS	1209J2R0002	---
31	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-15	mar-16	5.68	86.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
32	PAQUETE DE DOS (2) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	may-15	mar-16	7.95	46.18	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
33	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-15	mar-16	7.00	154.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
34	PAQUETE 1 (UNO) OBRA DE CONSERVACION DE CARRETERA ALIMENTADORA	sep-15	mar-16	3.49	1.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
35	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	abr-16	ago-16	75.13	19	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
36	PAQUETE III OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	7.12	238	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
37	PAQUETE II OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	3.07	42.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
38	PAQUETE I OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	3.01	44.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
39	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	mar-16	sep-16	36.76	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
40	SEÑALAMIENTO VERTICAL	mar-16	sep-16	27.18	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
41	BARRERA DE PROTECCION	mar-16	sep-16	15.08	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
42	RUTINARIA DE PUENTES	abr-16	oct-16	2.60	208 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
43	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	abr-16	dic-16	81.95	1842.1	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
44	CG-123 ESTABLECER, JUNTO CON EL GOBIERNO ESTATAL, UN SISTEMA DE TRANSPORTE ARTICULADO BRT	ago-13	jun-17	2,859.44	25.00	CONCLUIDAS 2017	FERROVIARIO	12093110007	PNI527
45	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA NODO PEMEX	feb-16	jun-17	74.63	6 CARRILES	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096220002	---
46	LIBRAMIENTO ENSENADA (SUPRESION POR VIADUCTO DE 170 M) INCLUYE: ENTR CALAFIA CON 1 PIV Y VIADUCTO KM 19+300	abr-15	ago-17	189.77	2.1 1 VIADUCTO	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	07096220005	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNJ Publicado
47	BARRERA DE PROTECCION	abr-17	sep-17	16.69	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
48	PAQUETE II - CINCO (5) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	sep-17	6.50	5 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
49	PAQUETE III - CINCO (5) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	sep-17	6.49	5 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
50	PAQUETE I - TRES (3) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	sep-17	6.48	3 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-17	sep-17	13.98	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
52	TRAMO 1 - MODERNIZACION: CARRETERA ESTATAL NO. 4 ESTATAL NO. 4, EN	mar-17	oct-17	32.35	3.2	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	11096220004	---
53	TRAMO 1 - MODERNIZACION: CARRETERA ESTATAL NO. 4 ESTATAL NO. 4, ENTRE PUENTE SAN FELIPITO Y ESTACION COAHUILA, KM. 28+980 AL KM. 31+500	mar-17	oct-17	26.67	3.48	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	11096220004	---
54	VALLE CHICO - RECONSTRUCCION: KM. 181.1 CARRETERA (MEXICALI - SAN FELIPE) - COLONIA MORELIA, KM. 0+000 AL KM. 10+000	jul-17	oct-17	21.97	10.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
55	PAQUETE IV - (UNA) OBRA DE CONSERVACION DE CARRETERA ALIMENTADORA	mar-17	oct-17	7.03	---	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
56	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-17	oct-17	2.59	213 PUENTES	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
57	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	97.92	1873	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
58	CONSTRUCCION DE 4 PUENTES: LAS ARRASTRAS II Y LAS ARRASTRAS III, CAI	abr-15	dic-17	229.58	30.7	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	06096220004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
59	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	abr-17	dic-17	83.56	106.2	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
60	AMPLIACION DE EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO DE MEXICALI	ene-16	feb-18	51.00	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		---
61	CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES Y UN ENTRONQUE Y PAVIMETACION DEL KM	feb-16	jun-18	406.00	5 PUENTES 30.73 KM	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	06096220004	PE
62	ESTRUCTURAS DE PROTECCION	dic-15	ago-18	593.60	PUERTO	PROCESO 2017-2018	PUERTOS	0809J2R0003	---
63	ENSENADA - PUNTA COLONET	ene-13	dic-18	1,110.50	68.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096220002	PE
64	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TIJUANA	ene-15	dic-18	633.00	0.18	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI094
65	CRUCE INTERNACIONAL OTAY II/OTAY EAST	feb-18	ene-19	1,350.00	3.75	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	10096220005	PNI478
66	AMPLIACIÓN DE LA DÁRSENA DE CIABOGA Y CANALES DE NAVEGACIÓN	feb-18	ene-19	457.60	DÁRSENA	PROYECTADAS 2017-2018	PUERTOS	1409J2R0001	---
