



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
SAN LUIS POTOSÍ**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

ENERO 2018




SCT SAN LUIS POTOSI 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

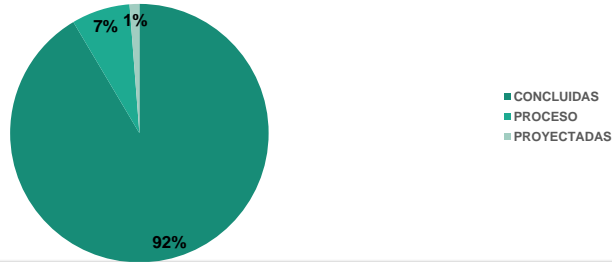

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

Obras: 82
MDP: 13,502.6
Km: 12,226.7

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	6	6,216.70	1,103.40	0
INAUGURADAS 2013-2016	4	4,135.00	1,039.30	0
INAUGURADAS 2017	1	1,531.70	24.10	0
CONCLUIDAS 2013-2016	1	550.00	40.00	0
CARRETERAS FEDERALES	36	5,456.68	7,152.62	1
INAUGURADAS 2013-2016	2	1,423.40	202.70	1
INAUGURADAS 2017	1	250.60	-	0
CONCLUIDAS 2013-2016	13	2,893.02	3,497.07	0
CONCLUIDAS 2017	15	450.83	3,424.65	0
PROCESO 2018	4	73.83	19.20	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	365.00	9.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	39	1,663.83	3,970.66	0
CONCLUIDAS 2013-2016	33	1,276.64	3,517.80	0
CONCLUIDAS 2017	5	381.00	451.54	0
PROCESO 2018	1	6.19	1.32	0
AEROPUERTOS	1	165.40	-	0
PROCESO 2018	1	165.40	-	0
Total general	82	13,502.61	12,226.68	1

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	790.02	-	790.02
TELEVISIONES ENTREGADAS	285,340	-	285,340
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	58	-	58
BENEFICIARIOS TDT	289,022	-	289,022



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	170.19
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	33.01
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	137.19
SITIOS CONTRATADOS	1,636

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL					
INVERSIÓN EJERCIDA PET	58.33	57.88	58.20	38.92	213.32
BENEFICIARIOS PET	16,264	15,075	17,690	9,199	58,228
CAMINOS PET	0	0	313	162	475
JORNALES PAGADOS PET	739,439	630,849	573,497	374,322	2,318,107
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	52	0	58	51	58
LONGITUD PET	1,544	1,255	957	957	3,756



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	652,624	105%
HOGARES CON INTERNET	378,980	95%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,269,873	32%
USUARIOS DE INTERNET	1,335,486	62%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	790.02
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	213.32
MÉXICO CONECTADO	170.19

Fecha de recepción: Viernes 12 de Enero de 2018, mediante Oficio No.: 6.23.1.0002/2018 enviado por el CSCT.

Solicitud para el 10 de Enero de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/891/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-TAMPICO	jun-11	sep-13	557.00	946.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	10096440014	PNI454
2	RIOVERDE-CIUDAD VALLES (PPS)	ago-08	sep-13	182.00	13.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	N/A	PNI171
3	LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE SAN LUIS POTOSI	jun-11	may-14	1,166.00	31.20	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	N/A	PNI305
4	AUTOPISTA CIUDAD VALLES - TAMUIN	ago-11	jul-16	2,230.00	49.10	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	08096440011	PNI535
5	LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI	oct-14	ene-17	1,531.70	24.10	INAUGURADAS 2017	AUTOPISTAS	NO APLICA	PE
6	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-EBANO	feb-15	dic-16	550.00	40.00	CONCLUIDAS 2013-2016	AUTOPISTAS	10096440014	PNI454
7	CG-049 ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EN SUS TRAMOS NORTE Y PONIENTE.	may-13	feb-15	1,009.70	194.00	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	12096440010	PNI463
8	LIBRAMIENTO VILLA DE REYES	jun-10	jul-16	413.70	8.70	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440008	---
9	BOULEVARD SAN LUIS - CARR. 57 SLP-QRO.	ago-11	jul-17	250.60	---	INAUGURADAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	11096440003	#N/A
10	MODERNIZACION TR 1 RIO VERDE-RAYON TR 2 RAYON-LA PITHAYA Y TR 3 LA PITHAYA-CD. VALLES	feb-08	may-13	2,463.00	36.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
11	MODERNIZACION DEL CAMINO ALAQUINES - NVA. REFORMA	abr-13	sep-13	46.50	21.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	11096440002	#N/A

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
12	TANLAJAS-SAN ANTONIO-EL PUENTE	abr-16	dic-16	7.59	3.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096440007	---
13	SAN CIRO DEACOSTA-CORRAL QUEMADO	feb-16	dic-16	0.79	0.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440011	---
14	CONSERVACION PERIODICA	feb-16	dic-16	98.35	55.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
15	RECONSTRUCCION DE PUENTES	may-16	dic-16	41.02	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
16	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-16	dic-16	25.50	1,345.03	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
17	BARRERA DE PROTECCION	feb-16	dic-16	10.09	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
18	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-16	dic-16	3.19	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
19	CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES	may-16	dic-16	1.97	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
20	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (CPC)	ene-16	dic-16	125.39	754.54	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	---
21	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	dic-16	59.56	1,280.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
22	BARRERA DE PROTECCION	feb-16	dic-16	10.07	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
23	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ene-16	mar-17	8.17	3266 PZAS.	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
24	CONSERVACION PERIODICA 2017	mar-17	ago-17	77.98	48.40	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
25	BARRERA DE PROTECCIÓN 2017	feb-17	ago-17	4.00	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
26	EC. QUINTA CHILLA-TAMACOL	mar-17	sep-17	5.88	1.00	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440025	---
27	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 2017	feb-17	sep-17	30.14	1,374.67	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
28	RECONSTRUCCION DE PUENTES 2017	mar-17	sep-17	9.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110003	---
29	SEÑALAMIENTO VERTICAL 2017	feb-17	sep-17	3.00	857 PZAS.	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
30	DAMIAN CARMONA- EL AGUACATE	mar-17	oct-17	9.80	1.00	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440027	---
31	CD. VALLES-CHANTOL-LAS HUERTAS	mar-17	oct-17	9.02	2.24	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	08096440004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
32	PRESA VERDE - GALLOS BLANCOS	mar-17	oct-17	4.80	0.88	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096440023	---
33	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS (CPCC) 2017	ene-17	oct-17	100.00	754.54	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	---
34	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017	feb-17	oct-17	64.29	1,236.88	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
35	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017	feb-17	oct-17	5.20	PUENTES	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
36	CIUDAD VALLE -TAMPICO ENT. LIB. TAMUIN-PANUCO	abr-17	dic-17	66.57	3.00	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	10096440014	---
37	BOULEVARD VALLES - TAMPICO	may-12	dic-17	52.98	2.04	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096440009	#N/A
38	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SAN CIRO DE ACOSTA-EL AGUACATE	nov-17	feb-18	15.98	4.50	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	10096440011	#N/A
39	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES-BUENAVISTA	nov-17	feb-18	3.95	8.70	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	11096440013	#N/A
40	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ARROYO GDE. UBICADO EN EL CAMINO EL BLANCO-LOS NAZARIOS	oct-17	feb-18	3.90	PUENTE	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
41	MODERNIZACIÓN DE LA CARR. CARBONERA-T.C. (ENT. MORELOS-SALTILLO)	dic-17	feb-18	50.00	6.00	PROCESO 2018	CARRETERAS FEDERALES	17096440004	#N/A
42	LIBRAMIENTO EBANO	mar-18	dic-18	365.00	9.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096440019	#N/A

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
43	MATEHUALA - CIUDAD VICTORIA	feb-09	dic-12	276.87	2,913.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096440010	PE
44	LOS ANGELES - MARAVILLAS Y RAMAL A NORIA DE LO	mar-12	jul-13	15.74	5.1	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440013	---
45	LA PROVIDENCIA - LLANO GRANDE	abr-13	jul-13	4.46	1.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440014	---
46	CAÑAS-IGNACIO ALLENDE (PUENTE)	abr-13	ago-13	6.00	0.07	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096440006	---
47	SAN JOSE DEL GRITO- LAS CRUCES - YOLIAT - SAN FRANCISCO	may-07	oct-13	126.30	93.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096440021	---
48	SANTA ANITA -PALO DE ARCO-TANCHACHIN	may-10	oct-13	45.45	15.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440001	---
49	CONSTRUCCION DEL PUENTE TONATICO.	ago-13	nov-13	8.32	0.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440014	---
50	TAPONA - POCITOS - PEYOTE	mar-12	dic-13	16.75	6.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440006	---
51	LAS CRUCES - LIMITES DE LOS ESTADOS SLP - ZAC.	jul-13	may-14	10.88	4.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440008	---
52	E.C.F. MEXICO NO. 57- EL JARALITO, TRAMO TEXAS- E	mar-14	jun-14	5.82	1.56	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440026	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
53	PUENTE VEHICULAR PUENTE LA MAROMA	mar-14	jul-14	2.79	0.02	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440003	---
54	RAMAL A REAL DE CATORCE; TR: KM. 0+000 AL KM. 21+000.	abr-13	jul-14	10.40	21.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440018	---
55	VENADO - EL EPAZOTE	abr-13	ago-14	46.07	20.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440008	---
56	PUENTE: VEHICULAR EN ARROYO XOCHITITLA	abr-14	sep-14	0.99	0.09	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440001	---
57	BOULEVARD EN LA CARRETERA VALLES 85	dic-11	dic-14	39.20	1.66	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440019	---
58	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTAD	feb-16	dic-16	312.64	375.4	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
59	EL CHILARES - LA MAROMA (SAN LUIS POTOSI APOYO	dic-14	dic-16	200.00	21	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440013	PE
60	CONST. PUENTE E.C.(RIO VERDE-SLP) -LA MEDIA LUNA, TRAMO: E C 70	abr-16	dic-16	13.37	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440004	---
61	MORELOS-JUAN SARABIA-EL BOZAL-LAVICTORIA-LA MERCED	mar-16	dic-16	12.93	4.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440010	---
62	LOS CARRIZOS-COXCATLAN-AXTLA	mar-16	dic-16	12.70	3.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440010	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
63	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN TAMUÍN-SANTA MARTHA	feb-16	dic-16	11.49	3.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440012	---
64	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO WADLEY SAN JOSE DE CORONADOS	feb-16	dic-16	11.48	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440013	---
65	LA CUESTA-TANCANHUITZ	feb-16	dic-16	11.29	2.122	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440003	---
66	LA ESPERANZA-SANTA ELENA	feb-16	dic-16	10.61	3.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440015	---
67	TANCANHUITZ-HUEHUETLAN	feb-16	dic-16	9.59	2.6	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440012	---
68	EST. MOCTEZUMA-MATANZAS	feb-16	dic-16	9.56	3.01	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440002	---
69	RAMAL SAN SEBASTIÁN	feb-16	dic-16	9.49	3.42	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440006	---
70	AQUISMÓN-XOLMON-UNIÓN DE GUADALUPE	feb-16	dic-16	9.39	2.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440015	---
71	SAN CIRO DE ACOSTA-VAQUEROS-E.C. 70 (RAMAL LA LUZ)	feb-16	dic-16	6.69	2.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096440001	---
72	E.C. 57-SAN FRANCISCO	feb-16	dic-16	5.29	1.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440013	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
73	EL HERRERO-LA LUZ	feb-16	dic-16	5.09	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440001	---
74	MODERNIZACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CERRITOS-SAN JOSE DE TURRUBIARTES-LAS POZAS-RINCONADA	abr-16	dic-16	5.00	1.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440020	---
75	VALLE DE SAN JUAN-RINCÓN DEL REFUGIO	feb-16	dic-16	3.99	0.87	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440004	---
76	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTAD	feb-17	oct-17	348.15	438.14	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	---
77	SAN FRANCISCO-CERRO GRANDE-XINICTLE	mar-17	oct-17	5.62	3.80	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440017	---
78	AGUA ZARCA-PAPAGAYOS	mar-17	oct-17	9.80	3.40	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440021	---
79	MAGDALENO CEDILLO-ZAMACHIHUE	mar-17	nov-17	9.80	4.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096440002	---
80	CAMINO TLAETLA-PILATENO,EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	mar-17	nov-17	7.63	2.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440004	---
81	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EC. 57 - NORIA DE LOS CASTILLO	oct-17	feb-18	6.19	1.32	PROCESO 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	17096440001	#N/A
82	MODERNIZACION AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI	dic-16	dic-18	165.40	TERMINAL	PROCESO 2018	AEROPUERTOS	N/A	PNI003
