



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
ESTADO DE MÉXICO**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT


**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JULIO 2016

SCT ESTADO DE MEXICO 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

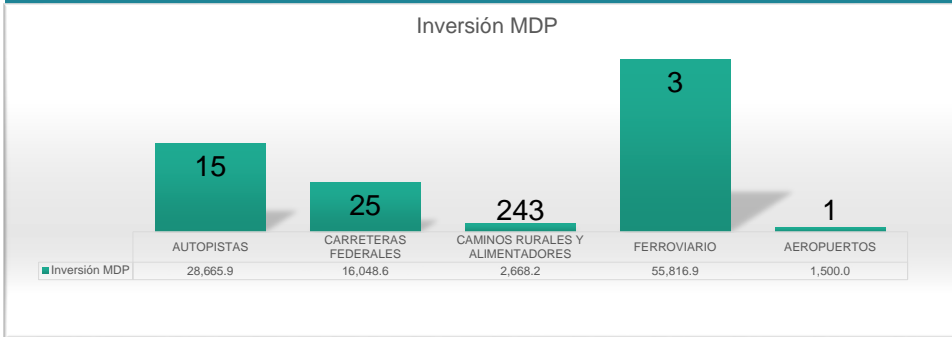

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Cuenta de Denominación

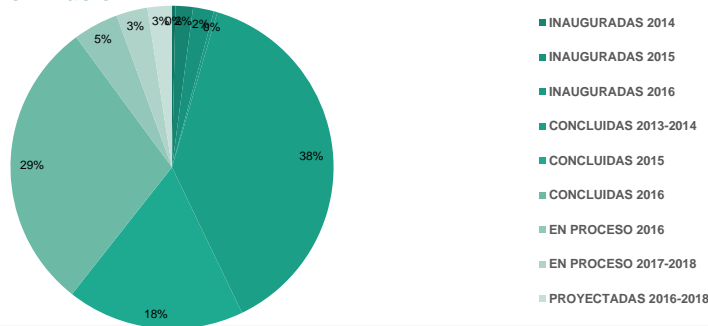

A la fecha, la SCT invierte **287** Obras, **104,699.6** MDP y **3,833.8** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	15	28,665.89	323.40	3
INAUGURADAS 2014	1	660.00	21.70	0
CONCLUIDAS 2013-2014	2	690.00	-	1
CONCLUIDAS 2015	1	2,600.00	12.00	0
EN PROCESO 2016	3	5,436.44	66.70	1
EN PROCESO 2017-2018	4	14,560.00	141.00	0
PROYECTADAS 2016-2018	4	4,719.45	82.00	1
CARRETERAS FEDERALES	25	16,048.62	2,697.40	6
INAUGURADAS 2013	1	3,603.30	-	0
INAUGURADAS 2014	3	4,104.00	58.40	0
INAUGURADAS 2015	5	1,655.19	16.36	3
CONCLUIDAS 2015	5	319.99	1,206.89	0
EN PROCESO 2016	6	957.13	1,344.15	0
EN PROCESO 2017-2018	4	4,709.01	71.60	2
INAUGURADAS 2016	1	700.00	-	1
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	243	2,668.20	742.25	1
INAUGURADAS 2014	1	436.70	83.05	1
INAUGURADAS 2015	1	7.28	0.90	0
CONCLUIDAS 2013-2014	108	1,178.21	279.05	0
CONCLUIDAS 2015	45	317.49	149.82	0
CONCLUIDAS 2016	84	473.11	113.13	0
EN PROCESO 2016	4	255.41	116.30	0
FERROVIARIO	3	55,816.88	70.70	3
EN PROCESO 2017-2018	1	44,067.00	57.70	1
PROYECTADAS 2016-2018	2	11,749.88	13.00	2
AEROPUERTOS	1	1,500.00	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1,500.00	-	0
Total general	287	104,699.59	3,833.75	13

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		1,526,232.0	1,526,232.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		1,390,473.0	1,390,473.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		125.0	125.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		125.0	125.0



MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	3,461			3,461
INMUEBLES ESCOLARES	2,583			2,583
CENTROS DE SALUD	420			420
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	368			368
OFICINAS DE GOBIERNO	84			84
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	6			6

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	103.56	149.20	130.00	382.76
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	107	104	85	107
JORNALES	1,247,584	1,792,432	500,659	3,540,675
BENEFICIARIOS	22,396	27,554	9,330	59,280
LONGITUD	2,448.38	167,225.00	337.28	170,011
CAMINOS			245	245

Fecha de recepción: Lunes, 4 de julio de 2016, mediante Oficio No.: SCT.6.10.422-092/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 4 de julio de 2016, mediante el Oficio No.6.0.1-/353/2029 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)	01/10/2006	31/12/2013	3,603.30	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION INAUGURADA 01-MAR-14	2 Entronques y 6 estructuras	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096350010	PNI421
2	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ATLACOMULCO-PALMILLAS	01/01/2007	31/12/2013	2,521.00	FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO INAUGURADA 03-ENE-14	58.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	5096350006	PE
3	DISTRIBUIDOR VIAL "IXTAPALUCA", UBICADO EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA	15/08/2011	31/12/2013	1,300.00	INAUGURADA 02-JUL-14	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	5096350001	--
4	AMECAMECA-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)	01/10/2011	01/03/2014	660.00	INAUGURADA 19-MAR-14	21.70	INAUGURADAS 2014	AUTOPISTAS	05096350001	PE
5	CG-207, PAVIMENTACION EN CALLES DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	01/05/2013	31/12/2013	436.70	INAUGURADA 02-JUL-14	83.05	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003 12096350052 09096350012 09096350014	PNI276
6	DISTRIBUIDORES VIALES COACALCO	31/10/2012	30/09/2014	283.00	INAUGURADA 30-SEP-14	2 DISTRIBUIDORES	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES		--
7	LIBRAMIENTO DE ACAMBAY	02/03/2014	16/12/2014	755.70	INAUGURADA 26-ENE-15	13.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	05096350006	--
8	CG-264 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE LAS TORRES Y EL AEROPUERTO.	01/03/2014	18/12/2014	307.00	INAUGURADA 18-MAYO-15	1.76	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096350049	PNI331
9	CG-262 CONSTRUIR UN DISTRIBUIDOR VIAL EN AVENIDA 5 DE MAYO Y PROLONGACION SALVADOR DIAZ MIRON	01/03/2014	24/12/2014	264.40	INAUGURADA 06-MAR-15	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096350051	PNI213
10	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y CIRCUITO DE CONEXIÓN PRIMERA ETAPA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN"	mar-14	sep-15	199.99	OBRA A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INAUGURADA 11-09-2015	1.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES		--
11	CG-203 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA CAMINO REAL, DE SAN MATEO	07/05/2013	23/12/2014	128.10	INAUGURADA 23-ENE-15	1 PSV	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096350008	PNI107
12	E.C. 42.0 AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - LOS REYES	01/03/2014	30/06/2014	7.28	INAUGURADO 03/12/2015	0.90	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350023	--
13	CG-258 CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE BOULEVARD AEROPUERTO Y TOLUCA - NAUCALPAN.	01/02/2014	15/05/2016	700.00	N/A EL COMPROMISO SE ENCUENTRA CONCLUIDO EN, SE ESTAN REALIZANDO OBRAS ADICIONALES SOLICITADAS POR LOS VECINOS ALEDAÑOS A LA ZONA DE OBRA DEL DISTRIBUIDOR .	1 DISTRIBUIDOR (Longitud Total: 7.00)	INAUGURADAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350048	PNI354
14	INSTALACION DE ITS EN LAS AUTOPISTA MEXICO - MORELIA (TRAMO ATLACOMULCO - MARAVATIO) Y SIGLO XXI	30/05/2013	30/11/2014	550.00		--	CONCLUIDAS 2013-2014	AUTOPISTAS		--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
15	VIALIDADES PAQUETE I Y II, VIALIDADES DEL PAQUETE 1 AL 8	01/02/2014	30/12/2014	383.77		50.75	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409210002	--
16	CG-261, CONSTRUIR UN PUENTE ELEVADO EN LA CARRETERA LIBRE MEXICO - TOLUCA, PARA AGILIZAR EL TRANSITO	01/06/2013	15/12/2013	140.00	ENTREGADA POR EPN EVENTO DISTRIBUIDOR IXTAPALUCA	2 pasos vehiculares	CONCLUIDAS 2013-2014	AUTOPISTAS		PNI134
17	SAN FRANCISCO DE LA LOMA - SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SANTA CRUZ DEL RINCON	01/05/2013	29/07/2013	37.50		10.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350029	--
18	CIRCUITO INTERIOR VIAL ATLAUTLA - CABECERA MUNICIPAL.	27/05/2013	22/11/2013	26.91		3.58	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350052	--
19	(GUADALUPE CHICO- LA MESA) YONDECE DEL CEDRO, ESTADO DE MEXICO	01/11/2005	01/08/2012	26.91		5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350011	--
20	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARRETERA ZUMPAHUACAN TONATICO	16/01/2014	14/07/2014	23.21		2.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350041	--
21	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE	16/08/2014	13/11/2014	22.55		7.25	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	--
22	SULTEPEC A LA GOLETA	01/07/2013	27/12/2013	22.45		10.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350010	--
23	RECONSTRUCCION DE YERBAS BUENAS - SAN JOSE ARENAL - TECOMATEPEC	01/06/2013	01/06/2014	19.92		7.45	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350042	--
24	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA.	16/01/2014	14/06/2014	19.49		7.47	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	--
25	YEBUCIVI - SAN MARCOS	01/05/2013	01/12/2013	15.30		15.31	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350057	--
26	SAN JOSE DEL RINCON - CONCEPCION DEL MONTE	16/05/2013	14/07/2014	14.95		4.33	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350054	--
27	KM. 27 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - PLATEROS - EJIDO DE PALMILLAS	01/09/2014	29/11/2014	12.17		4.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350019	--
28	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE REMANENTE 8 CALLES	15/10/2014	30/11/2014	10.48		3.36	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
29	SAN LORENZO TLACOTEPEC - MANTO DEL RIO.	07/10/2013	15/12/2013	9.74		2.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350043	--
30	LA ERMITA - SANTA MARIA APAXCO	01/05/2013	01/09/2013	9.73		3.55	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350048	--
31	CAMINO CABECERA MUNICIPAL – SAN NICOLAS EL ORO – SANTIAGO OXTEMPAN	18/03/2014	01/05/2014	9.60		1.59	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350029	--
32	BUENAVISTA – LAS GOLONDRINAS – LAS ARENAS – MADO SECTOR UNO	25/02/2014	30/06/2014	9.56		2.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350042	--
33	STA. MARIA RAYON - ZONA AGRICOLA MALVINAS.	16/01/2014	14/06/2014	9.50		3.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350045	--
34	TENANCINGO – TENERIA - TECOMATLAN	25/02/2014	15/06/2014	9.48		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	--
35	AV. ISIDRO FABELA TRAMO DE AV. LAZARO CARDENAS - AV. CUAUHTEMOC (CUERPO B)	25/02/2014	15/06/2014	9.32		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	--
36	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARIA DEL MONTE-PAPELERA	ago-14	nov-14	9.10		1.92	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	--
37	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY - GUERRERO	26/08/2013	23/11/2013	8.99		0.56	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	--
38	SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS	16/05/2014	28/08/2014	8.61		2.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350006	--
39	JIQUIPILCO EL VIEJO	01/05/2013	01/09/2013	8.55		1.66	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350029	--
40	AV. ISIDRO FABELA TR. DE AV. CUAUHTEMOC. A AV. EJE 10	25/02/2014	25/05/2014	8.13		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350025	--
41	LIBRAMIENTO SAN VICENTE-COATEPEC-CARRETERA COATEPEC, EJIDO COATEPEC	01/05/2013	28/08/2013	8.12		1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350014	--
42	E.C. KM. 19 (ATLACOMULCO – EL ORO) – LA CONCEPCION	01/03/2014	30/06/2014	7.88		1.35	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350017	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
43	TIANGUISTENCO. TR. SANTIAGO - SAN PEDRO TLATIZAPAN	15/03/2014	30/05/2014	7.83		3.51	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350023	--
44	SAN JOSE CHALMITA - SAN MIGUEL ATEOPAN	25/02/2014	15/06/2014	7.68		3.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350034	--
45	BAÑE - JUNICA	13/03/2014	30/06/2014	7.67		1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	--
46	E.C.E. 14 - EJIDO LA SOLEDAD.	01/03/2014	30/06/2014	7.67		1.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350053	--
47	SAN SIMON-RANCHO VIEJO	29/04/2014	27/07/2014	7.67		1.52	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350044	--
48	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	25/02/2014	15/06/2014	7.65		1.75	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	--
49	E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - TEMASCALCINGO	oct-14	nov-14	7.61		1.16	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350022	--
50	CAMINO: KM.49.9 LA PUERTA-SULTEPEC- RASTROJO LARGO-HUAYATENCO.	09/05/1900	27/11/2013	7.46		5.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096350008	--
51	E.C. NO. 13 SAN JOSE SOLIS - JUANDO	07/03/2014	05/05/2014	7.25		1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350013	--
52	CAMINO DE ENLACE (OLIMPICA - JUAREZ).	02/10/3270	26/09/2013	7.20		1.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350035	--
53	E.C. (AUTOPISTA MEXICO – QUERETARO) - MATAXHI	17/07/1925	30/06/2014	7.19		1.23	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	--
54	CIRCUITO CALPULALPAN.	mar-14	may-14	7.17		1.05	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	--
		01/09/1900								
55	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA.	mar-14	may-14	7.13		1.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
56	AUTOPISTA (TOLUCA-ATLACOMULCO)-SANTA CLARA	25/03/2011	07/07/2014	7.09		2.72	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350033	--
57	E.C. (SOYANIQUILPAN – JILOTEPEC) XHITEY - BUENAVISTA	25/02/2014	25/05/2014	7.00		1.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350046	--
58	E.C. (TEXCOCO - LECHERIA KM. 29+500) - PASCUAL LUNA	01/07/2013	01/05/2014	6.99		1.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350009	--
59	E.C.E NO. 3 MOXTEJE LOMA DE HIDALGO	oct-14	nov-14	6.72		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350071	--
60	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	jun-14	sep-14	6.72		1.57	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350027	--
61	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA.	14/03/2014	11/06/2014	6.71		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	--
62	VALLE DE BRAVO AMANALCO DE BECERRA TURCIO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 8+000 AL KM. 18+000.	25/02/2014	30/06/2014	6.71		2.94	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	--
63	TEMASCALTEPEC - LAS JUNTAS	mar-14	jun-14	6.71		16.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096350018	--
64	E.C. (ECATEPEC - HUEHUETOCA) - PRADOS SAN FRANCISCO	01/07/2013	01/10/2013	6.70		1.85	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350060	--
65	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	13/03/2014	10/06/2014	6.70		1.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	--
66	LIBRAMIENTO AXAPUSCO UNIVERSIDAD	13/03/2014	10/06/2014	6.69		0.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350016	--
67	JUANDO - PUENTECILLAS RAMAL ANTORCHA.	16/04/2014	29/06/2014	6.69		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350033	--
68	TIANQUISTENCO, TR: ROJASTITLA-ATILAPA (RECARPETEO)	07/03/2014	04/06/2014	6.67		2.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350011	--
69	SANTA BARBARA – LOS PIÑONES – POTRERO ARRIBA	24/03/2014	21/07/2014	6.62		1.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
70	E.C. (ARCO NORTE-ALDAMA)-LLANO GRANDE.	18/03/2014	15/06/2014	6.52		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350064	--
71	TENANCINGO - SAN ANTONIO AGUA BENDITA	01/05/2013	01/07/2013	6.22		0.93	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350022	--
72	COMUNIDAD DE TAPAXCO	01/03/2014	30/06/2014	5.78		3.15	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350046	--
73	SANTA MARIA NATIVITAS - FONDO.	16/04/2014	14/07/2014	5.78		2.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	--
74	SAN DIEGO ALCALA - TECNOLOGICO - SAN JOSE PATHE.	18/03/2014	30/06/2014	5.68		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350058	--
75	CAMINO A LUMBRERAS	25/02/2014	25/05/2014	5.58		0.98	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350023	--
76	CONCEPCION DE LOS BAÑOS JALPA DE LOS BAÑOS SAN FRANCISCO DEL RIO.	01/05/2013	14/07/2013	5.55		1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350007	--
77	LOS REYES FFCC, CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE - VIALIDAD MEXIQUENSE.	feb-14	may-14	5.52		0.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350040	--
78	E.C. (SANTIAGO - MARQUESA) - COAMILPA DE JUAREZ	24/03/2014	15/06/2014	5.33		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350050	--
79	E.C. KM. 45 (VILLA VICTORIA – EL ORO) – BARRIO DEL GIGANTE	01/03/2014	30/06/2014	5.21		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	--
80	CALLE BUENAVISTA	oct-14	nov-14	5.08		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350021	--
81	IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - SANTA ANA LA LADERA	jul-14	sep-14	4.99		0.75	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350036	--
82	ACCESO A SAN LORENZO HUEHUCTITLAN	ago-14	oct-14	4.87		1.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350003	--
83	SANTA MARIA CITENDEJE – EL MANTO	13/03/2014	30/06/2014	4.80		1.73	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350019	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
84	IXTLAHUACA DE RAYON - SAN JERONIMO IXTAPATONGO, RAMAL AL BARRIO DE SAN JOAQUIN EL JUNCO.	25/02/2014	30/06/2014	4.79		0.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350044	--
85	SAN LUCAS DEL MAIZ-SAN JOSE DE LA LAGUNA-XALPA-TEJUPILCO.	mar-14	jun-14	4.79		5.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350038	--
86	AHUATENCO-COLONIA CAMPESINA, SAN ANTONIO DEL PROGRESO.	06/03/2014	03/06/2014	4.78		2.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350013	--
87	SAN LUCAS OCOTEPEC-ESTUTEMPAN	05/03/2014	02/06/2014	4.78		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350009	--
88	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	01/04/2014	29/06/2014	4.78		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350031	--
89	VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA VIALIDADES DE IXTAPALUCA (CARRIL ZOQUIAPAN)	may-14	ago-14	4.78		0.77	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350027	--
90	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES.	abr-14	jul-14	4.77		0.75	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	--
91	CAMINO SAN LUCAS - OCOPIULCO	oct-14	nov-14	4.76		0.45	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	--
92	E.C. (TEPETLIXPA - AMECAMECA DE JUAREZ), TR: KM. 0+000 AL KM. 2+400	01/03/2014	28/06/2014	4.75		1.54	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350010	--
93	ACCESO A LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC DE ZARAGOZA	ago-14	oct-14	4.74		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	--
94	CARRETERA (ATLACOMULCO - EL ORO) KM 13 LA JORDANA	16/04/2014	14/06/2014	4.69		1.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350022	--
95	GANZDA - SANTIAGO OXTOC TOXHIE - CARRETERA PANAMERICANA	01/03/2014	15/06/2014	4.65		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350030	--
96	SAN JOSE DEL TUNAL - EL SALTO	25/02/2014	15/06/2014	4.65		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	--
97	E.C. (LOS REYES-SAN JOSE BOQUI) - EL LINDERO.	mar-14	may-14	4.65		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350035	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
98	STA. MARIA RAYON - U. DEPORTIVA MALVINAS.	18/03/2014	15/06/2014	4.57		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	--
99	PEREZ DE GALEANA CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN	13/03/2014	10/06/2014	4.40		1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	--
100	E.C. (TENANINGO - TENERIA) - TEPOXTEPEC.	01/05/2013	29/07/2013	4.16		1.06	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350037	--
101	LA CONCEPCION LLANO DE LOS NEGROS	07/03/2014	04/06/2014	4.09		0.81	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350002	--
102	BARRIO EL PANTEON – SANTIAGO CASANDEJE	15/03/2014	30/06/2014	4.03		0.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	--
103	KM. 38 (MEXICO-TULANCINGO)- NOPALTEPEC, TR: KM 0+000-3+000 (RECONSTRUCCION)	12/03/2014	06/06/2014	3.93		0.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350007	--
104	CALLE REVOLUCION	sep-14	nov-14	3.93		0.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350020	--
105	E.C. (LA GOLETA HEROES CARRANZA) IGNACIO ZARAGOZA.	jul-14	sep-14	3.84		0.85	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350007	--
106	FONDO EL AZAFRAN.	15/03/2014	15/06/2014	3.83		1.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	--
107	SAN JUAN COAJOMULCO - PANTEON, INCLUYE RAMAL	01/03/2014	29/04/2014	3.82		0.37	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350012	--
108	SABANILLAS SAN LUCAS TEMASTITLAN E.C. (DONATO DE GUERRA IXTAPAN DEL ORO)	07/03/2014	01/06/2014	3.82		0.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350026	--
109	SAN ISIDRO TR. AV PIRULES - CALLE ESCALERILLAS.	01/05/2013	14/07/2013	3.80		0.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350024	--
110	BARRIO DE GUADALUPE - SAN JOAQUIN	01/03/2014	30/06/2014	3.80		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350021	--
111	CALLE DE LA ROSA	ago-14	oct-14	3.26		1.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
112	ENTRADA A ATOTONILCO A LA DELEGACION SAN PABLO ATOTONILCO	25/02/2014	26/03/2014	3.25		0.85	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350032	--
113	CAMINO HACIA EL PANTEON DE SAN ANDRES DE LAS PERAS Y SAN BERNARDO TLALMIMILPAN.	15/03/2014	12/06/2014	3.07		0.68	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350040	--
114	LAS TARRIAS.	18/03/2014	15/06/2014	2.79		0.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350002	--
115	CALLE YUCATAN, TR. DE AV. AGRICULTURA A LATERAL DE LA AUTOPISTA	oct-14	dic-14	2.79		0.36	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350023	--
116	CAMINO REAL A TEPETLITLAN	sep-14	dic-14	2.77		1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	--
117	LIBRAMIENTO CAMINO NACIONAL (LOMA BONITA - CARRETERA A TEQUIXQUIAC).	12/03/2014	09/06/2014	2.49		0.63	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350034	--
118	CHAPA DE MOTA-DOXCHICHO-JILOTEPEC.	12/03/2014	10/04/2014	1.90		0.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350016	--
119	CHAPA DE MOTA - EL QUINTE.	15/03/2014	15/06/2014	1.63		0.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350036	--
120	PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA VEGA.	28/03/2014	15/06/2014	1.62		0.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350001	--
121	NEPANTLA-TLALAMAC Y RAMAL A ALOTEPEC	01/05/2013	29/07/2013	1.29		0.28	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350043	--
122	NOPALTEPEC SAN MIGUEL ATEPOXCO	01/08/2013	29/10/2013	1.29		1.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350003	--
123	E.C.F. TEXCOCO - LECHERIA KM 30+100 - BARRIO SANTIAGO.	01/03/2014	30/05/2014	0.95		0.18	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350019	--
124	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA DE DOS A CUATRO CARRILES KM 12+160 AL 22+720	feb-08	ene-15	2,600.00		12.00	CONCLUIDAS 2015	AUTOPISTAS		--
125	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	211.06		126.45	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
126	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS, (17 OBRAS)	mar-15	dic-15	120.89		120.89	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
127	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	86.37		1,078.79	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
128	RECONSTRUCCION DE PUENTES	feb-15	sep-15	10.56		2 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	--
129	EL MOGOTE-TEPOZAN	oct-15	dic-15	10.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350024	--
130	AV. ISIDRO FABELA TRAMO: AV. CUAUHTEMOC-LAZARO CARDENAS	jul-15	dic-15	8.00		1.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	--
131	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	abr-15	nov-15	7.00		357 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096350021	--
132	XALA- SANTA ANA	jul-15	dic-15	7.00		1.10	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350027	--
133	E.C. (SAN ANDRES NICOLAS BRAVO - MALINALCO) - NOXTEPEC DE ZARAGOZA	jul-15	dic-15	6.00		1.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	--
134	E.C.F. MEXICO NUM. 15 (EL YUKON)- SAN AGUSTIN POTEJE SUR	jul-15	dic-15	5.30		0.88	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350005	--
135	PEREZ DE GALEANA-CAMINO HACIENDA VIEJA-SANTA MARIA AJOLOAPAN	ago-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	--
136	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	--
137	SAN LUCAS - OCOPULCO	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	--
138	PARQUE ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350067	--
139	ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN.	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350042	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
140	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - EL ESTANCO	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350004	--
141	CIRCUITO EL ROSAL	jul-15	nov-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350039	--
142	ADOLFO LOPEZ MATEOS (BLVD. HDA. SAN JOSE DEL CERRO GORDO)	15/07/2015	15/12/2015	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350020	--
143	ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SOLIS	jul-15	dic-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350004	--
144	CERRITOS DE CARDENAS - CALDERAS	jul-15	nov-15	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350005	--
145	SAN JOSE - MONTE ALTO	jul-15	dic-15	5.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350057	--
146	BAÑE-JUNICA	oct-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	--
147	ARROYO ZARCO PUEBLO - ENCINILLAS EJIDO	nov-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350038	--
148	CAXBONCUAC PARAJE-EL SALTO (CHAPA DE MOTA)	nov-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350036	--
149	SANTA MARÍA NATIVITAS – FONDO	oct-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	--
150	E.C. (AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO) – MATAXHI	oct-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	--
151	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	oct-15	dic-15	5.00	OBRA INCLUIDA EN EL QUINTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL GEM	1.65	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096350031	--
152	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	oct-15	dic-15	5.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL QUINTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL GEM	1.25	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	--
153	CALLE DE LA ROSA	oct-15	dic-15	4.50	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
154	SAN LORENZO TOXICO - SAN FRANCISCO IXTLAHUACA	jul-15	nov-15	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350007	--
155	E.C.E. (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EL RINCON DE LOS PERALES	jul-15	dic-15	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350003	--
156	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	28/07/2015	31/12/2015	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350027	--
157	TIMILPAN - EL PALMITO	jul-15	dic-15	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350073	--
158	BOMBARO - PASTORES - SAN PEDRO POTLA	jul-15	dic-15	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350074	--
159	STA. MARIA RAYON - SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, INCLUYE RAMAL	jul-15	dic-15	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350076	--
160	E.C. KM.45 (VILLA VICTORIA - EL ORO) - BARRIO DEL GIGANTE	jul-15	dic-15	3.70		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	--
161	BARRIO EL PANTEON - SANTIAGO CASANDEJE	jul-15	dic-15	3.60		0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	--
162	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA	oct-15	dic-15	3.50	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	--
163	CAMINO LOS ARCOS-SAN FELIPE TEOTITLAN	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350001	--
164	CARRETERA ATOTONILCO - SAN JOSE DEL TUNAL. (SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO)	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	--
165	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	--
166	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA	jul-15	nov-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	--
167	CIRCUITO CALPULALPAN	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
168	CAMINO REAL TEPETITLAN	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	--
169	E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 11 - UNIVERSIDAD BICENTENARIO JILOTEPEC	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350059	--
170	SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350056	--
171	EL TESORO - CELAYITA	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350010	--
172	EL RANCHITO - LA NAVE	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350072	--
173	SAN JUAN LA ISLA - STA. MARIA JAJALPA	jul-15	dic-15	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350069	--
174	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY – GUERRERO	oct-15	dic-15	3.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	--
175	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	dic-15	mar-16	43.20	OBRA INCLUIDA EN EL CUARTO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSO AL GEM	23.32	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	--
176	PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS SAN MARTIN-SAN MIGUEL Y BEJUCOS A PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA)	ago-15	mar-16	35.60		5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350029	--
177	CONSTRUIR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO EN UNA PRIMERA ETAPA EL CAMINO REAL DE TIERRA DE ADENTRO	feb-15	mar-16	23.46		3.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350034	--
178	CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	oct-15	mar-16	20.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 3ER. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 46.00 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350033	--
179	IXTAPAN DE LA SAL - SAN ALEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	10.40		1.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
180	VIALIDADES EN IXTAPALUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600	mar-16	may-16	10.40		2.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
181	CALLE BENITO JUAREZ (1.06 KM.) CALLE IGNACIO ALLENDE (0.24 KM.) CALLE JOSE MARIA MORELOS (0.26 KM.) AV. LIC. ABEL C. SALAZAR (0.80 KM.) CALLE FRANCISCO TERAN (0.24 KM.)	feb-16	may-16	9.35		2.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
182	CAMINO SAN BARTOLO - TIZAYUCA DEL KM. 1+800 AL KM. 3+000	feb-16	may-16	9.00		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
183	SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SAN ONOFRE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	feb-16	may-16	8.75		1.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
184	TENANCINGO - TENERIA - TECOMATLAN	jul-15	mar-16	8.00		1.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	--
185	VALLE DE BRAVO- AMANALCO DE BECERRA- TURCIO- SAN AGUSTIN ALTAMIRANO	jul-15	mar-16	7.50		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	--
186	CARR. VIEJA (MÉXICO - TEOTIHUACAN(TRAMO SANTA CATARINA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	7.00		2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
187	SAN LUIS BORO - SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500	feb-16	jun-16	7.00		2.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
188	CAMINO PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO AZTACAMECA DEL KM. 8+300 AL KM. 9+050 Y DEL KM. 10+050 AL KM. 10+700	feb-16	may-16	7.00		1.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
189	CANALEJAS - EL RINCON DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	7.00		1.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
190	E.C.(TOLUCA-CD. ALTAMIRANO)-OJO DE AGUA DEL KM. 0+AL KM. 0+870, STA. CRUZ CUAUHTENCO- ZINACANTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180 Y E.C. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO-OJO DE AGUA TRAMO:	mar-16	may-16	7.00		1.25	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
191	SAN PABLO TLALCHICHILPA - BARRIO SAN FRANCISCO TLALCHICHILPAN (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	7.00		1.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
192	VIALIDAD PRIMARIA COL. ESMERALDA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	feb-16	may-16	6.45		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
193	VIALIDADES CON UNA META DE 1.614 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ANTONIO BARBOSA (0.33 KM.) - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (0.58 KM.) - CALLE BENITO JUAREZ (0.70 KM.)	feb-16	abr-16	6.26		1.61	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
194	VIALIDADES CON UNA META DE 1.11 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.48 KM.) - PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.34 KM.) - CALLE CATARINO	feb-16	abr-16	6.24		1.10	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	PE
195	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CONCRETO HIDRAULICO) (12 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550	mar-16	may-16	6.00		0.55	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
196	BOULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - PEDRO LUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 (2 CUERPOS) (CONCRETO HIDRAULICO)	feb-16	jun-16	6.00		0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
197	AV. ESTADO DE MÉXICO (2 CUERPOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	abr-16	6.00		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
198	SAN ALEJO - MESON NUEVO	mar-16	may-16	6.00		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
199	PROLONGACION HERIBERTO ENRIQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700	mar-16	abr-16	5.80		1.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
200	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+350	mar-16	abr-16	5.50		1.35	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
201	LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+080	feb-16	abr-16	5.25		1.08	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
202	CANALEJAS - SAN LORENZO OCTEYUCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	5.22		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
203	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS - SANTA MARIA DEL MONTE - PAPELERA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	mar-16	may-16	5.11		2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
204	CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440	feb-16	abr-16	5.04		1.44	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
205	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES	jul-15	mar-16	5.00		0.45	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350010	--
206	CIRCUITO TABLON CHICO	jul-15	mar-16	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350044	--
207	CALLE ARTURO MONTIEL	03/08/2015	31/03/2016	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350066	--
208	TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL	13/07/2015	31/03/2016	5.00		0.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350053	--
209	CALLE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JUAREZ CENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	feb-16	abr-16	4.95		1.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
210	SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 9+520 AL KM. 10+600	mar-16	abr-16	4.80		1.08	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
211	CALLE JOSE FRANCISCO GUERRA	feb-16	mar-16	4.50		0.04	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
212	SAN LUIS BORO - SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL KM. 2+500 AL KM. 4+000	feb-16	jun-16	4.31		1.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
213	LA ESPERANZA - LOS ARANA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	may-16	4.30		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
214	E.C. (ATLACOMULCO - JILOTEPEC) - SAN LORENZO DE LOS METATES DEL KM 0+000 AL KM 1+100	feb-16	may-16	4.11		1.10	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
215	SAN MARTIN-PALMAR DE GUADALUPE-PACHUQUILLA-EL ZAPOTE-AGUA DULCE-LIM. MPAL. ZUMPAHUACAN	jul-15	mar-16	4.00		0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096350005	--
216	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARÍA DEL MONTE-PAPELERA)	oct-15	mar-16	4.00	OBRA CONTEMPLADA EN EL 2DO. CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, POR UN MONTO DE 19.006 MDP	0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	--
217	TABORDA E.C. AMOMLULCO - PRESA ALZATE (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 2+000 AL KM. 3+000	feb-16	mar-16	4.00		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
218	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM 1+000 AL KM 2+300	feb-16	may-16	3.80		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
219	CALLE DE LOS SERRANOS, TRAMO CALZADA DEL PANTEON A AV. LERMA	feb-16	abr-16	3.77		0.81	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
220	NEZAHUALCOYOTL ORIENTE - RINCONADA SANTA TERESA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	feb-16	may-16	3.70		1.10	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
221	SAN SIMON DE GUERRERO - SAN ANDRES DE LOS GAMA	feb-16	abr-16	3.50		0.85	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
222	CAMINO COL. HIDALGO - RINCON DE JAIMES	feb-16	may-16	3.50		0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
223	CAMINO RINCON DE AGUIRRE - RINCON DEL CARMEN	feb-16	may-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
224	E.C. (ACAMBAY-TIMILPAN) - SAN JUANICO SECTOR II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
225	SANTA MARIA NATIVITAS - SAN LORENZO CUAUTENCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	mar-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
226	GUADALUPE CACHI - EJIDO SAN IGNACIO EL PEDREGAL DEL KM. 5+500 AL KM. 6+500	mar-16	may-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
227	HUAYATENCO - CARBAJAL DEL KM. 7+000 AL KM. 8+000	feb-16	abr-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
228	AV. PONIENTE 3 ENTRE AV. AXAYACATL Y AV. CUITLAHUAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	3.50		0.33	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
229	TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	feb-16	abr-16	3.50		0.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
230	5 DE FEBRERO AGRICOLA BELLAVISTA, DEL KM 0+000 AL 1+000	mar-16	abr-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
231	CAMINO SOLANOS-CAPULHUAC DEL KM. 0+000 AL 0+800	feb-16	mar-16	3.50		0.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
232	TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	3.50		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
233	CANALEJAS-LA COMUNIDADDEL KM. 0+000 AL KM 0+600	feb-16	may-16	3.50		0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
234	E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO DEL KM.1+950 AL KM. 2+500 Y DEL KM. 3+780 AL KM. 4+330	feb-16	abr-16	3.50		1.10	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
235	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	jun-16	3.40		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
236	MAVORO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	3.40		1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
237	SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 Y RAMAL AL CENTRO DE SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150	feb-16	jun-16	3.40		0.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
238	CALLE FCO. I. MADERO TRAMO DE AV. BENITO JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA	feb-16	abr-16	3.23		0.77	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
239	AVENIDA BALMORAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+810	feb-16	mar-16	3.20		0.81	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
240	TEPETLIXPA-CHIMALACA E.C. MEX. 115	jul-15	mar-16	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350070	--
241	CAMINO ALIMENTADOR TEPETLIXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENRO (AMECAMECA-CUAUTLA)	jul-15	mar-16	3.00		0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350025	--
242	AV. PONIENTE 17 ENTRE AV. CHIMALPAIN Y AV. AXAYACATL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	2.95		0.33	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
243	CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ (CONCRETO HIDRAULICO) (14 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+240	mar-16	may-16	2.85		0.24	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
244	CALLE DALIA - UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400	mar-16	may-16	2.85		0.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
245	PLAN DE GUADALUPE AV. JACARANDAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-16	may-16	2.42		5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
246	CARRETERA DE ACCESO A LA CIENEGA. DEL TRAMO 0+520 AL 1+200.	feb-16	may-16	2.21		0.68	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
247	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 1+350 AL KM. 1+750	feb-16	abr-16	2.04		0.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
248	LOMA LARGA - TEQUIXQUIAC - SANTA MARIA CUEVAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	feb-16	mar-16	2.00		0.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
249	SAN LORENZO TLACOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+609	feb-16	abr-16	1.58		0.61	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
250	CALLE MACARIO ROA A JABO OROZCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450	feb-16	abr-16	1.56		0.45	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
251	CAMINO A COBAEM ENTRE CALLE ALCANFOR Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+390	feb-16	abr-16	1.36		0.39	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
252	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300	feb-16	mar-16	1.35		0.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
253	CALLE BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+280	feb-16	mar-16	1.20		0.28	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
254	CAMINO ZINACANTEPEC - SAN CRISTOBAL TECOLIT TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+386	mar-16	may-16	1.12		0.39	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
255	CALLE NEZAHUALCOYOTL DE PASEO DE LOS NSURGENTES A ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+360	feb-16	may-16	1.09		0.36	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
256	CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+270	mar-16	may-16	0.77		0.27	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
257	CALLE PUERTO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200	mar-16	abr-16	0.70		0.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
258	CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+190	mar-16	abr-16	0.66		0.19	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
259	CG-259 AMPLIAR CARRETERA FEDERAL MEX - TOLUCA EN EL TRAMO LA MARQUESA - PASEO TOLLOCAN	07/07/2014	31/07/2016	3,739.00		13.50	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	12096350080	PNI578
260	AMPLIACION DEL 2DO CUERPO DEL ARCO NORTE, TR. JILOTEPEC-ATLACOMULCO.	01/02/2014	30/11/2016	1,600.00		52.00	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	1600	PNI498
261	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	16/02/2016	30/11/2016	509.52	SE REALIZARAN TRABAJOS EN LAS CARRETERAS: TOLUCA-CD. ALTAMIRANO, VENTA DE CARPIO-TULANCINGO, MÉXICO-CUAUTLA, TOLUCA-MORELIA, TEXCOCO-ECATEPEC, MÉXICO-TOLUCA, NAUCALPAN-TOLUCA, MÉXICO-PACHUCA Y ATLACOM	144.85	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
262	AVENIDA NOPALTEPEC "VIADUCTO PONIENTE BICENTENARIO"	16/04/2013	31/12/2016	231.00	ACTUALMENTE ESTA EN REVISIÓN EL PROYECTO POR AUTORIDADES DE CFE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE TERRENO QUE CONSTITUYE EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TULA A 3180/A 3660 V	5.80	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	10096350045	--
263	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO SANTIAGO TIANGUISTENCO - CHALMA	27/06/2016	30/12/2016	170.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PROYECTO ANTE SCT , EL IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT Y ASI PODER OBTENER EL REGISTRO ANTE SHCP	41.30	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/50	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
264	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS	16/06/2016	30/11/2016	105.50	SE REALIZARAN TRABAJOS EN LAS CARRETERAS LOS REYES-ZACATEPEC (15 KM), MÉXICO-PUEBLA (8.0 KM) Y TEXCOCO-ECATEPEC (7.5 KM)	30.50	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110009	--
265	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL SANTA LUCIA EN EL KM 40+400)	01/07/2016	30/12/2016	97.44		1.20	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS		--
266	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO LA PUERTA SULTEPEC	23/05/2016	19/10/2016	60.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PROYECTO ANTE SCT , EL IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT Y ASI PODER OBTENER EL REGISTRO ANTE SHCP	10.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/51	--
267	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	16/02/2016	30/11/2016	54.69	TOLUCA-MORELIA, VALLEDEBRAVO, TOLUCA-TAXCO, TOLUCA-CD.ALTAMIRANO, VENTADERCARPIO-TULANCINGO, MÉXICO-PACHUCA, ENTRONQUE JOROBAS-TULA, TEXCOCO-ECATEPEC, MÉXICO-TOLUCA, NAUCALPAN-TOLUCA, TOLUCA-PALMILLAS	1,163.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
268	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	16/02/2016	30/11/2016	51.92	CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC (2 PTES), TOLUCA-TAXCO (1), MÉXICO-PACHUCA (6), ATLACOMULCO-PALMILLAS (1), LOS REYES-ZACATEPEC (1) Y TOLUCA-MORELIA (1)		EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	--
269	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016	01/04/2016	29/07/2016	15.41		65.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100002	--
270	MANTENIMIENTO A LAS 139 CALLES DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG 207 EN 12 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	16/02/2016	08/07/2016	10.00		--	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
271	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	16/02/2016	30/11/2016	4.50			EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	--
272	CG-263 CONSTRUIR EL TREN INTERURBANO MEXICO-TOLUCA. PRIMERA ETAPA	07/07/2014	31/12/2017	44,067.00		57.70	EN PROCESO 2017-2018	FERROVIARIO	13093110008	PNI710
273	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ATIZAPAN - ATLACOMULCO	31/07/2014	30/06/2017	5,860.00		34.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI618
274	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA TOLUCA -ATLACOMULCO (INCLUYE LIBRAMIENTO DE ATLACOMULCO)	07/01/2016	17/05/2017	5,500.00		70.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI576
275	VIADUCTO CONEXION INTERLOMAS - NUEVA AUTOPISTA NAUCALPAN TOLUCA	oct-12	dic-17	1,949.20	PARA 2016 SE EJECUTARAN 250.00 MDP	13.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096350033	PE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JULIO DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
276	AUTOPISTA TEXCOCO-ECATEPEC (PIRAMIDES)	16/02/2015	31/01/2018	1,700.00		17.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PE
277	AMPLIACION AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, TRAMO VILLA GUERRERO-IXTAPAN DE LA SAL	15/05/2015	17/07/2017	1,500.00		20.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	0.0	PNI432
278	CG-175 MODERNIZAR LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC.	01/02/2014	15/08/2018	1,327.21	EL PEF DURANTE 2016 SERA DE 270 .00 MDP	58.60	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096410031	PNI461
279	CG-176 MODERNIZAR LA CARRETERA QUE CONECTA VILLA VICTORIA - SAN JOSE DEL RINCON Y EL ORO, CON LA AUTOPISTA ARCO NORTE.	15/07/2015	31/12/2017	746.60	EL PEF 2016 SERA DE 250 MDP	41.74 KM.	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096350032	PNI353
280	DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA ALFREDO DEL MAZO - AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO (PRIMERA ETAPA).	01/08/2012	15/12/2017	686.00	<p>MONTO EJERCIDO POR AÑO</p> <p>2012 \$12,279,597.00</p> <p>2013 \$102,783,472.00</p> <p>2014 \$56,259,951.08</p> <p>2015 \$199,923,488.2</p> <p>LA FECHA DE TERMINACIÓN SERA A RESERVA DEL ENVIO DE RECURSOS EN EL 2016</p>	1 DISTRIBUIDOR (5.98 KM.)	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096350036	PNI351
281	CG-133 ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO	31/08/2016	30/08/2018	11,599.88		13.00	PROYECTADAS 2016-2018	FERROVIARIO	14093110010	PNI667
282	TENANGO - MALINALCO - ALPUYECA	01/01/2017	31/01/2018	3,294.00		73.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS		PNI573
283	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TOLUCA	16/01/2017	31/12/2018	1,500.00		--	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PNI004
284	CG-178 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	14/10/2016	16/12/2016	1,200.00		7.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	44554	PNI315
285	CG-174 APOYAR LA MODERNIZACION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ATLACOMULCO	16/01/2017	16/01/2018	150.00		1 TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	FERROVIARIO		PNI093
286	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA SAN ANDRES KM 15	25/08/2016	28/04/2017	136.02		0.80	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS		--
287	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL OJO DE AGUA EN EL KM 32+200)	14/10/2016	30/12/2016	89.43		1.20	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS		--
