



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



BALANCE DE OBRAS 2013-2018
ESTADO DE MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT

JUNIO 2017


SCT ESTADO DE MEXICO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JUNIO 2017


Infraestructura de Comunicaciones y transportes

-  15 AUTOPISTAS
-  186 CARRETERAS
-  241 CAMINOS RURALES
-  3 FERROVIARIO
-  0 PUERTOS
-  1 AEROPUERTO

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

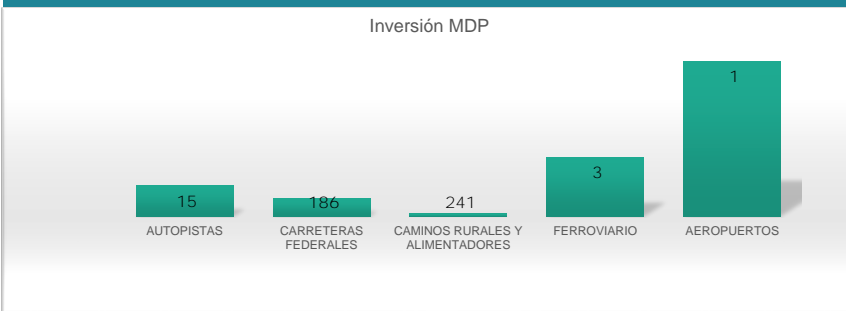

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

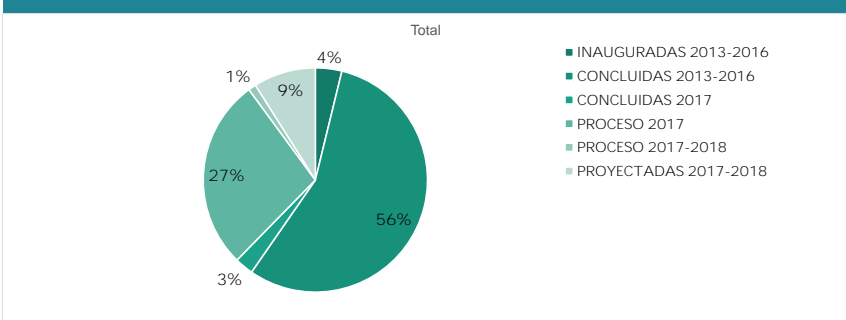

A la fecha, la SCT invierte en la **Obras 446**, **MDP #####** y **Km 4,415.6**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	15	28,666.89	363.50	3
INAUGURADAS 2013-2016	4	7,139.00	47.30	2
CONCLUIDAS 2013-2016	1	550.00	0.00	0
CONCLUIDAS 2017	1	97.44	1.20	0
PROCESO 2017	3	8,960.00	146.00	0
PROCESO 2017-2018	2	7,200.00	87.00	0
PROYECTADAS 2017-2018	4	4,719.45	82.00	1
CARRETERAS FEDERALES	186	17,092.67	2,716.67	6
INAUGURADAS 2013-2016	10	10,062.49	72.26	4
CONCLUIDAS 2013-2016	10	1,046.12	2,545.24	0
CONCLUIDAS 2017	11	2,639.36	1.76	0
PROCESO 2017	119	1,205.74	28.17	1
PROCESO 2017-2018	2	1,727.81	69.14	1
PROYECTADAS 2017-2018	34	411.15	0.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	241	2,570.18	745.50	1
INAUGURADAS 2013-2016	3	449.26	85.16	1
CONCLUIDAS 2013-2016	238	2,120.92	660.34	0
FERROVIARIO	3	55,816.88	590.00	3
PROCESO 2017	1	44,067.00	577.00	1
PROYECTADAS 2017-2018	2	11,749.88	13.00	2
AEROPUERTOS	1	146,162.20	0.00	1
PROCESO 2017-2018	1	146,162.20	0.00	1
Total general	446	250,307.82	4,415.57	14

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	3,849.72	0.08	3,849.81
TELEVISIONES ENTREGADAS	1,390,479	28	1,390,507
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	125		125
BENEFICIARIOS TDT	1,526,233		1,526,233



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	1,071.44
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	33.29
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	1,038.15
SITIOS CONTRATADOS	13,008

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	103.56	149.20	170.70	45.00	468.46
BENEFICIARIOS PET	22,396	27,554	25,506	5,643	81,099
CAMINOS PET	0	0	730	320	1,050
JORNALES PAGADOS PET	1,247,584	1,792,432	1,683,362	398,437	5,121,815
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	107	0	125	125	125
LONGITUD PET	2,448	167,225	0	0	169,673



Fecha de recepción: Martes, 06 de Junio 2017, mediante Oficio No.: SCT.6.10.422.-022/2017 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes, 06 de Junio 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/424/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	CG-261, CONSTRUIR UN PUENTE ELEVADO EN LA CARRETERA LIBRE MEXICO - TOLUCA, PARA AGILIZAR EL TRANSITO	jun-13	dic-13	140.00	2 pasos vehiculares	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS		PNI134
2	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)	oct-06	dic-13	3,603.30	2 Entronques y 6 estructuras	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	11096350010	PNI421
3	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA ATLACOMULCO-PALLILLAS	ene-07	dic-13	2,521.00	55.90	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	5096350006	PE
4	DISTRIBUIDOR VIAL "IXTAPALUCA", UBICADO EN EL KM. 0+000 DE LA CARRETERA CHALCO-CUAUTLA	ago-11	dic-13	1,300.00	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	5096350001	---
5	CG-207, PAVIMENTACION EN CALLES DE MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	may-13	dic-13	436.70	83.06	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5350012 0909635	PNI276
6	AMECAMECA-CUAUTLA (ESTADOS: ESTADO DE MEXICO-MORELOS)	oct-11	mar-14	660.00	21.70	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	05096350001	PE
7	E.C. 42.0 AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - LOS REYES	mar-14	jun-14	7.28	0.90	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350023	---
8	DISTRIBUIDORES VIALES COACALCO	oct-12	sep-14	283.00	2 DISTRIBUIDORES	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES		---
9	LIBRAMIENTO DE ACAMBAY	mar-14	dic-14	755.70	13.30	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	05096350006	---
10	CG-264 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE LAS TORRES Y EL AEROPUERTO.	mar-14	dic-14	307.00	1.76	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350049	PNI331
11	CG-203 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA CAMINO REAL, DE SAN MATEO	may-13	dic-14	128.10	1 PSV	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096350008	PNI107
12	CG-262 CONSTRUIR UN DISTRIBUIDOR VIAL EN AVENIDA 5 DE MAYO Y PROLONGACION SALVADOR DIAZ MIRON	mar-14	dic-14	264.40	1 DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350051	PNI213

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
13	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA DE DOS A CUATRO CARRILES KM 12+160 AL 22+720	feb-08	ene-15	2,600.00	12.00	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS		---
14	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y CIRCUITO DE CONEXIÓN PRIMERA ETAPA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN"	mar-14	sep-15	199.99	1.30	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES		---
15	CG-258 CONSTRUIR EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE BOULEVARD AEROPUERTO Y TOLUCA - NAUCALPAN.	feb-14	may-16	700.00	1 DISTRIBUIDOR (Longitud	INAUGURADAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350048	PNI354
16	LA ESPERANZA - LOS ARANA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	may-16	5.28	1.20	INAUGURADAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
17	CG-259 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA LA MARQUESA-TOLUCA	jul-14	jul-16	3,739.00	13.60	INAUGURADAS 2013-2016	AUTOPISTAS	12096350080	PNI578
18	(GUADALUPE CHICO- LA MESA) YONDECE DEL CEDRO, ESTADO DE MEXICO	nov-05	ago-12	26.91	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350011	---
19	TENANCINGO - SAN ANTONIO AGUA BENDITA	may-13	jul-13	6.22	0.93	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350022	---
20	CONCEPCION DE LOS BAÑOS JALPA DE LOS BAÑOS SAN FRANCISCO DEL RIO.	may-13	jul-13	5.55	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350007	---
21	SAN ISIDRO TR. AV PIRULES - CALLE ESCALERILLAS.	may-13	jul-13	3.80	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350024	---
22	SAN FRANCISCO DE LA LOMA - SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SANTA CRUZ DEL RINCON	may-13	jul-13	37.50	10.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350029	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
23	E.C. (TENANINGO - TENERIA) - TEPOXTEPEC.	may-13	jul-13	4.16	1.06	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350037	---
24	NEPANTLA-TLALAMAC Y RAMAL A ALOTEPEC	may-13	jul-13	1.29	0.28	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350043	---
25	LIBRAMIENTO SAN VICENTE-COATEPEC- CARRETERA COATEPEC, EJIDO COATEPEC	may-13	ago-13	8.12	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350014	---
26	LA ERMITA - SANTA MARIA APAXCO	may-13	sep-13	9.73	3.55	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350048	---
27	JIQUIPILCO EL VIEJO	may-13	sep-13	8.55	1.66	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350029	---
28	CAMINO DE ENLACE (OLIMPICA - JUAREZ).	jun-13	sep-13	7.20	1.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350035	---
29	E.C. (ECATEPEC - HUEHUETOCA) - PRADOS SAN FRANCISCO	jul-13	oct-13	6.70	1.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350060	---
30	NOPALTEPEC SAN MIGUEL ATEPOXCO	ago-13	oct-13	1.29	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350003	---
31	CIRCUITO INTERIOR VIAL ATLAUTLA - CABECERA MUNICIPAL.	may-13	nov-13	26.91	3.58	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350052	---
32	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY - GUERRERO	ago-13	nov-13	8.99	0.56	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
33	CAMINO: KM.49.9 LA PUERTA-SULTEPEC- RASTROJO LARGO-HUAYATENCO.	jul-13	nov-13	7.46	5.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	'08096350008	---
34	YEBUCIVI - SAN MARCOS	may-13	dic-13	15.30	15.31	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350057	---
35	SAN LORENZO TLACOTEPEC - MANTO DEL RIO.	oct-13	dic-13	9.74	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350043	---
36	SULTEPEC A LA GOLETA	jul-13	dic-13	22.45	50.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350010	---
37	ENTRADA A ATOTONILCO A LA DELEGACION SAN PABLO ATOTONILCO	feb-14	mar-14	3.25	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350032	---
38	CHAPA DE MOTA-DOXCHICHO-JILOTEPEC.	mar-14	abr-14	1.90	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350016	---
39	SAN JUAN COAJOMULCO - PANTEON, INCLUYE RAMAL	mar-14	abr-14	3.82	0.37	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350012	---
40	CAMINO CABECERA MUNICIPAL – SAN NICOLAS EL ORO – SANTIAGO OXTEMPAN	mar-14	may-14	9.60	1.59	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350029	---
41	E.C. (TEXCOCO - LECHERIA KM. 29+500) - PASCUAL LUNA	jul-13	may-14	6.99	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350009	---
42	E.C. NO. 13 SAN JOSE SOLIS - JUANDO	mar-14	may-14	7.25	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350013	---
43	E.C. (LOS REYES-SAN JOSE BOQUI) - EL LINDERO.	mar-14	may-14	4.65	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350035	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
44	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA.	mar-14	may-14	7.13	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	---
45	AV. ISIDRO FABELA TR. DE AV. CUAUHEMOC. A AV. EJE 10	feb-14	may-14	8.13	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350025	---
46	E.C. (SOYANIQUILPAN – JILOTEPEC) XHITEY - BUENAVISTA	feb-14	may-14	7.00	1.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350046	---
47	CAMINO A LUMBRERAS	feb-14	may-14	5.58	0.98	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350023	---
48	LOS REYES FFCC, CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE - VIALIDAD MEXIQUENSE.	feb-14	may-14	5.52	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350040	---
49	TIANGUISTENCO. TR. SANTIAGO - SAN PEDRO TLATIZAPAN	mar-14	may-14	7.83	3.51	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350023	---
50	E.C.F. TEXCOCO - LECHERIA KM 30+100 - BARRIO SANTIAGO.	mar-14	may-14	0.95	0.18	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350019	---
51	CIRCUITO CALPULALPAN.	mar-14	may-14	7.17	1.05	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	---
52	RECONSTRUCCION DE YERBAS BUENAS - SAN JOSE ARENAL - TECOMATEPEC	jun-13	jun-14	19.92	7.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350042	---
53	SABANILLAS SAN LUCAS TEMASTITLAN E.C. (DONATO DE GUERRA IXTAPAN DEL ORO)	mar-14	jun-14	3.82	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350026	---
54	SAN LUCAS OCOTEPEC-ESTUTEMPAN	mar-14	jun-14	4.78	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350009	---
55	AHUATENCO-COLONIA CAMPESINA, SAN ANTONIO DEL PROGRESO.	mar-14	jun-14	4.78	2.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350013	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
56	TIANQUISTENCO, TR: ROJASTITLA-ATILAPA (RECARPETEO)	mar-14	jun-14	6.67	2.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350011	---
57	LA CONCEPCION LLANO DE LOS NEGROS	mar-14	jun-14	4.09	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350002	---
58	KM. 38 (MEXICO-TULANCINGO)- NOPALTEPEC, TR: KM 0+000-3+000 (RECONSTRUCCION)	mar-14	jun-14	3.93	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350007	---
59	LIBRAMIENTO CAMINO NACIONAL (LOMA BONITA - CARRETERA A TEQUIXQUIAC).	mar-14	jun-14	2.49	0.63	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350034	---
60	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	mar-14	jun-14	6.70	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	---
61	LIBRAMIENTO AXAPUSCO UNIVERSIDAD	mar-14	jun-14	6.69	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350016	---
62	PEREZ DE GALEANA CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN	mar-14	jun-14	4.40	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	---
63	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA.	mar-14	jun-14	6.71	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	---
64	CAMINO HACIA EL PANTEON DE SAN ANDRES DE LAS PERAS Y SAN BERNARDO TLALMIMILPAN.	mar-14	jun-14	3.07	0.68	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350040	---
65	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA.	ene-14	jun-14	19.49	7.47	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	---
66	STA. MARIA RAYON - ZONA AGRICOLA MALVINAS.	ene-14	jun-14	9.50	3.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350045	---
67	CARRETERA (ATLACOMULCO - EL ORO) KM 13 LA JORDANA	abr-14	jun-14	4.69	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350022	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
68	TENANCINGO – TENERIA - TECOMATLAN	feb-14	jun-14	9.48	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	---
69	AV. ISIDRO FABELA TRAMO DE AV. LAZARO CARDENAS - AV. CUAUHEMOC (CUERPO B)	feb-14	jun-14	9.32	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	---
70	SAN JOSE CHALMITA - SAN MIGUEL ATEOPAN	feb-14	jun-14	7.68	3.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350034	---
71	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	feb-14	jun-14	7.65	1.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	---
72	E.C. (ARCO NORTE-ALDAMA)-LLANO GRANDE.	mar-14	jun-14	6.52	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350064	---
73	E.C. (SANTIAGO - MARQUESA) - COAMILPA DE JUAREZ	mar-14	jun-14	5.33	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350050	---
74	GANZDA - SANTIAGO OXTOC TOXHIE - CARRETERA PANAMERICANA	mar-14	jun-14	4.65	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350030	---
75	SAN JOSE DEL TUNAL - EL SALTO	feb-14	jun-14	4.65	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	---
76	STA. MARIA RAYON - U. DEPORTIVA MALVINAS.	mar-14	jun-14	4.57	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	---
77	FONDO EL AZAFRAN.	mar-14	jun-14	3.83	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350033	---
78	LAS TARRIAS.	mar-14	jun-14	2.79	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350002	---
79	CHAPA DE MOTA - EL QUINTE.	mar-14	jun-14	1.63	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350036	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
80	PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA VEGA.	mar-14	jun-14	1.62	0.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350001	---
81	TEMASCALTEPEC - LAS JUNTAS	mar-14	jun-14	6.71	16.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	'06096350018	---
82	SAN LUCAS DEL MAIZ-SAN JOSE DE LA LAGUNA-XALPA-TEJUPILCO.	mar-14	jun-14	4.79	5.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350038	---
83	E.C. (TEPETLIXPA - AMECAMECA DE JUAREZ), TR: KM. 0+000 AL KM. 2+400	mar-14	jun-14	4.75	1.54	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350010	---
84	JUANDO - PUENTECILLAS RAMAL ANTORCHA.	abr-14	jun-14	6.69	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350033	---
85	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	abr-14	jun-14	4.78	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350031	---
86	BUENAVISTA – LAS GOLONDRINAS – LAS ARENAS – MADO SECTOR UNO	feb-14	jun-14	9.56	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350042	---
87	E.C. KM. 19 (ATLACOMULCO – EL ORO) – LA CONCEPCION	mar-14	jun-14	7.88	1.35	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350017	---
88	BAÑE - JUNICA	mar-14	jun-14	7.67	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	---
89	E.C.E. 14 - EJIDO LA SOLEDAD.	mar-14	jun-14	7.67	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350053	---
90	E.C. (AUTOPISTA MEXICO – QUERETARO) - MATAXHI	mar-14	jun-14	7.19	1.23	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	---
91	VALLE DE BRAVO AMANALCO DE BECERRA TURCIO SAN AGUSTIN ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 8+000 AL KM. 18+000.	feb-14	jun-14	6.71	2.94	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
92	COMUNIDAD DE TAPAXCO	mar-14	jun-14	5.78	3.15	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350046	---
93	SAN DIEGO ALCALA - TECNOLOGICO - SAN JOSE PATHE.	mar-14	jun-14	5.68	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350058	---
94	E.C. KM. 45 (VILLA VICTORIA – EL ORO) – BARRIO DEL GIGANTE	mar-14	jun-14	5.21	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	---
95	SANTA MARIA CITENDEJE – EL MANTO	mar-14	jun-14	4.80	1.73	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350019	---
96	IXTLAHUACA DE RAYON - SAN JERONIMO IXTAPATONGO, RAMAL AL BARRIO DE SAN JOAQUIN EL JUNCO.	feb-14	jun-14	4.79	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350044	---
97	BARRIO EL PANTEON – SANTIAGO CASANDEJE	mar-14	jun-14	4.03	0.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	---
98	BARRIO DE GUADALUPE - SAN JOAQUIN	mar-14	jun-14	3.80	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350021	---
99	AUTOPISTA (TOLUCA-ATLACOMULCO)-SANTA CLARA	mar-11	jul-14	7.09	2.72	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350033	---
100	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARRETERA ZUMPAHUACAN TONATICO	ene-14	jul-14	23.21	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350041	---
101	SAN JOSE DEL RINCON - CONCEPCION DEL MONTE	may-13	jul-14	14.95	4.33	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350054	---
102	SANTA MARIA NATIVITAS - FONDO.	abr-14	jul-14	5.78	2.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	---
103	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES.	abr-14	jul-14	4.77	0.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
104	SANTA BARBARA – LOS PIÑONES – POTRERO ARRIBA	mar-14	jul-14	6.62	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096350001	---
105	SAN SIMON-RANCHO VIEJO	abr-14	jul-14	7.67	1.52	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096350044	---
106	VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA VIALIDADES DE IXTAPALUCA (CARRIL ZOQUIAPAN)	may-14	ago-14	4.78	0.77	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350027	---
107	SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS	may-14	ago-14	8.61	2.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350006	---
108	IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - SANTA ANA LA LADERA	jul-14	sep-14	4.99	0.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350036	---
109	E.C. (LA GOLETA HEROES CARRANZA) IGNACIO ZARAGOZA.	jul-14	sep-14	3.84	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350007	---
110	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	jun-14	sep-14	6.72	1.57	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350027	---
111	ACCESO A SAN LORENZO HUEHUCTITLAN	ago-14	oct-14	4.87	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350003	---
112	ACCESO A LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC DE ZARAGOZA	ago-14	oct-14	4.74	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	---
113	CALLE DE LA ROSA	ago-14	oct-14	3.26	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	---
114	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE	ago-14	nov-14	22.55	7.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	---
115	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARIA DEL MONTE-PAPELERA	ago-14	nov-14	9.10	1.92	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
116	CALLE BUENAVISTA	oct-14	nov-14	5.08	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350021	---
117	KM. 27 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - PLATEROS - EJIDO DE PALMILLAS	sep-14	nov-14	12.17	4.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350019	---
118	E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - TEMASCALCINGO	oct-14	nov-14	7.61	1.16	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350022	---
119	CAMINO SAN LUCAS - OCOPULCO	oct-14	nov-14	4.76	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	---
120	CALLE REVOLUCION	sep-14	nov-14	3.93	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350020	---
121	INSTALACION DE ITS EN LAS AUTOPISTA MEXICO - MORELIA (TRAMO ATLACOMULCO - MARAVATIO) Y SIGLO XXI	may-13	nov-14	550.00	---	CONCLUIDAS 2013-2016	AUTOPISTAS		---
122	VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA NORTE REMANENTE 8 CALLES	oct-14	nov-14	10.48	3.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350015	---
123	E.C.E NO. 3 MOXTEJE LOMA DE HIDALGO	oct-14	nov-14	6.72	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350071	---
124	CALLE YUCATAN, TR. DE AV. AGRICULTURA A LATERAL DE LA AUTOPISTA	oct-14	dic-14	2.79	0.36	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350023	---
125	CAMINO REAL A TEPETLITLAN	sep-14	dic-14	2.77	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	---
126	VIALIDADES PAQUETE I Y II, VIALIDADES DEL PAQUETE 1 AL 8	feb-14	dic-14	383.77	50.75	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409210002	---
127	RECONSTRUCCION DE PUENTES	feb-15	sep-15	10.56	2 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
128	CIRCUITO EL ROSAL	jul-15	nov-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350039	---
129	SANTIAGO OXTHOC - EMILIANO ZAPATA	jul-15	nov-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350054	---
130	SAN LORENZO TOXICO - SAN FRANCISCO IXTLAHUACA	jul-15	nov-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350007	---
131	CERRITOS DE CARDENAS - CALDERAS	jul-15	nov-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350005	---
132	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	211.06	126.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	---
133	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-15	nov-15	86.37	1,078.79	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	---
134	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	abr-15	nov-15	7.00	357 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	14096350021	---
135	AV. ISIDRO FABELA TRAMO: AV. CUAUHEMOC- LAZARO CARDENAS	jul-15	dic-15	8.00	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350026	---
136	XALA- SANTA ANA	jul-15	dic-15	7.00	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350027	---
137	PEREZ DE GALEANA-CAMINO HACIENDA VIEJA-SANTA MARIA AJOLOAPAN	ago-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350049	---
138	ADOLFO LOPEZ MATEOS (BLVD. HDA. SAN JOSE DEL CERRO GORDO)	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350020	---
139	E.C.E. (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EL RINCON DE LOS PERALES	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350003	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
140	E.C. KM.45 (VILLA VICTORIA - EL ORO) - BARRIO DEL GIGANTE	jul-15	dic-15	3.70	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350040	---
141	SANTIAGO YECHE - EL PANTEON - EL LINDERO	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350028	---
142	CAMINO REAL TEPETITLAN	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350018	---
143	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS, (17 OBRAS)	mar-15	dic-15	120.89	120.89	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
144	EL MOGOTE-TEPOZAN	oct-15	dic-15	10.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350024	---
145	E.C. (SAN ANDRES NICOLAS BRAVO - MALINALCO) - NOXTEPEC DE ZARAGOZA	jul-15	dic-15	6.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350014	---
146	E.C.F. MEXICO NUM. 15 (EL YUKON)- SAN AGUSTIN POTEJE SUR	jul-15	dic-15	5.30	0.88	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350005	---
147	E.C. (ATLACOMULCO- TOLUCA) - E.C.(ATLACOMULCO - EL ORO) - CANAL DE LAS MERCEDES	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350009	---
148	SAN LUCAS - OCOPULCO	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350016	---
149	PARQUE ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350067	---
150	ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN.	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350042	---
151	CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - EL ESTANCO	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350004	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
152	ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SOLIS	jul-15	dic-15	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350004	---
153	SAN JOSE - MONTE ALTO	jul-15	dic-15	5.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350057	---
154	BAÑE-JUNICA	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350015	---
155	ARROYO ZARCO PUEBLO - ENCINILLAS EJIDO	nov-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350038	---
156	CAXBONCUAC PARAJE-EL SALTO (CHAPA DE MOTA)	nov-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350036	---
157	SANTA MARÍA NATIVITAS – FONDO	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350039	---
158	E.C. (AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO) – MATAXHI	oct-15	dic-15	5.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350055	---
159	CARRETERA A LA LAGUNITA CANTASHI A LA PRIMARIA	oct-15	dic-15	5.00	1.65	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	13096350031	---
160	MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS	oct-15	dic-15	5.00	1.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350043	---
161	CALLE DE LA ROSA	oct-15	dic-15	4.50	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350012	---
162	SAN FRANCISCO SOLO - GUARDA DE GUADALUPE	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350027	---
163	TIMILPAN - EL PALMITO	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350073	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
164	BOMBARO - PASTORES - SAN PEDRO POTLA	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350074	---
165	STA. MARIA RAYON - SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, INCLUYE RAMAL	jul-15	dic-15	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350076	---
166	BARRIO EL PANTEON - SANTIAGO CASANDEJE	jul-15	dic-15	3.60	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350018	---
167	E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA	oct-15	dic-15	3.50	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350047	---
168	CAMINO LOS ARCOS-SAN FELIPE TEOTITLAN	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350001	---
169	CARRETERA ATOTONILCO - SAN JOSE DEL TUNAL. (SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO)	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350022	---
170	CIRCUITO CALPULALPAN	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350052	---
171	E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 11 - UNIVERSIDAD BICENTENARIO JILOTEPEC	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350059	---
172	SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350056	---
173	EL TESORO - CELAYITA	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350010	---
174	EL RANCHITO - LA NAVE	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350072	---
175	SAN JUAN LA ISLA - STA. MARIA JAJALPA	jul-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350069	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
176	CIRCUITO CONSTITUYENTES, TRAMO: MARIA GARIBAY – GUERRERO	oct-15	dic-15	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096350006	---
177	CALLE JOSE FRANCISCO GUERRA	feb-16	mar-16	4.49	0.04	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
178	AVENIDA BALMORAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+810	feb-16	mar-16	3.20	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
179	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+300	feb-16	mar-16	1.60	0.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
180	CALLE BENITO JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+280	feb-16	mar-16	1.50	0.28	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
181	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES	jul-15	mar-16	5.00	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350010	---
182	TEPETLIXPA-CHIMALACA E.C. MEX. 115	jul-15	mar-16	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350070	---
183	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	dic-15	mar-16	43.20	23.32	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350011	---
184	PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS SAN MARTIN-SAN MIGUEL Y BEJUCOS A PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA)	ago-15	mar-16	35.60	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350029	---
185	CONSTRUIR EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO EN UNA PRIMERA ETAPA EL CAMINO REAL DE TIERRA DE ADENTRO	feb-15	mar-16	23.46	3.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350034	---
186	CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS.	oct-15	mar-16	20.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350033	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
187	TENANCINGO - TENERIA - TECOMATLAN	jul-15	mar-16	8.00	1.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096350045	---
188	VALLE DE BRAVO- AMANALCO DE BECERRA- TURCIO- SAN AGUSTIN ALTAMIRANO	jul-15	mar-16	7.50	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096350025	---
189	CIRCUITO TABLON CHICO	jul-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350044	---
190	CALLE ARTURO MONTIEL	ago-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350066	---
191	TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL	jul-15	mar-16	5.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096350053	---
192	TABORDA E.C. AMOMLULCO - PRESA ALZATE (CONCRETO HIDRAULICO) DEL KM. 2+000 AL KM. 3+000	feb-16	mar-16	4.81	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
193	CAMINO SOLANOS-CAPULHUAC DEL KM. 0+000 AL 0+800	42416	mar-16	4.28	0.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
194	SANTA MARIA NATIVITAS - SAN LORENZO CUAUTENCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	mar-16	4.27	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
195	SAN MARTIN-PALMAR DE GUADALUPE-PACHUQUILLA-EL ZAPOTE-AGUA DULCE-LIM. MPAL. ZUMPAHUACAN	jul-15	mar-16	4.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096350005	---
196	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS-SANTA MARÍA DEL MONTE-PAPELERA)	oct-15	mar-16	4.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350013	---
197	CAMINO ALIMENTADOR TEPETLIXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENRO (AMECAMECA-CUAUTLA)	jul-15	mar-16	3.00	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096350025	---
198	LOMA LARGA - TEQUIXQUIAC - SANTA MARIA CUEVAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700	feb-16	mar-16	1.98	0.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
199	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750	mar-16	abr-16	9.46	1.35	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
200	5 DE FEBRERO AGRICOLA BELLAVISTA, DEL KM 0+000 AL 1+000	42430	abr-16	3.85	1	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
201	CALLE PUERTO MÉXICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200	mar-16	abr-16	0.77	0.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
202	CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440	feb-16	abr-16	6.70	1.44	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
203	LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+080	feb-16	abr-16	6.55	1.08	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
204	VIALIDADES CON UNA META DE 1.614 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ANTONIO BARBOSA (0.33 KM.) - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (0.58 KM.) - CALLE BENITO JUAREZ (0.70 KM.)	feb-16	abr-16	6.26	1.61	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
205	VIALIDADES CON UNA META DE 1.11 KM. EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO - CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.48 KM.) - PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS (0.34 KM.) - CALLE CATARINO GONZALEZ (0.29 KM.)	feb-16	abr-16	6.22	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	PE
206	CALLE HERMENEGILDO GALEANA HACIA JUAREZ CENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	feb-16	abr-16	5.86	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
207	E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO	42416	abr-16	4.12	1.1	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
208	CALLE MACARIO ROA A JABO OROZCO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450	feb-16	abr-16	2.09	0.45	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
209	CAMINO A COBAEM ENTRE CALLE ALCANFOR Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+390	feb-16	abr-16	1.81	0.39	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
210	CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+190	mar-16	abr-16	0.78	0.19	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
211	AV. ESTADO DE MÉXICO (2 CUERPOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-16	abr-16	7.55	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
212	PROLONGACION HERIBERTO ENRIQUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700	mar-16	abr-16	6.85	1.70	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
213	TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	feb-16	abr-16	4.87	0.90	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
214	SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 9+520 AL KM. 10+600	mar-16	abr-16	4.79	1.08	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
215	CALLE DE LOS SERRANOS, TRAMO CALZADA DEL PANTEON A AV. LERMA	feb-16	abr-16	4.30	0.81	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
216	CALLE FCO. I. MADERO TRAMO DE AV. BENITO JUAREZ A CALLE INDEPENDENCIA	feb-16	abr-16	4.08	0.77	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
217	HUAYATENCO - CARBAJAL DEL KM. 7+000 AL KM. 8+000	feb-16	abr-16	3.50	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
218	AV. PONIENTE 17 ENTRE AV. CHIMALPAIN Y AV. AXAYACATL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	3.23	0.33	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
219	AV. PONIENTE 3 ENTRE AV. AXAYACATL Y AV. CUITLAHUAC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+330	mar-16	abr-16	3.23	0.33	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
220	SAN LORENZO TLACOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+609	feb-16	abr-16	2.02	0.61	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
221	SAN SIMON DE GUERRERO - SAN ANDRES DE LOS GAMA	feb-16	abr-16	4.31	0.85	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
222	TECUANAPA-SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	42416	may-16	4.99	1.4	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
223	CARR. VIEJA (MÉXICO - TEOTIHUACAN) TRAMO SANTA CATARINA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	6.98	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
224	E.C. (ACAMBAY-TIMILPAN) - SAN JUANICO SECTOR II DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	4.30	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
225	CALLE BENITO JUAREZ (1.06 KM.) CALLE IGNACIO ALLENDE (0.24 KM.) CALLE JOSE MARIA MORELOS (0.26 KM.) AV. LIC. ABEL C. SALAZAR (0.80 KM.) CALLE FRANCISCO TERAN (0.24 KM.)	feb-16	may-16	13.05	2.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
226	CAMINO SAN BARTOLO - TIZAYUCA DEL KM. 1+800 AL KM. 3+000	feb-16	may-16	9.47	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
227	SAN PABLO TLALCHICHILPA - BARRIO SAN FRANCISCO TLALCHIC	42416	may-16	8.39	1.5	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
228	CANALEJAS - EL RINCON DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	8.23	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
229	E.C.(TOLUCA-CD. ALTAMIRANO)-OJO DE AGUA DEL KM. 0+AL KM. 0+870, STA. CRUZ CUAUHTENCO-ZINACANTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+180 Y E.C. TOLUCA-CD. ALTAMIRANO-OJO DE AGUA TRAMO: DEL KM. 0 AL 870	mar-16	may-16	7.00	1.25	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
230	CAMINO PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO AZTACAMECA DEL KM. 8+300 AL KM. 9+050 Y DEL KM. 10+050 AL KM. 10+700	feb-16	may-16	6.90	1.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
231	VIALIDAD PRIMARIA COL. ESMERALDA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	feb-16	may-16	6.61	1.20	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
232	TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	42416	may-16	5.51	1	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALI	15092100001	---
233	CAMINO RINCON DE AGUIRRE - RINCON DEL CARMEN	feb-16	may-16	5.47	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
234	LIBRAMIENTO PONIENTE (SAN JUAN DE LAS HUERTAS - SANTA MARIA DEL MONTE - PAPELERA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800	mar-16	may-16	5.11	2.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
235	E.C. (ATLACOMULCO - JILOTEPEC) - SAN LORENZO DE LOS METATES DEL KM 0+000 AL KM 1+100	feb-16	may-16	5.08	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
236	NEZAHUALCOYOTL ORIENTE - RINCONADA SANTA TERESA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+100	feb-16	may-16	4.24	1.10	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
237	CALLE NEZAHUALCOYOTL DE PASEO DE LOS NSURGENTES A ZA	42416	may-16	1.39	0.36	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	15092100001	---
238	CAMINO ZINACANTEPEC - SAN CRISTOBAL TECOLIT TRAMO DEL I	42445	may-16	1.09	0.386	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	15092100001	---
239	CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+270	42445	may-16	0.77	0.27	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	15092100001	---
240	CARRETERA DE ACCESO A LA CIENEGA. DEL TRAMO 0+520 AL 1+200.	feb-16	may-16	2.62	0.68	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
241	SAN JERONIMO DE LOS DOLORES - SAN ONOFRE DEL KM. 0+000	42416	may-16	10.66	1.8	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	15092100001	---
242	MAVORO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	feb-16	may-16	6.83	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
243	CANALEJAS - SAN LORENZO OCTEYUCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	feb-16	may-16	5.44	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
244	CANALEJAS-LA COMUNIDADDEL KM. 0+000 AL KM 0+600	42416	may-16	4.72	0.6	CONCLUIDAS 2013-	CAMINOS RURALES Y ALII	15092100001	---
245	VIALIDADES EN IXTAPALUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600	mar-16	may-16	10.36	2.60	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
246	IXTAPAN DE LA SAL - SAN ALEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500	feb-16	may-16	4.71	1.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
247	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CONCRETO HIDRAULICO) (12 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550	mar-16	may-16	7.40	0.55	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
248	SAN ALEJO - MESON NUEVO	mar-16	may-16	6.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
249	GUADALUPE CACHI - EJIDO SAN IGNACIO EL PEDREGAL DEL KM. 5+500 AL KM. 6+500	mar-16	may-16	4.24	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
250	CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ (CONCRETO HIDRAULICO) (14 M. Ancho) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+240	mar-16	may-16	3.28	0.24	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
251	PLAN DE GUADALUPE AV. JACARANDAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-16	may-16	2.76	5.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
252	CALLE DALIA - UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400	mar-16	may-16	2.21	0.40	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
253	SAN LUIS BORO - SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	feb-16	jun-16	13.46	2.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
254	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300	feb-16	jun-16	8.59	1.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
255	BOULEVAR EMILIO CHUAYFFET CHEMOR - PEDRO LUNA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 (2 CUERPOS) (CONCRETO HIDRAULICO)	feb-16	jun-16	7.48	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
256	CAMINO COL. HIDALGO - RINCON DE JAIMES	feb-16	jun-16	6.44	0.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
257	SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400 Y RAMAL AL CENTRO DE SAN FRANCISCO CHEJE - ENYAMI DEL KM. 0+000 AL KM. 0+150	feb-16	jun-16	2.99	0.30	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
258	MANTENIMIENTO A LAS 139 CALLES DEL COMPROMISO PRESIDENCIAL CG 207 EN 12 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL ESTADO	feb-16	jul-16	12.35	139 CALLES	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
259	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016	abr-16	jul-16	15.41	65.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100002	---
260	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	42416	nov-16	54.69	1163	CONCLUIDAS 2013-	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
261	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	42416	nov-16	51.92	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
262	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	42416	nov-16	4.50	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
263	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO SANTIAGO TIANGUISTENCO - CHALMA	jun-16	dic-16	48.41	9.64	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/50	---
264	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	42416	dic-16	509.52	144.85	CONCLUIDAS 2013-	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
265	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS	jun-16	dic-16	105.50	30.50	CONCLUIDAS 2013-2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
266	CONSERVACION DE CURVAS Y RECTIFICACION DE TRAMOS EN EL CAMINO LA PUERTA SULTEPEC	may-16	dic-16	33.19	7.00	CONCLUIDAS 2013-2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/51	---
267	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL SANTA LUCIA EN EL KM 40+400)	jul-16	ene-17	97.44	1.20	CONCLUIDAS 2017	AUTOPISTAS		---
268	DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA ALFREDO DEL MAZO - AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO (PRIMERA ETAPA).	ago-12	feb-17	798.10	1 DISTRIBUIDOR (5.98 KM.)	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096350036	PNI351
269	SALITRERÍA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+960	42810	abr-17	9.99	0.96	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		
270	CONSERVACIÓN PERIÓDICA RAMAL SALIDA NORTE DE TEXCOCO	42810	abr-17	20.40	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
271	E.C. (SALAZAR-CAÑADA DE ALFEREZ) - PIEDRA GRANDE, TRAMO	42810	abr-17	7.20	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
272	LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 0+000 AL P	42821	abr-17	5.00	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
273	CAMINO A SAN MIGUEL AMEYALCODEL KM 1+440 AL 1+728	42810	may-17	3.00	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
274	PASCUAL LUNA (E.K. 29.5 CARRETERA FEDERAL LOS REYES - LE	42810	may-17	4.51	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
275	CONSERVACION PERIODICA RAMAL PASO POR VENTA DE CARPI	42810	may-17	5.63	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
276	CONSERVACION PERIODICA DEL RAMAL COATLINCHAN. CARRETERA	42810	may-17	5.63	SEÑALAMIENTOS	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
277	VIADUCTO CONEXION INTERLOMAS - NUEVA AUTOPISTA NAUCALPAN TOLUCA	oct-12	may-17	1,775.20	0.80	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	12096350033	PE
278	CAMINO LA FABRICA-LOS BULBOS-EL ISLOTE DEL KM 0+000 0+700	42810	may-17	4.70	SEÑALAMIENTOS	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
279	SAN JUAN TEACALCO-SAN CRISTÓBAL COLHOACÁN DEL KM. 16+800 AL KM. 18+900	mar-17	jun-17	7.43	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
280	SAN ANTONIO NIXINI . PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-17	jun-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
281	SANTA MARIA CITENDEJE - CARRETERA ATLACOMULCO - EL ORO DEL KM. 1+550 AL KM. 2+300	mar-17	jun-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
282	SANTAMARIA ENDARE - E.C. CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ATLACOMULCO DEL KM. 1+850 AL KM. 3+000	mar-17	jun-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
283	CAMINO A MOLINO DE LAS FLORES Y LIBRAMIENTO. (INCLUYE REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COXCACUACO). DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-17	jun-17	10.50	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
284	EL TEPOZAN - SAN PEDRO DENXHI DEL KM. 2+300 AL KM. 5+000	mar-17	jun-17	6.80	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
285	EL GAVILAN - TOLTECA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	mar-17	jun-17	6.16	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
286	HUIZACHE - EL BANCO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	mar-17	jun-17	6.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
287	ENT. (JILOTEPEC - MARAVILLAS) - TECOLAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 Y DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	mar-17	jun-17	6.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
288	ACCESO PINCIPAL A CRISTOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jun-17	5.20	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
289	CARRETERA SAN MARCOS NEPANTLA - LA GARITA DEL KM. 0+700 AL KM. 1+850	mar-17	jun-17	4.47	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
290	SAN NICOLAS COATEPEC- XALATLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jun-17	3.48	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
291	LOMA LARGA (EJIDO SAN MATEO COAPEXCO) DEL KM. 1+000 AL KM. 1+500	mar-17	jun-17	2.30	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
292	E.C. (CHIAUTLA - TEZOYUCA) - HACIENDA LA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200	mar-17	jun-17	8.90	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
293	IXTAPAN - SAN ALEJO DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000	mar-17	jun-17	8.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
294	TONATICO - LA VEGA DEL KM. 0+900 AL KM. 2+900	mar-17	jun-17	8.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
295	SAN FELIPE COAMANGO - CAMINO CENTRO HACIA EL PANTEÓN (CONCRETO HIDRÁULICO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	mar-17	jun-17	7.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
296	ACCESO A LA COMUNIDAD DE BOSHESDA DEL KM. 0+060 AL KM. 1+800	mar-17	jun-17	7.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
297	LA PARADA SAN ISIDRO DEL BOSQUE - SANTA MARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	mar-17	jun-17	7.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
298	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ATIZAPAN – ATLACOMULCO	jul-14	jun-17	5,860.00	74.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS		PNI618
299	AMPLIACION DEL 2DO CUERPO DEL ARCO NORTE, TR. JILOTEPEC-ATLACOMULCO.	feb-14	jun-17	1,600.00	52.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS	1600	PNI498
300	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA TOLUCA-MORELIA DEL KM 8+000 AL KM 17+000 Y DEL KM. 24+000 AL KM 32+300 EN 17.3 KM	mar-17	jun-17	37.45	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
301	CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE 25.0 M. Y 35.0 M. DE LONGITUD RESPECTIVAMENTE CON 2.0 M. DE ANCHO TOTAL, MEDIANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA A BASE DE ZAPATAS DE CIMENTACION	mar-17	jun-17	19.00	2 PUENTES PEATONALES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110003	---
302	E.C. TOLUCA - TENANGO - CUATRO ZUREOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780	may-17	jun-17	6.29	0.78	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
303	CAMINO A OCAMPO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	may-17	jun-17	5.32	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
304	SAN JOSÉ DEGUEDO - SANTA CRUZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	may-17	jun-17	4.99	1.20	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
305	TEQUEXQUINAHUAC - SAN DIEGUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200	may-17	jun-17	4.79	1.20	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
306	E.C. (IXTLAHUACA - JILOTEPEC) - BUSIO - PALMITO - HUAPANGO DEL KM 4+800 AL 5+800	mar-17	jun-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
307	E.C. (ATLACOMULCO - EL ORO) LA SOLEDAD - VENTA DEL AIRE DEL KM. 1+300 AL KM. 1+800	mar-17	jun-17	3.50	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
308	LÁZARO CÁRDENAS - LLANITO CUATRO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+580	may-17	jun-17	2.87	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350026	---
309	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	mar-17	jun-17	2.68	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
310	JALAPA - URUAPAN - BARRIDO LA CAÑADA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+780	may-17	jun-17	2.59	0.78	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
311	CARRIL ZOQUIAPAN E.C.(MEXICO-PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	9.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
312	TECAMAC RANCHO AZUL DEL KM. 1+000 AL KM. 1+870	mar-17	jul-17	6.51	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
313	AZCAPOTZALCO - SAN ISIDRO, TRAMO: DEL KM. 0+130 AL KM. 0+730	may-17	jul-17	3.49	0.60	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
314	BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL A TEPETLAOXTOC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	mar-17	jul-17	8.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
315	SANTA ANA IXTLAHUACA - LA GUADALUPANA - PALOS AMARILLOS DEL KM. 8+720 AL KM. 9+520	mar-17	jul-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
316	2DA ETAPA LO REYES- EC. (AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO) DEL KM. 1+350 AL KM. 2+200	mar-17	jul-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
317	CIRCUITO EJIDAL XOLOX DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
318	RINCON DE UGARTE - CERRO DE CACALOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	mar-17	jul-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
319	CAMINO EMILIANO ZAPATA - E.C. (PARQUE NACIONAL) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	mar-17	jul-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
320	EL ALAMO - LOMA DEL PINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
321	EC (VILLA VICTORIA-EL ORO)-YONDESE DEL CEDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	mar-17	jul-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
322	CONSERVACIÓN CAMINO ALIMENTADOR REAL DEL BOSQUE MARISCALA, TRAMO VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO A LIMITES DE TULTITLAN DEL KM. 1+200 AL KM. 1+620	mar-17	jul-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
323	KM. 49.9 (LA PUERTA - SULTEPEC) - RASTROJO LARGO - HUAYATENCO DEL KM. 8+000 AL KM. 8+900	mar-17	jul-17	3.50	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
324	VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 0+850	mar-17	jul-17	3.50	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
325	CARR. COL. EMILIANO ZAPATA - SAN MARCOS NEPANTLA DEL KM. 4+000 AL KM. 4+500	mar-17	jul-17	2.24	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---
326	AMPLIACION AUTOPISTA TENANGO-IXTAPAN DE LA SAL, TRAMO VILLA GUERRERO-IXTAPAN DE LA SAL	may-15	jul-17	1,500.00	20.00	PROCESO 2017	AUTOPISTAS	0.0	PNI432
327	TONATICO - LOS AMATES, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700	may-17	jul-17	5.95	1.70	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
328	SAN JUAN COAJOMULCO - SANTIAGO CASANDEJE - EL CRUCERO, DEL KM. 3+000 AL KM. 4+120	may-17	jul-17	4.99	1.12	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
329	PARAJE TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	may-17	jul-17	4.99	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
330	LA CRUZ DEL ARENAL - MOLINITOS DEL KM 0+000 AL KM 1+160	may-17	jul-17	4.64	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16096350001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
331	MAGUEYCITOS - E.C.E. NO. 13 - PARAJE LOS PINOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	may-17	jul-17	3.98	0.90	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
332	E.C. (HUAPANGO - EL PALMITO) - LA HUARACHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900	may-17	jul-17	3.98	0.80	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
333	DEDENI DOLORES - SAN LORENZO NENAMICOYAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+800	may-17	jul-17	3.96	0.80	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
334	SANTA MARÍA NATIVITAS-SAN LORENZO CUAUHTENCO, DEL KM. 1+000 AL KM. 2+000	may-17	jul-17	3.49	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
335	EL CARMEN - SAN PEDRO BUENOS AIRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	may-17	jul-17	3.49	1.40	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
336	PARQUE ECOTURÍSTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+860	may-17	jul-17	3.35	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	13096350067	---
337	BEJUCOS - PALMAR CHICO (PRIMERA ETAPA), DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400	may-17	jul-17	1.56	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350029	---
338	SAN ISIDRO - E.C. CAMINO VIEJO A SAN SEBASTIAN, TRAMO: DEL KM. 0+200 AL KM. 0+982	may-17	ago-17	6.49	0.78	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
339	SANTA CRUZ AYOTUSCO - SAN JUAN HUILOTEAPAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+779	may-17	ago-17	3.70	1.77	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
340	BARRIO DE GUADALUPE - SAN LUCAS TUNCO, DEL KM. 0+376 AL KM. 1+436	may-17	ago-17	2.20	1.06	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
341	SAN LORENZO TLACOTEPEC-MANTO DEL RIO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+540 Y CHOSTO DE LOS JARROS - (BOBASHI DE GUADALUPE - SAN BARTOLO LANZADOS), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100	may-17	ago-17	9.98	4.64	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
342	MOTOR - PILARES - EL AZAFRAN, DEL KM. 8+500 AL KM. 10+700 Y E.K. 6.3 (ACAMBAY - TEMASCALSINGO) -TIXMADEJE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300	may-17	ago-17	9.91	2.20	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
343	E.C. (SANTA ANA NICHÍ - SAN MIGUEL LA LABOR - SAN NICOLÁS GUADALUPE) - TRES ESTRELLAS, DEL KM. 0+130 AL KM. 1+130	may-17	sep-17	4.60	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
344	METEPEC - ZACANGO - SAN MARCOS DE LA CRUZ DEL KM. 7+400 AL KM. 8+400	may-17	sep-17	4.24	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
345	SAN GASPAR TLAHUELILPAN - CHAPULTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 1 +000	may-17	sep-17	4.24	1.00	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
346	E.C. (TOLUCA - TENANGO - SAN LUCAS TEPEMAJALCO) - CAMINO VIEJO A CALIMAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+445	may-17	sep-17	3.99	0.44	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		
347	INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	oct-17	2.68	SENALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
348	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA TOLUCA-MORELIA	mar-17	oct-17	2.40	SENALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
349	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	oct-17	1.94	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
350	INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO	mar-17	oct-17	1.55	SENALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
351	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	mar-17	oct-17	1.47	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
352	INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA	mar-17	oct-17	1.28	SENALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
353	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA MÉXICO-PUEBLA	mar-17	oct-17	1.28	SEÑALAMIENTO	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
354	INTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA Y PINTURA TERMOPLASTICA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA	mar-17	oct-17	1.20	SENALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
355	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	mar-17	oct-17	1.00	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
356	PINTADO DE RAYAS CENTRALES, LATERALES Y GUIONES CON BASE AGUA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	mar-17	oct-17	0.93	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
357	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO	feb-17	oct-17	2.08	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
358	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	feb-17	oct-17	1.99	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
359	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO	mar-17	oct-17	1.57	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
360	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	feb-17	oct-17	1.42	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
361	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-MORELIA	feb-17	oct-17	1.12	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
362	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TOLUCA-TAXCO	feb-17	oct-17	0.73	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
363	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA	feb-17	oct-17	0.41	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
364	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO	feb-17	oct-17	0.37	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
365	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PUEBLA	feb-17	oct-17	0.25	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
366	COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	feb-17	oct-17	0.23	BARRERA DE PROTECCIÓN	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
367	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC	feb-17	oct-17	0.22	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
368	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	feb-17	oct-17	0.17	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
369	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	feb-17	oct-17	0.16	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
370	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-PACHUCA	feb-17	oct-17	0.12	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
371	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CARRETERA MÉXICO-QUERETÁO	feb-17	oct-17	0.07	SEÑALAMIENTO VERTICAL	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
372	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA MÉXICO-TOLUCA EN 80.65 KM	mar-17	nov-17	13.00	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
373	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, LIBRAMIENTO TEJUPILCO, RAMALES TEMASCALTEPEC, ACAMUCHITLAN Y BEJUCOS EN 161.65 KM	mar-17	nov-17	5.50	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
374	CONSERVACION RUTINARIA EN 102.91KM EN LA CARRETERA TOLUCA - PALMILLAS	mar-17	nov-17	4.59	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
375	CONSERVACION RUTINARIA NAUCALPAN - TOLUCA EN 96 KM	mar-17	nov-17	4.41	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
376	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC EN 116.95 KM	mar-17	nov-17	4.40	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
377	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-CUAUTLA EN 111.58 KM	mar-17	nov-17	4.20	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
378	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC EN 95.9 KM	mar-17	nov-17	3.07	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
379	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERAS TOLUCA-MORELIA, RAMAL VALLE DE BRAVO EN 98.5 KM	mar-17	nov-17	2.32	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
380	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS CARRETERA TOLUCA-TAXCO EN 82.1 KM	mar-17	nov-17	1.93	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
381	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA MEXICO-PACHUCA EN 35 KM	mar-17	nov-17	1.71	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
382	MANTENIMIENTO DE 6 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	mar-17	nov-17	1.36	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
383	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS, CARRETERA MEXICO-PUEBLA EN 30.95 KM	mar-17	nov-17	1.20	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
384	CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA ENTRONQUE JOROBAS TULA EN 11.8 KM	mar-17	nov-17	0.48	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
385	MANTENIMIENTOS DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC	mar-17	nov-17	0.21	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
386	MANTENIMIENTO DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA TOLUCA-PALMILLAS	mar-17	nov-17	0.19	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
387	MANTENIMIENTOS DE 5 TABLEROS PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC	mar-17	nov-17	0.10	---	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110007	---
388	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-QUERETARO	abr-17	dic-17	0.88	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
389	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, CARRETERA TEXCOCO-ECATEPEC	abr-17	dic-17	0.82	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
390	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-ZACATEPEC	abr-17	dic-17	0.77	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
391	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA VENTA DE CARPIO-TULANCINGO	abr-17	dic-17	0.63	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
392	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-TOLUCA	abr-17	dic-17	0.51	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
393	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-CUAUTLA	abr-17	dic-17	0.43	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
394	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA NAUCALPAN-TOLUCA	abr-17	dic-17	0.36	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
395	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
396	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA MÉXICO-PACHUCA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
397	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-MORELIA	abr-17	dic-17	0.20	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
398	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA TOLUCA-TAXCO	abr-17	dic-17	0.09	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
399	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES DURANTE 2017, EN LAS ZONAS DE TOLUCA Y TEXCOCO, CON UNA META DE 419 PUENTES, EN EL ESTADO DE MÉXICO CARRETERA JOROBAS-TULA	abr-17	dic-17	0.05	PUENTES	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	16092110001	---
400	CG-263 CONSTRUIR EL TREN INTERURBANO MEXICO - TOLUCA. PRIMERA ETAPA	jul-14	dic-17	44,067.00	577.00	PROCESO 2017	FERROVIARIO	13093110008	PNI710
401	CG-176 SEGUNDO CUERPO AUTOPISTA ARCO NORTE, TRAMO JILOTEPEC-ATLACOMULCO	jul-15	dic-17	746.60	41.74 KM.	PROCESO 2017	CARRETERAS FEDERALES	14096350032	PNI353
402	AUTOPISTA TEXCOCO-ECATEPEC (PIRAMIDES)	feb-15	ene-18	1,700.00	17.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PE
403	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA TOLUCA -ATLACOMULCO (INCLUYE LIBRAMIENTO DE ATLACOMULCO)	ene-16	ago-18	5,500.00	70.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI576PNI502
404	AVENIDA NOPALTEPEC VIADUCTO PONIENTE BICENTENARIO	abr-13	dic-18	356.68	5.80	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096350045	---
405	CG-175 MODERNIZAR LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC. PRIMERA ETAPA	feb-14	dic-19	1,371.13	63.34	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096410031	PNI461
406	CG-079 CONSTRUIR E INICIAR OPERACION DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN OCTUBRE DE 2020 (PRIMERA ETAPA)	may-15	oct-20	146,162.20	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	1409JZL0005	PNI446
407	CONSERVACION PERIODICA CARRETERA JOROBAS-TULA DEL KM 0+000 AL KM 5+900	jun-17	ago-17	21.93	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	16092110006	---
408	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PUERTA – SULTEPEC – SAN MIGUEL TOTOLMALOYA.	jun-17	oct-17	15.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	47851	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
409	CAMINO COYOTEPEC-LAS ANIMAS-PUENTE GRANDE	jun-17	oct-17	11.19	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096350027	---
410	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHEJE - TIACAQUE, EN UNA LONGITUD DE 3.3 KILOMETROS	jun-17	oct-17	10.68	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	46098	---
411	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JOCOTITLAN - LA PROVIDENCIA, EN UNA LONGITUD DE 3.95 KILOMETROS	jun-17	oct-17	10.68	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	46121	---
412	CARRETERA LAS LUMBRERAS	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	10096350023	---
413	CARRETERA TECUAUTITLAN(SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096350033	---
414	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA MESA DE BOMBARÓ-LOS PASTORES-SAN PEDRO POTLA CENTRO-MANTO DEL RIO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+691 AL KM 10+771.	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096350074	---
415	CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN JOSÉ IXTAPA – IXTAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+580).	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51762	---
416	CAMINO: E.C. (AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EN EL TRAMO JUANACATLÁN – LLANO DE LAS CARRERAS DEL KM 0+000 AL KM 7+460, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO)	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51763	---
417	CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO SOLÍS DEL KM 0+000 AL KM 2+100).	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51759	---
418	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PUEBLA (DEL PUENTE EL BATÁN A CAMINO AL MOLINO DE FLORES), QUE ABARCA TRES COMUNIDADES: LA RESURRECCIÓN-SANTA CRUZ DE ARRIBA-XOCOTLAN.	jun-17	oct-17	10.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
419	CAMINO: E.C. (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE SAN ANTONIO SOLÍS – SAN JOSÉ LOS REYES – SAN MIGUEL SOLÍS DEL KM 0+000 AL KM 1+900).	jun-17	oct-17	9.64	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51760	---
420	PUENTE VEHICULAR AMOMOLULCO	jun-17	oct-17	8.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
421	MODERNIZACION DE AV. WENCESLAO LABRA, TRAMO: DEL CAMINO A LA NORIA A AV. ACUEDUCTO	jun-17	oct-17	8.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51392	---
422	E.C.(APAXCO- TEQUIQUIAC)- LOMA BONITA	jun-17	oct-17	7.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096350045	---
423	MODERNIZACIÓN EN UNA LONGITUD DE 3.0 KM., EN EL PASO EXISTENTE A 7.0 METROS DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U EN LA CARRETERA PUEBLO NUEVO-EL RODEO	jun-17	oct-17	6.40	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096350008	---
424	DHALLE (EJIDO DE DONGU) - DANXHO	jun-17	oct-17	6.37	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51602	---
425	E.C. (CHAPA DE MOTA - VILLA DEL CARBÓN) - SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS.	jun-17	oct-17	6.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	48296	---
426	MODERNIZACIÓN DE 1.40 KM, EN EL PASO EXISTENTE A 7.0 MTS. DE ANCHO DE CALZADA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U, EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SOLÍS	jun-17	oct-17	6.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096350004	---
427	PAVIMENTACIÓN CARRIL DE LA MANGA, SANTA MARIA ATARASQUILLO.	jun-17	oct-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
428	PAVIMENTACION CAMINO LA CONCEPCIÓN - LLANO DE LOS NEGROS	jun-17	oct-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096350002	---
429	PAVIMENTACIÓN DE 1050 ML CON CARPETA ASFÁLTICA DE RINCÓN DE JAIMES A COLORINES. EN EL MUNICIPIO DE TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO	jun-17	oct-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
430	S MODERNIZACION DE 0.55 KILÓMETROS, EL PASO EXISTENTE A 7.0 METROS DE ANCHO DE CALZADA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. DE ANCHO C/U EN LA CARRETERA CERRITOS DE CÁRDENAS-CALDERAS	jun-17	oct-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096350005	---
431	CAMINO: E.C.(MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE SAN MIGUEL SOLIS-EL GARAY-MESA DEL VENADO-POZO DE LAS PALOMAS-EL RODEO DEL KM 0+000 AL KM 7+400).	jun-17	oct-17	5.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51761	---
432	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA RELLENOS SANITARIO 1RA ETAPA, TRAMO: HACIENDA SAN ANDRÉS - RELLENO SANITARIO	jun-17	oct-17	4.93	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	50569	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
433	PAVIMENTACION DE PAHUACAN - ZOTATZINGO, TRAMO: TELEECUNDARIA - PUENTE PISTA, UBICADO PAHUACAN	jun-17	oct-17	4.72	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	50587	---
434	MODERNIZACION DE CAMINO A BOCANEGRA, TRAMO: DE VIADUCTO BICENTENARIO A BOCANEGRA	jun-17	oct-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51373	---
435	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS FLORES, TRAMO: ENTRE VILLAS 2000 Y ACUEDUCTO	jun-17	oct-17	4.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51388	---
436	DESVIACIÓN A SANTA ROSA DE LIMA - TULTENANGO	jun-17	oct-17	3.50	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096350028	---
437	MODERNIZACION CAMINO SAN SEBASTIAN, TRAMO: DE CAMINO LOS PULQUEROS A CALLE GUADALUPE VICTORIA)	jun-17	oct-17	3.00	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	51381	---
438	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	jun-17	oct-17	2.11	SEÑALAMIENTOS	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
439	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA SAN ANDRES KM 15	jun-17	dic-17	136.02	0.80	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		---
440	CG-178 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	jun-17	dic-17	1,200.00	7.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	44554	PNI315
441	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA (ENTRONQUE A DESNIVEL OJO DE AGUA EN EL KM 32+200)	jun-17	dic-17	89.43	1.20	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		---
442	DISTRIBUIDOR VIAL DEL AEROPUERTO Y TOLLOCAN (RAMA 50,60)	jun-17	dic-17	83.00	DISTRIBUIDOR VIAL	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
443	DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO - CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO	jul-17	dic-17	80.00	DISTRIBUIDOR VIAL	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		---
444	CG-174 APOYAR LA MODERNIZACION DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ATLACOMULCO	jun-17	ene-18	150.00	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO		PNI093



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD JUNIO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
445	TENANGO - MALINALCO - ALPUYECA	ago-17	ene-18	3,294.00	73.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI573
446	CG-133 ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO	ago-17	ago-18	11,599.88	13.00	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO	14093110010	PNI667
