



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
CAMPECHE**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

FEBRERO 2017


SCT CAMPECHE 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017


Infraestructura de Comunicaciones y transportes

- 1 AUTOPISTAS**
- 13 CARRETERAS**
- 25 CAMINOS RURALES**
- 0 FERROVIARIO**
- 3 PUERTOS**
- 1 AEROPUERTOS**

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

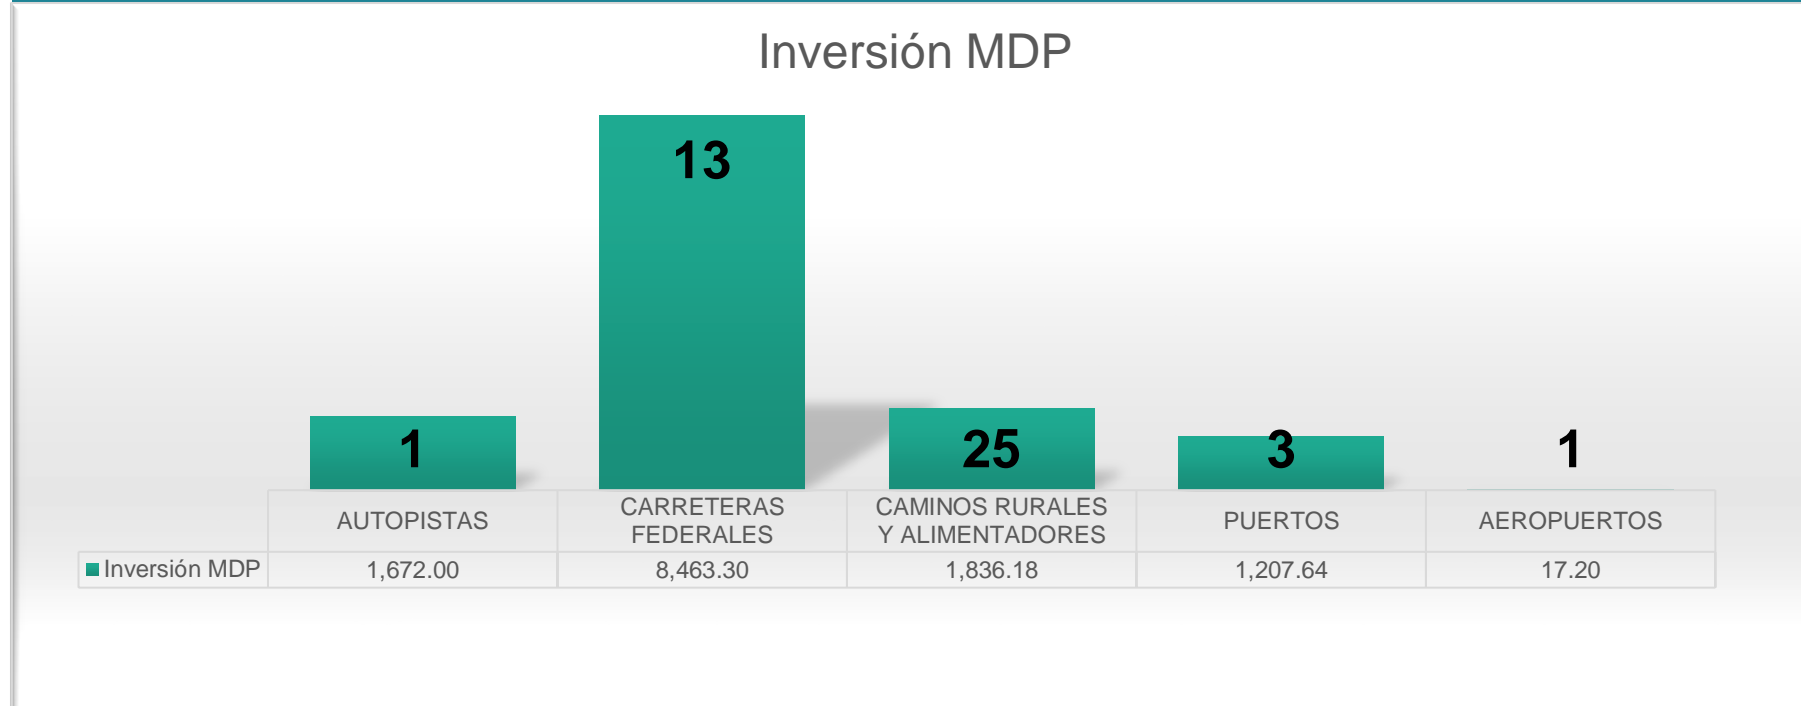

Estatus de las obras

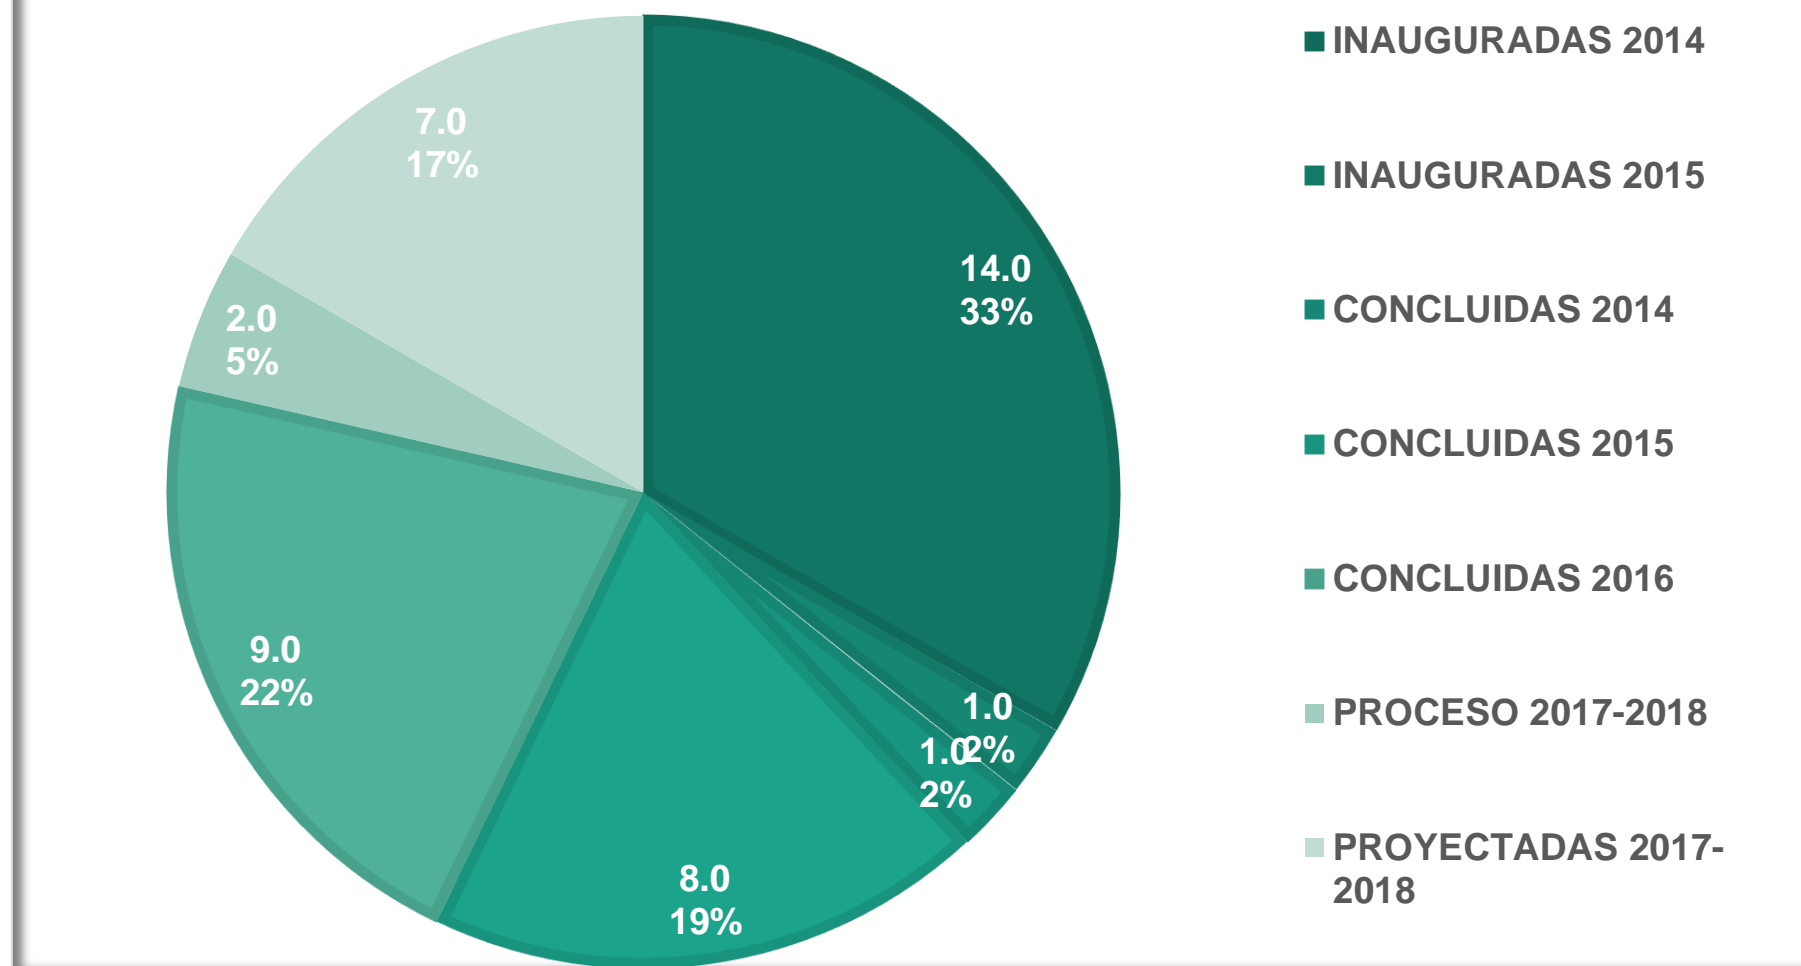

Obras **MDP** **Km**

A la fecha, la SCT invierte **43** **13,196.3** **4,063.0**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	1672	12	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	1672	12	0
CARRETERAS FEDERALES	13	8463.3	1404.4	1
INAUGURADAS 2014	3	752.9	5.4	0
INAUGURADAS 2015	1	1650	26.3	1
CONCLUIDAS 2015	1	90.6	0	0
CONCLUIDAS 2016	2	412.3	1313.5	0
PROCESO 2017-2018	1	500	16.5	0
PROYECTADAS 2017-2018	4	2057.5	28	0
PROYECTADAS 2017-2019	1	3000	14.7	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	25	1836.18	2646.51	0
INAUGURADAS 2014	11	111.39	144.06	0
CONCLUIDAS 2015	6	588.79	950.25	0
CONCLUIDAS 2016	6	657.6	809.2	0
PROYECTADAS 2017-2018	2	478.4	743	0
PUERTOS	3	1207.64	0.116	2
CONCLUIDAS 2014	1	18.79	0	0
CONCLUIDAS 2016	1	192.41	0	1
PROCESO 2017-2018	1	996.44	0.116	1
AEROPUERTOS	1	17.2	0	0
CONCLUIDAS 2015	1	17.2	0	0
Total general	43	13196.32	4063.026	3

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	78,905.0	78,905.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	78,905.0	78,905.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	44,146.0	44,146.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS ENTREGADOS	---	7.0	7.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS	---	10.0	10.0



MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	612	1,600	2,212
INMUEBLES ESCOLARES	442	---	---
CENTROS DE SALUD	90	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	56	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	14	---	---
ESPACIOS PÚBLICOS	7	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3	---	---

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	32.41	33.14	40.60	106.15
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	11	11	11	11
JORNALES	363,535	345,622	400,505	1,109,662
BENEFICIARIOS	6,511	5,793	7,068	19,372
LONGITUD	823.71	772.00	---	1,595.71
CAMINOS	---	---	201	---

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: 6.4.418.003 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/074/2017 enviado por la DGAPDCST.

Programas



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFERICO DE CAMPECHE	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES ESCENICA, KALA Y EL REY, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA, TERRACERIAS	01/08/2012	01/12/2013	393.40	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	10096240004; 12096240001	---
2	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES, CARRETERA CAMPECHE - MERIDA	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES (PSV), POMUCH I, TENABO II Y BACABCHEN, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2013	01/12/2013	254.00	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	08096240011	---
3	AV HEROE DE NACUZARI (RAMAL AEROPUERTO DE CAMPECHE)	MODERNIZACION DE DOS TRAMOS, CON LONGITUD DE 3.0 KM Y 2.36 KM RESPECTIVAMENTE, CON BASE HIDRAULICA DE 15 CM, CARPETA DE CONCRETO DE 7 Y 12 CM	01/07/2013	01/03/2014	105.50	INAUGURADA 31-OCT-14	5.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003 10096240004	---
4	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)- DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL.	01/04/2013	01/10/2013	15.98	INAUGURADA 31-OCT-14	5.42	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	---
5	CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM	CONSERVACION DEL CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM (TRAMOS AISLADOS).	01/04/2013	01/10/2013	14.32	INAUGURADA 31-OCT-14	22.70	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
6	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600.	01/04/2013	01/10/2013	11.87	INAUGURADA 31-OCT-14	16.60	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
7	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580.	01/04/2013	01/11/2013	11.44	INAUGURADA 31-OCT-14	9.58	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
8	ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	CONSERVACION DEL CAMINO ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	01/04/2013	01/11/2013	11.16	INAUGURADA 31-OCT-14	20.76	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
9	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	01/05/2013	01/10/2013	10.91	INAUGURADA 31-OCT-14	12.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
10	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNION - LA PAZ.	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNION - LA PAZ.	01/05/2013	01/10/2013	10.40	INAUGURADA 31-OCT-14	14.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
11	E.C- CHAMP. - CAMP. - EL ZAPOTE) - SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.)	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(CHAMP. - CAMP. - EL ZAPOTE) - SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.).	01/07/2013	01/11/2013	8.43	INAUGURADA 31-OCT-14	22.10	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
12	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	01/05/2013	01/10/2013	8.17	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
13	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES	CONSERVACION DEL CAMINO E.C.(MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES.	01/05/2013	01/10/2013	5.38	INAUGURADA 31-OCT-14	5.90	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
14	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.)	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.).	01/07/2013	01/11/2013	3.33	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	---
15	CG-062 AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUERPOS NUEVOS, APROVECHANDO EL EXISTENTE, PARA UNA CARRETERA TIPO A4S, CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN 26.3 KMS., ASI COMO LA CONST. DE 7 DISTRIBUIDORES VIALES.	01/12/2012	25/09/2015	1,650.00	INAUGURADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015. ESTA OBRA SE FUSIONO CON EL ID OB_SCT_01206, PARA CONVERTIRSE EN EL CG-062, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGPG/STG/108/2016 DE FECHA 4/III/2016	26.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096240001	PNI479
16	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/02/2015	30/12/2015	378.79	LA CONSERVACION SE APLICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	902.15	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
17	CAMPECHE - MERIDA, DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE Y SUS ACCESOS, UBICADO EN EL KM. 76+650 DEL TRAMO CAMPECHE-LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE-MERIDA	01/03/2013	31/12/2015	90.60	N/A	1 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096240001	PNI340

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
18	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: X-CANHA – DZILBACHEN)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: X-CANHA – DZILBACHEN), TRAMO DEL KM 111+000 AL KM 94+000	01/08/2015	30/12/2015	60.00	N/A	17.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240005	---
19	SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO – E.C (NUEVA COAHUILA – EL DESENGAÑO)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO – E.C (NUEVA COAHUILA – EL DESENGAÑO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	01/06/2015	31/12/2015	60.00	N/A	12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	---
20	NUEVO COAHUILA – EL DESENGAÑO	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO NUEVO COAHUILA – EL DESENGAÑO, TRAMO DEL KM 10+500 AL KM 20+000	01/06/2015	30/12/2015	50.00	N/A	9.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	---
21	E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA	MODERNIZACION A 7.50 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO DEL KM 8+000 AL KM 13+600	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	5.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	---
22	CERRO LAS AGUILAS – EL DESENGAÑO	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CERRO LAS AGUILAS – EL DESENGAÑO, TRAMO DEL KM 20+000 AL KM 24+000	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096240001	---
23	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 500 MIL LITROS EN CD DEL CARMEN	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 500 MIL LITROS	01/04/2014	30/11/2015	17.20	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO	1 TANQUE	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
24	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 756.7 KMS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 756.7 KMS. DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, DISTRIBUIDOS EN 47 CAMINOS DE 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	15/02/2016	30/11/2016	419.60	EL PROGRAMA SE LLEVA A CABO EN 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	756.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
25	Programa de Conservación de Carreteras Federales 2016	SE TIENEN PROGRAMADAS 30 OBRAS PARA UNA META DE 1,313.5 KMS, REALIZANDO TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 1 PUENTE, CONSERVACION PERIODICA DE 51 KMS, CONSERVACIÓN RUTINARIA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERT	05/02/2016	30/12/2016	327.30	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE CANDELARIA II, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS EN 51 KMS, REHABILITACION DE 1 OBRA DE DRENAJE, ATENCION DE 1 PUNTO DE CONFLICTO, 12 OBRAS DE CONSERV.RUT.	1,313.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	---
26	CG-066 MODERNIZAR EL PUERTO DE SEYBAPLAYA	CONSTRUCCION DE MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	01/04/2013	31/12/2016	192.41	SE DIFIERE EL TERMINO DE LA OBRA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LO COMUNICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS	MUELLE	CONCLUIDAS 2016	PUERTOS	11095100001	PNI177
27	DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKAN	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKÁN Y SUS ACCESOS, DEL TRAMO CAMPECHE-LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA	01/03/2016	27/12/2016	85.00	EL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III, ORIGINALMENTE REGISTRADO EN ESTA ID, FUE REGISTRADO COMO OBRA INDIVIDUAL CON EL ID OB_SCT_02477. SE MODIFICA FECHA CONCLUSION DE OBRA POR	2 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PNI340
28	XPUJIL-DZIBALCHE, TR. XCANHA-DZIBALCHEN 78 AL 94	AMPLIACION DEL CUERPO EXISTENTE A 7.50 M. DE ANCHO DE CORONA PARA 2 CARRILES DE CIRCULACION DE 3.50 CADA UNO, ENTRE LOS KMS. 78+000 AL 94+000	15/04/2016	14/11/2016	70.00	N/A	16.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240005	---
29	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: XPUJIL – X-CANHA)	MODERNIZACION A 9.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: XPUJIL – X-CANHA), TRAMO DEL KM 27+500 AL KM 40+000	15/04/2016	14/11/2016	60.00	N/A	12.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240003	---
30	NVO COAHUILA-CERRO LAS AGUILAS	AMPLIACIÓN DEL CAMINO EXISTENTE A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA, ENTRE LOS KMS. 24+000 AL 32+000 DE LA CARRETERA NUEVO COAHUILA-EL DESENGAÑO	15/04/2016	14/11/2016	40.00	N/A	8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	---
31	SN MANUEL NVO CANUTILLO-EC(NVO COAHUILA-DESENGAÑO)	AMPLIACION DEL CAMINO EXISTENTE A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA, ENTRE LOS KMS.12+000 AL 20+000 DEL CAMINO RURAL SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO - E.C.(NVO COAHUILA-EL DESENGAÑO)	15/04/2016	14/11/2016	40.00	N/A	8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	---
32	DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, 0 AL 8	AMPLIACION DEL CUERPO EXISTENTE A 7.50 M. DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M CADA UNO ENTRE LOS KMS. 0+000 AL 8+000 DEL TRAMO E.C.(VHSA.-ESC.)-DIVISIÓN DEL NTE.-CANDELA	15/04/2016	14/11/2016	28.00	N/A	8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	---
33	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO EN BOCA CHICA, CAMPECHE.	DRAGADO EN EL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO DE UN ANCHO DE 42 METROS Y UNA LONGITUD DE 3900 M CON UN VOLUMEN DE 220000 M3 A 280 M DE PROFUNDIDAD REFERIDA AL NBM	01/04/2014	01/10/2014	18.79	N/A	DRAGADO	CONCLUIDAS 2014	PUERTOS		---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
34	CG-063 MODERNIZAR EL PUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN.	CONSTRUCCIÓN DE 826 M DE MUELLE DE CONCRETO (INCLUYE BITAS, DEFENSAS Y SEÑALAMIENTO); Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN NORTE Y SUR.	28/11/2013	31/10/2017	996.44	"SE REQUIEREN 228.21 MDP PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN OCTUBRE 2017."	0.12	PROCESO 2017-2018	PUERTOS	12095100003	PNI429
35	CHAMPOTON - VILLA MADERO	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA EXISTENTE A UNA TIPO A4S, CON ANCHO DE CORONA VARIABLE, PARA ALOJAR 4 CARRILES DE CIRCULACIÓN DE 3.5 M. C/U	01/03/2016	01/12/2018	500.00	PARA EL EJERCICIO 2017, SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 20.26 KMS., C.I. Y C.D., AUTOPISTA CHAMPOTON-CAMPECHE, TRAMO CHAMPOTON-VILLAMADERO (TRAMO LIBRE) ENTRE LOS KMS. 144 AL 160.25 SE CANCELÓ ESTA OBRA COMO COMPROMISO DE GOBIERNO CG-062, SEGÚN OFICIO CGPG/STG/108/2016. EL NUEVO COMPROMISO CG-062 ES LA OBRA CON EL ID OC SCT 00258	16.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
36	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CIUDAD DEL CARMEN PARA MEJORAR LAS VIALIDADES	CONSTRUCCIÓN DE UN LIBRAMIENTO DE 6.5 KM DE LONGITUD DE 12 METROS DE ANCHO PARA ALOJAR UN CARRIL DE CIRCULACIÓN POR SENTIDO.	01/02/2018	30/11/2018	1,672.00		12.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	No. Solicitud 48002	PNI575
37	LIBRAMIENTO DE CHAMPOTON	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 18.0 KILOMETROS	02/01/2018	01/12/2018	820.00	N/A	18.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	43053	PE
38	PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED FEDERAL 2017	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS FEDERALES,CON TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA, PERIÓDICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, RECONSTRUCCIÓN Y ATENCIÓN A PUNTO DE CONFLICTO	15/02/2017	31/12/2017	702.50	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE 1,376 KMS Y 161 PTES., CONSERV. PERIÓDICA DE 399.5 KMS., RECONSTRUCCIÓN DE 7 KMS. Y 16 PTES., ATENCIÓN DE 2 PUNTOS DE CONFLICTO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.	*	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
39	LIBRAMIENTO DE ESCARCEGA	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 10.0 KILOMETROS	02/01/2018	31/12/2018	450.00	N/A	10.00	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	43851	PE
40	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2017	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 731.0 KMS. DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, DISTRIBUIDOS EN 57 CAMINOS DE 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	16/02/2017	31/12/2017	428.40	N/A	731.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
41	DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III Y SUS ACCESOS, DEL TRAMO CAMPECHE-LIM.EDO.CAM./YUC., DE LA CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA	01/03/2017	31/12/2017	85.00	ESTA OBRA FORMABA PARTE DEL ID OB_SCT_01589	1 DIST VIAL	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PE
42	LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE	MODERNIZACION A 10.00 M DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	02/01/2018	31/12/2018	50.00	EL REGISTRO DE CARTERA DE INVERSION ESTA EN TRAMITE. LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2015, FUERON RETIRADOS POR LA SHCP	12.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	41735	---
43	LIBRAMIENTO DE ATASTA	CONSTRUCCION A DOS CARRILES DE CIRCULACION CON ACOTAMIENTOS LATERALES EN 14.7 KILOMETROS	02/01/2018	01/12/2019	3,000.00	N/A	14.70	PROYECTADAS 2017-2019	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
