



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
HIDALGO**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

SCT HIDALGO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



12 CARRETERAS



101 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS




0 AEROPUERTO



Programas




ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

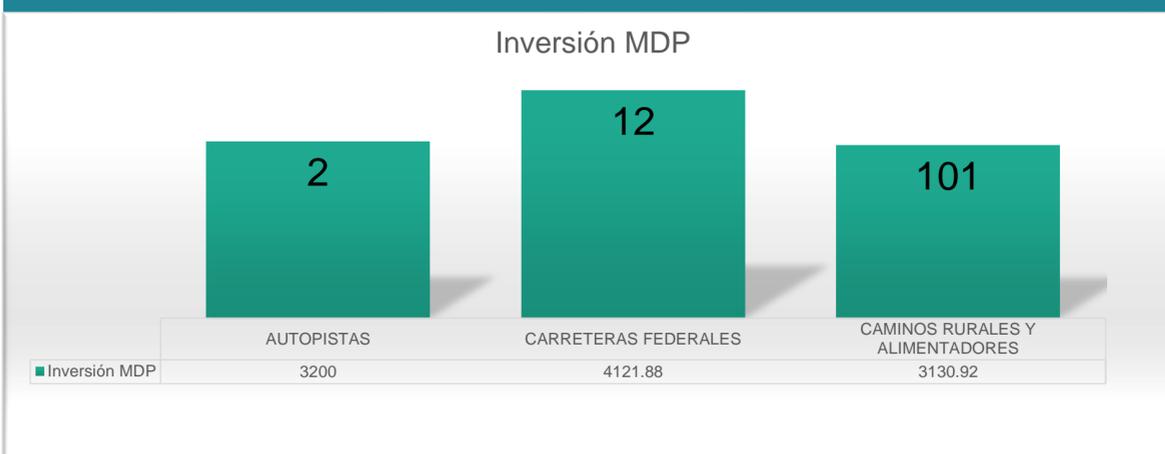

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

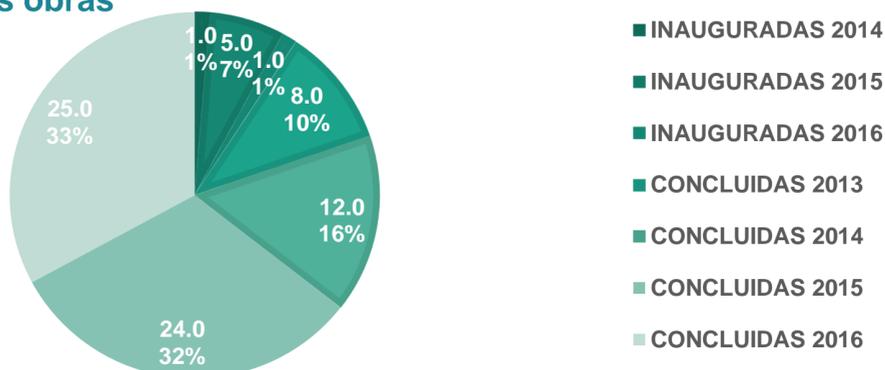

A la fecha, la SCT invierte **Obras 115**, **MDP 10,452.8**, **Km 2,754.8**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	3,200.00	32.60	1
PROYECTADAS 2017-2018	2	3,200.00	32.60	1
CARRETERAS FEDERALES	12	4,121.88	2,142.22	1
INAUGURADAS 2015	4	519.73	2.50	0
CONCLUIDAS 2013	1	64.30	-	0
CONCLUIDAS 2017	1	315.97	1,014.16	0
PROCESO 2017-2018	3	2,590.03	100.30	1
PROYECTADAS 2017-2018	3	631.85	1,025.26	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	101	3,130.92	579.97	0
INAUGURADAS 2014	1	58.60	2.00	0
INAUGURADAS 2015	1	7.37	0.90	0
INAUGURADAS 2016	1	260.40	6.00	0
CONCLUIDAS 2013	7	86.39	21.82	0
CONCLUIDAS 2014	12	198.31	48.43	0
CONCLUIDAS 2015	24	170.66	40.15	0
CONCLUIDAS 2016	25	417.20	67.11	0
CONCLUIDAS 2017	7	292.32	93.59	0
PROCESO 2017-2018	17	1,336.55	175.57	0
PROYECTADAS 2017-2018	6	303.12	124.40	0
Total general	115	10,452.80	2,754.79	2

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	308,218.0	308,218.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	104,275.0	104,275.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	296,159.0	296,159.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	83.0	83.0

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	74.81	71.51	71.60	217.92
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	68	65	84	84
JORNALAS	852,683	748,735	705,872	2,307,290
BENEFICIARIOS	11,992	14,170	16,044	42,206
LONGITUD	1,852.08	1,509.00	---	3,361.08
CAMINOS	---	---	553	553



MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,702	325	2,027
INMUEBLES ESCOLARES	1,121	---	---
CENTROS DE SALUD	314	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	243	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	22	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	2	---	---

Fecha de recepción: Martes, 31 de Enero de 2017, mediante Oficio No.: 6.13.347/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/082/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	01/02/2014	31/12/2014	58.60	INAUGURADO EL 22 DE JULIO DE 2016.	2.00	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
2	PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION BOULEVARD FELIPE ANGELES-AV. NUEVO PACHUCA PLAZA DE TOROS	01/07/2012	31/12/2014	183.80	INAUGURADA 31-MAR-15	1.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330011	PE
3	DISTRIBUIDOR VIAL MUNICIPIOS UNIDOS (TULIPANES)	01/06/2012	01/12/2013	175.20	INAUGURADA 31-MAR-15	DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330010	---
4	PUENTE COLONIAS E INTERSECCION BLVD. FELIPE ANGELES BLVD. SANTA CATARINA BLVD. NUEVO HIDALGO	01/08/2012	15/07/2014	81.33	INAUGURADA 31-MAR-15	PSV (1.0 Km)	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330009	---
5	DISTRIBUIDOR VIAL EL MINERO	01/05/2014	31/12/2014	79.40	INAUGURADA 31-MAR-15	1.00	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096330006	PE
6	ACCESO A GRUTAS DE TOLANTONGO	16/02/2015	26/11/2015	7.37	FECHA DE INAUGURACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.	0.90	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
7	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	16/06/2011	02/12/2015	260.40	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00345 OBRA INAUGURADA EL 22 DE JULIO DE 2016.	6.00	INAUGURADAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
8	TEPEJI DEL RIO – TULA DE ALLENDE (PUENTES VEHICULARES)	01/04/2014	31/01/2015	57.90	N/A	2 puentes 1.1 km	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	---
9	EL OLIVO - CUESTA COLORADA - TEXCADHO	01/09/2014	31/08/2015	10.00	LOS DATOS DEL REGISTRO ANTE LA SHCP FUE PROPORCIONADO POR CDI..	0.70	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	---
10	ACCESO A EPAZOYUCAN	16/02/2015	28/10/2015	9.80	OBRA QUE PRESENTA PROBLEMÁTICA SOCIAL	2.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
11	ALFAJAYUCAN - LA SALITRERA	16/02/2015	26/11/2015	9.80	N/A	2.45	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
12	LA ESTANZUELA - IHMSYS	16/02/2015	27/11/2015	9.80	N/A	3.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
13	BOULEVARD ORIENTE DE ACTOPAN	16/02/2015	15/06/2015	9.60	N/A	9.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
14	COCINILLAS – TECOCOMULCO	16/06/2015	15/12/2015	9.59	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
15	PORTEZUELO - SANTIAGO IXTLAHUACA - DANGHU - CALTIMACAN.	21/05/2014	31/01/2015	6.00	N/A	1.10	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330003	---
16	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - ARENALITO	21/04/2014	15/01/2015	6.00	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330012	---
17	ACCESO A TOLCAYUCA	16/02/2015	30/06/2015	5.87	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
18	SAN NICOLAS – AV. ALLENDE – REMEDIOS – ORIZABITA	16/06/2015	30/11/2015	5.19	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
19	EL RINCON – FRAY FRANCISCO	16/02/2015	31/08/2015	4.90	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
20	C.E. COL. MIGUEL HIDALGO – COL. BENITO JUAREZ	16/05/2015	30/11/2015	3.82	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
21	SAN PEDRO CAPULA – LA ESTACION	16/02/2015	30/09/2015	3.14	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
22	C.E. TEPATEPEC – BELLA AIROSA – EL MENDOZA	16/06/2015	15/12/2015	3.10	N/A	1.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
23	C.E. 4 CAMINOS – LA CALZADA	16/06/2015	15/12/2015	2.50	N/A	1.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
24	LOS VIOLINES – EMILIANO ZAPATA.	16/02/2015	30/06/2015	2.45	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
25	E.C. (IXMIQUILPAN - PROGRESO)- MAGUEY BLANCO-MANZANA EL BOTHI	21/06/2014	31/01/2015	2.40	N/A	0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330007	---
26	AV. 25 DE JULIO - MIGUEL HIDALGO	16/07/2015	31/08/2015	2.30	N/A	0.54	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330011	---
27	C.R. BARRIO DEL ORO – LA LOMA DEL ORO – C.F. MEXICO-LAREDO	16/06/2015	30/11/2015	2.16	N/A	1.75	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
28	LOS FILTROS	16/02/2015	31/08/2015	1.47	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
29	CALLE FRANCISCO ZARCO – CALLE MAZATLAN	16/06/2015	30/11/2015	1.27	N/A	0.33	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
30	C.R. NUEVO MEXICO – LAS FUENTES	16/06/2015	15/12/2015	0.92	N/A	0.36	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
31	C.R. ACCESO A ARAMBO	16/06/2015	15/12/2015	0.68	N/A	0.32	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
32	FERRERÍA DE APULCO - SAN PEDRO VAQUERÍAS	16/07/2015	30/11/2016	94.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 29.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 4.0 KM.	17.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330023	---
33	SINGUILUCAN - SANTA ANA CHICHICUAUTLA	01/10/2010	12/02/2016	83.82	N/A	18.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330011	---
34	E.C. (HUAUTLA - CHILITECO) - METLATEPEC - CHAPOPOTE	16/07/2015	31/08/2016	31.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.78 KM.	1.77	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330025	---
35	PISAFLORES - CHALAHUITE - LA ARENA	16/10/2015	18/03/2016	25.00	N/A	0.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096330016	---
36	OJO DE AGUA - SANTA ROSA - SAN JERÓNIMO	16/07/2015	14/11/2016	21.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.6 KM.	7.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330005	---
37	SAUCILLO - PLOMOSAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN	16/07/2015	14/11/2016	19.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.4 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.66 KM.	1.95	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330002	---
38	TIANGUISTENGO ATLAPEXCO, TRAMO: OTLAMALACATLA - PAPTALATA	16/06/2015	31/08/2016	18.00	ASIGNACIÓN APROBADA EN 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 13.0 KM.	2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330001	---
39	METZTITLAN – ZOQUIZOQUIPAN	16/06/2015	31/08/2016	15.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.46 KM.	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330012	---
40	ORIZABITA - LOS ARCOS	16/07/2015	14/11/2016	12.10	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.38 KM.	2.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330010	---
41	SAN BARTOLO TUTOTEPEC - SAN MIGUEL	16/03/2016	17/10/2016	10.00	N/A	0.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330027	---
42	HUAZALINGO - TLANCHINOL	16/02/2016	31/08/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00939	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	---
43	ARCO PONIENTE: PROGRESO-MANDHÓ-SANTA ANA	01/03/2016	14/11/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01959	0.52	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	---
44	LAGUNITA - BANXU	01/09/2014	12/02/2016	9.00	LA OBRA SE CONCLUYE A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEBIDO A QUE FUE NECESARIO LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL SEÑALAMIENTO SERÁ CONSIDERADO PARA ETAPA POSTERIOR.	1.27	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409633009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
45	EL MANANTIAL - EL DEZHA	01/11/2014	04/03/2016	9.00		1.42	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	---
46	ARCO PONIENTE: PROGRESO - MANDHO - SANTA ANA	16/07/2015	08/03/2016	8.30	N/A	1.73	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	---
47	E.C. (OTONGO - TEPEHUACAN DE GUERRERO) - ACAYUCA	16/07/2015	31/08/2016	8.10	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.98 KM.	0.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330020	---
48	LÓPEZ FLORES - LÓPEZ FLORES 2DA. SECCIÓN	16/06/2015	07/03/2016	4.80	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330005	---
49	SAN CLEMENTE - PALACIOS	16/06/2015	31/03/2016	4.79	N/A	0.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330015	---
50	BOULEVARD ORIZABITA	16/05/2015	12/02/2016	4.51	N/A	2.04	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
51	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - CERRITOS, INCLUYE CIRCUITO ANTONIO HERNÁNDEZ	16/10/2015	24/05/2016	4.40	N/A	0.75	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330015	---
52	EL BARRIDO - DIOS PADRE	16/07/2015	08/03/2016	4.22	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01342,	1.15	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	---
53	C.R. PAREDES REMEDIOS – DURAZNO – SAN JUANICO	16/06/2015	12/02/2016	4.21	N/A	0.85	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330011	---
54	C.R. BOCAMIÑO - SAN JUAN TEPA	16/06/2015	08/03/2016	2.22	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
55	C.E. CANAL REQUENA – EL VEINTE	16/06/2015	15/02/2016	1.44	N/A	0.64	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
56	C.R. SAN JOSE - SACRAMONTES	16/06/2015	15/02/2016	0.89	N/A	0.32	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	---
57	JOROBAS-TULA, DISTRIBUIDOR VIAL PIV LA ZAL	01/10/2011	01/12/2013	64.30	N/A	DISTRIBUIDOR	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	03096330023	---
58	RECONSTRUCCION PACHUCA-TULANCINGO- LOS ROMEROS	16/07/2013	30/12/2013	17.70	N/A	3.90	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330010	---
59	SAN SEBASTIAN DE JUAREZ - SANTA MARIA MACUA	16/05/2013	30/11/2013	15.60	N/A	4.30	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330006	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
60	EC (HUICHAPAN - IXMIQUILPAN) - SAN FRANCISCO SACACHICHILCO	16/05/2013	30/12/2013	13.00	N/A	6.40	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330022	---
61	CIRCUITO LOMA CENTRO - LA LOMA	23/05/2013	07/11/2013	10.24	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330027	---
62	E.C. MEXICO 45 - EL DURAZNO, INCLUYE RAMAL	23/05/2013	30/11/2013	10.04	N/A	1.80	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330022	---
63	SANTA CRUZ-COCINILLAS	02/07/2013	30/11/2013	9.91	N/A	2.32	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330023	---
64	RANCHO UNIVERSITARIO - SAN MIGUEL HUATENGO - LA ERA.	11/11/2013	31/12/2013	9.90	N/A	0.80	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330001	---
65	RECONSTRUCCION DEL BLVD RAMON G BONFIL.	01/02/2014	15/09/2014	38.69	N/A	4.86	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	---
66	CAMINO: CHILCUAHUTLA-ALFAJAYUCAN.	16/05/2013	30/12/2014	34.21	N/A	6.80	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096330016	---
67	PROGRESO - EL TEPHE	01/02/2014	30/12/2014	30.30	N/A	24.28	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330029	---
68	E.C. KM. 12+000 (MOLANGO - XOCHICOATLAN) - ZAPOCOATLAN - TEXCACO	01/02/2014	31/12/2014	22.89	N/A	1.30	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	---
69	HUICHAPAN TLAXCALILLA. PRIMERA ETAPA	01/02/2014	30/09/2014	17.04	N/A	5.20	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	---
70	C.E. IXTLAHUACO-CALNALI	16/02/2014	15/09/2014	11.20	N/A	*	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330005	---
71	HUAZALINGO - TLANCHINOL	16/02/2014	31/12/2014	9.60	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	---
72	E.C. (PACHUCA - TUXPAN) - LA MESA	16/02/2014	31/12/2014	9.60	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	---
73	RECONSTRUCCION DEL BLV DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE ZEMPOALA.	16/02/2014	15/09/2014	9.58	N/A	0.29	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330008	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
74	VISTA HERMOSA REMEDIOS LOS CRUCES.	01/04/2014	31/12/2014	7.90	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330006	---
75	AV. IGNACIO LOPEZ RAYON - EL DEXTHO	01/04/2014	31/12/2014	4.80	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330010	---
76	EL BARRIDO - DIOS PADRE	21/05/2014	31/12/2014	2.50	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	---
77	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2016 HIDALGO	16/02/2016	10/01/2017	315.97	PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE UTILIZAN 5 CLAVES PRESUPUESTALES.	1,014.16	CONCLUIDAS 2017	CARRETERAS FEDERALES	15092110007, 15092110008, 15092110004, 15092110006	---
78	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016 HIDALGO	15/07/2016	12/01/2017	169.22		76.81	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
79	CARDONAL - ARENALITO - LA MESA - CIENEGUILLITAS - LOS LIRIOS - LA UNIÓN	16/10/2015	30/01/2017	51.90	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.0 KM.	8.00	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330012	---
80	C.R. SAN NICOLAS QUETZALAPA – SAN NICOLAS OCTUPILLA	16/06/2015	30/01/2017	29.90	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.76 KM.	2.76	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330017	---
81	BLVD. RAMÓN G. BONFIL	16/09/2016	02/01/2017	11.30	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00943, LA ASIGNACIÓN 2016 TUVO REDUCCIÓN DE RECURSOS, LA META SE REDUJO EN 1.1 KM.	2.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	---
82	CERRO BOLUDO-LA LOMITA-RANCHO NUEVO	16/02/2016	30/01/2017	10.00	N/A	1.02	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330001	---
83	HUICHAPAN - TLAXCALILLA	16/09/2016	30/01/2017	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00944	1.20	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	---
84	VALLE AZUL: SAN ANDRES ORIZABITA-ESPINO-CERRITOS-NEQUETEJE	16/02/2016	30/01/2017	10.00	N/A	1.60	CONCLUIDAS 2017	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330004	---
85	PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO-QUERETARO)	16/02/2009	31/12/2018	1,326.00	LOS DATOS REGISTRADOS CORRESPONDEN A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO. ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2011 ES DE 185.0 MDP PARA UNA META DE 5.5 KM.	61.80	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096330030	PNI438
86	CG 080 CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA	01/06/2013	29/12/2017	800.03	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 238.0 MDP, PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE 11.0 KM Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATOTONILCO II.	18.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096330002	PNI533
87	CIUDAD SAHAGUN - CALPULALPAN	01/02/2012	31/12/2018	464.00	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO. ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 190.0 MDP, PARA UNA META DE 3.0 KM.	20.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096330029	PE
88	EJE INTERESTATAL ACTOPAN-ATOTONILCO	01/07/2008	30/11/2018	336.94	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 KM, PARA TRABAJOS FALTANTES EN 8.4 KM.	46.30	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330006	PE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
89	JUAREZ HIDALGO - TLAHUİLTEPA	01/02/2010	29/12/2017	289.43	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.4 KM.	50.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330015	---
90	VIALIDAD EN EL ENCAUZAMIENTO LA PAZ - LOS TUZOS	16/09/2016	30/12/2017	245.00	LA ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2017 ES DE 110.0 MDP, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE 36 METROS, META 2017 POR DEFINIR.	5.12	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330014	---
91	TEPEJI DEL RIO - TULA	01/06/2016	30/12/2017	87.40	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01272, LA ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2017 ES DE 38.0 MDP, META POR DEFINIR.	1.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	---
92	BOULEVARD LAS TORRES	16/08/2015	30/06/2017	63.40	LA ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2017 ES DE 10.0 MDP, PARA TRABAJOS FALTANTES EN 1.4 KM..	2.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330021	---
93	TECOZAUTLA - TASQUILLO	01/07/2010	28/02/2017	57.50	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 MDP PARA UNA META DE 4.6 KM.	39.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330006	---
94	CUESTA COLORADA - LA CIENEGA	16/07/2015	28/02/2017	46.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 KM, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM.	4.80	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330006	---
95	ACCESO A TUZANCOAC	16/07/2015	28/02/2017	42.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM.	2.73	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330005	---
96	HUEHUETLA - SAN LORENZO - LIM. IXHUATLÁN DE MADERO, PUEBLA	16/10/2015	28/02/2017	40.58	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 26.08 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.0 KM.	4.65	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330026	---
97	BICENTENARIO SIONISTA: VILLA DE LA PAZ - SAN ANDRÉS ORIZABITA - ESPIRITÚ - QUIXPEDHE	16/07/2015	28/02/2017	25.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.93 KM.	5.07	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330003	---
98	SANTA MARIA NATIVITAS - CHACALAPA	16/10/2015	28/02/2017	18.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM	3.10	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330017	---
99	LA MISIÓN - PUERTO DE LOS NARANJOS	16/08/2015	28/02/2017	18.50	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.3 KM.	1.65	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330016	---
100	COCINILLAS - TECOCOMULCO	16/03/2016	28/02/2017	15.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01783	3.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	---
101	E.C. KM 12+000 (MOLANGO-XOCHICOATLÁN)-ZAPOCOATLAN-TEXCACO	16/03/2016	28/02/2017	15.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00344	1.93	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	---
102	PUENTE RANCHO NUEVO	01/03/2016	28/02/2017	15.00	N/A	0.12	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330008	---
103	E.C. PACHUCA - TUXPAN - LA MESA	16/03/2016	28/02/2017	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00940	2.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
104	EL GARAMBUYO - EL MAYE	16/03/2016	28/02/2017	10.00	N/A	1.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330025	---
105	MINERAL DEL MONTE - ENTRONQUE HUASCA	01/03/2017	31/12/2018	1,900.00	AUN NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO DE COSTO BENEFICIO ACTUALIZADO.	9.60	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	12096330030	PNI521
106	CG-082 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO IXMIQUILPAN	01/02/2018	31/12/2018	1,300.00	AUN NO SE DEFINE EL TRAZO DEFINITIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL COSTO BENEFICIO.	23.00	PROYECTADAS 2017-2018	AUTOPISTAS	EN TRAMITE	PNI447
107	TEHUETLÁN-HUEJUTLA	01/06/2017	31/12/2018	350.00	REGISTRO DE CARTERA DE INVERSIÓN EN PROCESO, SOLICITUD NÚMERO 48781. ASIGNACIÓN 2017: 200 MDP, META POR DEFINIR.	11.10	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES		#N/A
108	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS 2017 HIDALGO	01/03/2017	29/12/2017	234.90		86.20	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
109	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2017 HIDALGO	01/03/2017	29/12/2017	141.85	PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROGRAMA SE UTILIZAN 4 CLAVES PRESUPUESTALES	1,014.16	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	16092110001, 16092110003, 16092110006, 16092110007	#N/A
110	DISTRIBUIDOR VIAL LA HUASTECA	01/02/2018	31/12/2018	140.00	ASIGNACIÓN PARA 2016 ES DE 121.0 MDP.	PSV	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096330020	---
111	E.C. (SAN BARTOLO - SAN MIGUEL) - PIE DEL CERRO	03/07/2017	31/12/2017	22.22	EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	4.90	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330008	---
112	HUAUTLA TOHUACO AMATZINTLA - CHAPOPOTE (LIM. EDOS HGO Y VER)	03/07/2017	31/12/2017	20.00	EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA CONTRATACIÓN.	5.30	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330026	---
113	ACUATEMPA-SAN SALVADOR-TOLTITLÁN	03/07/2017	31/12/2017	10.30	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	25.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/62	---
114	CHILIJAPA-TEYAHUALA-TEXCAPA	03/07/2017	31/12/2017	10.00	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	1.50	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/63	---
115	CHAPULHUACAN-TEPEHUÁCAN-CRUZ VERDE	03/07/2017	31/12/2017	5.70	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	1.50	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/64	---
