



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
CAMPECHE
CIERRE DE MAYO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JUNIO 2018





SCT CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JUNIO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP

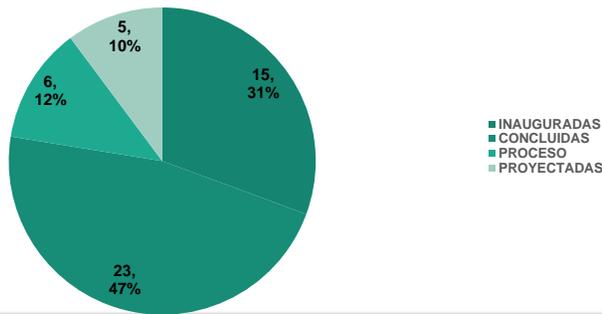

Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

49

16,359.1

6,000.1

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	2,971.00	9.79	1
PROCESO 2018	1	1,299.00	3.29	1
PROYECTADAS 2018	1	1,672.00	6.50	0
CARRETERAS FEDERALES	13	8,022.70	100.70	1
INAUGURADAS 2013-2017	4	2,495.30	31.70	1
CONCLUIDAS 2013-2017	3	640.60	16.50	0
CONCLUIDAS 2018	1	93.50	-	0
PROCESO 2018	2	523.30	9.80	0
PROYECTADAS 2018	1	820.00	18.00	0
PROYECTADAS 2019-2020	2	3,450.00	24.70	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	1	713.60	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	713.60	-	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12	513.98	118.02	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	15.98	5.42	0
CONCLUIDAS 2013-2017	10	448.00	100.60	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	50.00	12.00	0
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	2	1,169.55	3,009.70	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	362.60	1,313.50	0
PROCESO 2018	1	806.95	1,696.20	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14	1,639.80	2,757.89	0
INAUGURADAS 2013-2017	10	95.41	138.64	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	1,210.79	2,389.85	0
PROCESO 2018	1	333.60	229.40	0
PUERTOS	3	1,254.40	4.02	2
CONCLUIDAS 2013-2017	2	211.20	3.90	1
PROCESO 2018	1	1,043.20	0.12	1
AEROPUERTOS	2	74.10	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	2	74.10	-	0
Total general	49	16,359.13	6,000.12	4

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	187.30	-	187.30
TELEVISIONES ENTREGADAS	67,643	0	67,643
MUNICIPIOS ENTREGADOS TD	7		7
BENEFICIARIOS TDT	69,437		69,437



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	243.72
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	32.27
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	211.45
SITIOS CONTRATADOS	2,212

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	32.41	33.14	40.60	26.84	23.40	156.40
BENEFICIARIOS PET	6,511	5,793	7,068	5,680	5,583	30,635
CAMINOS PET	0	0	201	194	194	201
JORNALES PAGADOS PET	363,535	345,622	400,505	190,191	191,191	1,491,044
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	11	0	11	11	11	11
LONGITUD PET	824	772	0	438	0	2,033



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	222,873	34%
HOGARES CON INTERNET	133,931	100%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	515,201	8%
USUARIOS DE INTERNET	459,528	48%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	187.30
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	156.40
MÉXICO CONECTADO	243.72

Fecha de recepción: Miércoles 6 junio de 2018, mediante Oficio No.: 6.4.418.017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Miércoles 6 de junio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/005/2018 enviado por la DGAPDCST.



2 AUTOPISTAS



16 CARRETERAS



26 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



3 PUERTOS



2 AEROPUERTOS



COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	CG-064 PUENTE DE LA UNIDAD CIUDAD DEL CARMEN	abr-17	oct-18	1,299.00	3.29	PROCESO 2018	NO APLICA	---	AUTOPISTAS
2	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CIUDAD DEL CARMEN PARA MEJORAR LAS VIALIDADES	jul-18	nov-18	1,672.00	6.50	PROYECTADAS 2018	No. Solicitud 48002	PNI575	AUTOPISTAS
3	CAMPECHE - MERIDA, DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE	may-15	nov-15	90.60	1 DISTRIBUIDOR VIAL	CONCLUIDAS 2013-2017	14096240001	PNI340	CARRETERAS FEDERALES
4	DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKAN	mar-16	sep-17	107.80	2 DISTRIBUIDORES VIALES	CONCLUIDAS 2013-2017	15096240002	PNI340	CARRETERAS FEDERALES
5	CHAMPOTON - VILLA MADERO	mar-16	dic-17	442.20	16.50	CONCLUIDAS 2013-2017	11096240002	PE	CARRETERAS FEDERALES
6	DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III	mar-17	abr-18	93.50	1 DISTRIBUIDOR VIAL	CONCLUIDAS 2018	14096240002	PE	CARRETERAS FEDERALES
7	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFERICO DE CAMPECHE	ago-12	dic-13	393.40	3 DISTRIBUIDORES	INAUGURADAS 2013-2017	10096240004; 12096240001	---	CARRETERAS FEDERALES
8	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES, CARRETERA CAMPECHE - MERIDA	abr-13	dic-13	254.00	3 DISTRIBUIDORES	INAUGURADAS 2013-2017	08096240011	---	CARRETERAS FEDERALES
9	AV HEROE DE NACUZARI (RAMAL AEROPUERTO DE CAMPECHE)	jul-13	mar-14	105.50	5.40	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003 10096240004	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CG-062 AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE	dic-12	sep-15	1,742.40	26.30	INAUGURADAS 2013-2017	12096240001	PNI479	CARRETERAS FEDERALES
11	MODERNIZACIÓN CARRETERA COSTERA DEL GOLFO (CAMP-MERIDA)	oct-17	jul-18	150.00	5.80	PROCESO 2018	17096240002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	ACCESO AL PUERTO DE SEYBAPLAYA	may-18	nov-18	373.30	4.00	PROCESO 2018	17096240003	---	CARRETERAS FEDERALES
13	LIBRAMIENTO DE CHAMPOTON	jul-18	dic-18	820.00	18.00	PROYECTADAS 2018	17096240001	PE	CARRETERAS FEDERALES
14	LIBRAMIENTO DE ATASTA	feb-19	dic-20	3,000.00	14.70	PROYECTADAS 2019-2020	11096240003	PE	CARRETERAS FEDERALES
15	LIBRAMIENTO DE ESCARCEGA	feb-19	dic-20	450.00	10	PROYECTADAS 2019-2020	43851	PE	CARRETERAS FEDERALES
16	PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED FEDERAL 2017	feb-17	dic-17	713.60	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
17	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2016	feb-16	dic-16	362.60	1313.5	CONCLUIDAS 2013-	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
18	PROGRAMA CONSERVACION RED FEDERAL 2018	feb-18	nov-18	806.95	1,696.20	PROCESO 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
19	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: X-CANHA – DZILBACHEN)	ago-15	dic-15	60.00	17.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096240005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
20	NUEVO COAHUILA – EL DESENGAÑO	jun-15	dic-15	50.00	9.50	CONCLUIDAS 2013-2017	13096240001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
21	E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA	ago-15	dic-15	20.00	5.60	CONCLUIDAS 2013-2017	10096240002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
22	CERRO LAS AGUILAS – EL DESENGAÑO	ago-15	dic-15	20.00	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15096240001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
23	SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO – E.C (NUEVA COAHUILA – EL DESENGAÑO)	jun-15	dic-15	60.00	12.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096240006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
24	DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, 0 AL 8	abr-16	oct-16	28.00	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096240002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
25	XPUJIL-DZIBALCHE, TR. XCANHA-DZIBALCHEN 78 AL 94	abr-16	nov-16	70.00	16.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096240005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
26	XPUJIL – DZIBALCHEN (TR: XPUJIL – X-CANHA)	abr-16	nov-16	60.00	12.5	CONCLUIDAS 2013-2017	10096240003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
27	NVO COAHUILA-CERRO LAS AGUILAS	abr-16	nov-16	40.00	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096240001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
28	SN MANUEL NVO CANUTILLO-EC(NVO COAHUILA-DESENGAÑO)	abr-16	nov-16	40.00	8.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096240006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
29	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL	abr-13	oct-13	15.98	5.42	INAUGURADAS 2013-2017	10096240002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
30	LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE	feb-19	dic-19	50.00	12.00	PROYECTADAS 2019-2020	16096240001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
31	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	feb-15	dic-15	378.79	902.15	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
32	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 756.7 KMS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	feb-16	nov-16	418.60	756.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
33	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2017	feb-17	dic-17	413.40	731.00	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
34	CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM	abr-13	oct-13	14.32	22.70	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
35	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600	abr-13	oct-13	11.87	16.60	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
36	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	may-13	oct-13	10.91	12.30	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
37	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNION - LA PAZ.	may-13	oct-13	10.40	14.3	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	may-13	oct-13	8.17	7.20	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES	may-13	oct-13	5.38	5.90	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580	abr-13	nov-13	11.44	9.58	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	abr-13	nov-13	11.16	20.76	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	E.C- CHAMP. – CAMP. – EL ZAPOTE) – SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.)	jul-13	nov-13	8.43	22.10	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.)	jul-13	nov-13	3.33	7.20	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	CONSERVACION CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2018	mar-18	nov-18	333.60	229.40	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JUNIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: MAYO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
45	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO EN	abr-14	oct-14	18.79	3.9	CONCLUIDAS 2013-2017	13095100008	---	PUERTOS
46	CG-066 MODERNIZAR EL PUERTO DE SEYBAPLAYA	abr-13	dic-16	192.41	MUELLE	CONCLUIDAS 2013-2017	11095100001	PNI177	PUERTOS
47	CG-063 MODERNIZAR EL PUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN.	nov-13	nov-18	1,043.20	0.12	PROCESO 2018	12095100003	PNI429	PUERTOS
48	PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA Y RODAJES EN EL AEROPUERTO DE CAMPECHE	mar-13	dic-13	56.90	---	CONCLUIDAS 2013-2017	1209JZL0022	---	AEROPUERTOS
49	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 500 MIL LITROS EN CD DEL CARMEN	abr-14	nov-15	17.20	1 TANQUE	CONCLUIDAS 2013-2017		PE	AEROPUERTOS
