



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS CENTRO SCT
MICHOCACÁN**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JULIO 2018



SCT MICHOACAN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JULIO 2018

Infraestructura de Comunicaciones y Transportes



4 AUTOISTAS



51 CARRETERAS



123 CAMINOS RURALES



2 FERROVIARIO





41 PUERTOS



3 AEROPUERTO

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP

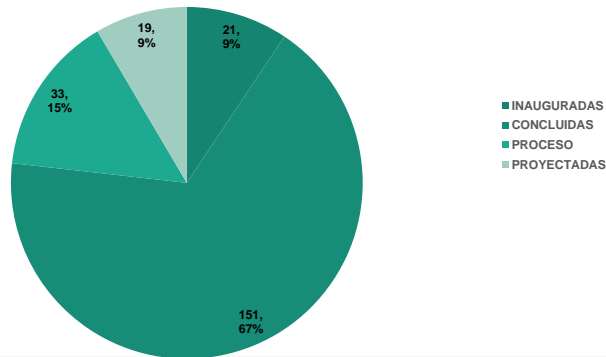

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **Obras 224**, **MDP 45,414.0**, **Km 14,457.8**

Concepto	No. Obras	Inversión MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOISTAS	4	7,664.50	134.90	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	4,300.00	63.70	-
INAUGURADAS 2018	1	560.50	46.00	1
PROCESO 2018	1	1,504.00	0.00	-
PROYECTADAS 2019-2020	1	1,300.00	25.20	-
CARRETERAS FEDERALES	37	15,029.50	8,071.34	3
INAUGURADAS 2013-2017	3	1,440.90	123.00	2
INAUGURADAS 2018	2	1,283.30	9.24	-
CONCLUIDAS 2013-2017	20	2,824.33	4,726.60	1
CONCLUIDAS 2018	2	10.50	3.30	-
PROCESO 2018	8	2,609.47	844.50	-
PROCESO 2019-2027	1	4,800.00	2,262.00	0.00
PROYECTADAS 2019-2020	1	2,061.00	102.70	0.00
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	10	1,107.40	5,127.22	-
CONCLUIDAS 2013-2017	7	826.04	5,127.22	-
PROCESO 2018	2	125.60	0.00	-
PROYECTADAS 2018	1	155.76	0.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	4	101.80	332.00	-
CONCLUIDAS 2013-2017	3	85.60	332.00	-
PROCESO 2018	1	16.20	0.00	-
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	115	4,026.90	751.26	-
INAUGURADAS 2013-2017	4	36.00	10.30	-
CONCLUIDAS 2013-2017	83	879.23	315.69	-
CONCLUIDAS 2018	3	14.70	3.70	-
PROCESO 2018	6	35.50	32.80	-
PROCESO 2019-2027	5	2,945.28	356.80	-
PROYECTADAS 2018	2	18.50	7.32	0.00
PROYECTADAS 2019-2020	12	97.69	24.65	-
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8	428.19	37.76	-
CONCLUIDAS 2013-2017	6	42.21	37.76	-
CONCLUIDAS 2018	1	196.98	0.00	-
PROCESO 2018	1	189.00	0.00	-
FERROVIARIO	2	251.10	3.35	-
INAUGURADAS 2013-2017	1	203.20	0.00	-
PROCESO 2018	1	47.90	3.35	-
PUERTOS	41	15,770.05	0.00	-
INAUGURADAS 2013-2017	7	11,276.59	0.00	-
INAUGURADAS 2018	2	1,109.87	0.00	-
CONCLUIDAS 2013-2017	25	1,865.70	0.00	-
PROCESO 2018	5	960.92	0.00	-
PROCESO 2019-2027	2	556.97	0.00	-
AEROPUERTOS	3	1,034.60	0.00	-
CONCLUIDAS 2013-2017	1	23.40	0.00	-
PROYECTADAS 2018	1	11.20	0.00	-
PROYECTADAS 2019-2020	1	1,000.00	0.00	-
Total general	224	45,414.04	14,457.83	4

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	1,369.48	21.74	1,391.22
TELEVISIONES ENTREGADAS	492,816	7,287	500,103
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	0		0
BENEFICIARIOS TDT	498,886		498,886



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	219.30
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	34.26
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	185.04
SITIOS CONTRATADOS	3,469

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	114.28	124.43	122.80	61.07	54.60	477.18
BENEFICIARIOS PET	29,264	28,776	36,077	14,299	13,956	122,372
CAMINOS PET	0	0	520	231	231	520
JORNALES PAGADOS PET	1,406,940	1,368,198	1,211,202	506,385	506,385	4,999,110
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	104	0	113	96	96	113
LONGITUD PET	4,571	4,131	0	1,303	0	10,004



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var. %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	1,059,547	82%
HOGARES CON INTERNET	416,525	74%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,371,129	22%
USUARIOS DE INTERNET	2,118,384	77%



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	MÉXICO CONECTADO
1,391.22	477.18	219.30

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.15.303.199/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/362/2018 enviado por la DGAPDCST.

Programas



ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS MICHOACÁN CON CIERRE A JUNIO DE 2018

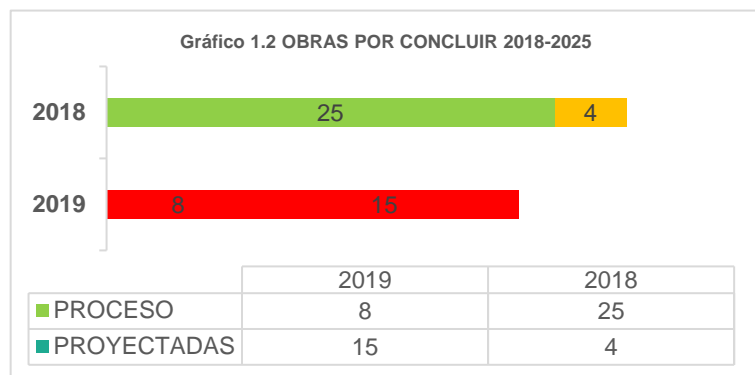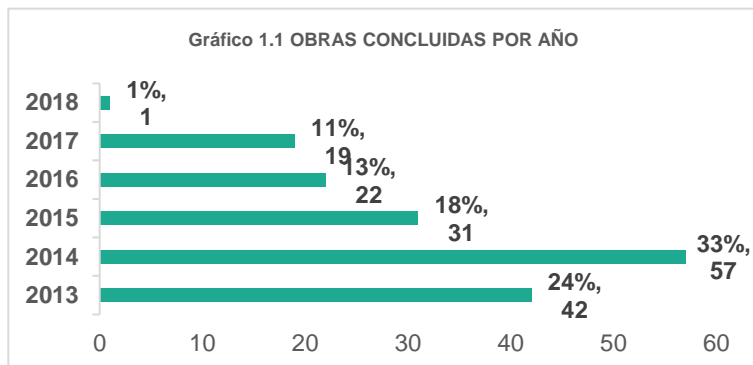

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	2	4,860.50
CARRETERAS FEDERALES	37	6,470.67
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	97	1,169.12
FERROVIARIO	1	203.20
PUERTOS	34	14,252.16
AEROPUERTOS	1	23.40
Total general	172	26,979.05

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	8	17,347.46
SECRETARIO	3	1,440.90
COORDINADOR GENERAL	1	133.28
DIRECTOR GENERAL	4	36.00
PRESENCIA FEDERAL	5	1,252.72
Total general	21	20,210.36

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
INAUGURADAS	9.38%	44.50%
CONCLUIDAS	67.41%	14.90%
PROCESO	14.73%	30.37%
PROYECTADAS	8.48%	10.23%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 224 Obras con una inversión de 45,414.04

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.6.15.303.199/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/362/2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA	sep-12	jul-16	4,300.00	63.70	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI563	AUTOPISTAS
2	CG-152 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JIQUILPAN - SAHUAYO PRIMERA ETAPA	oct-14	oct-16	560.50	46	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI515	AUTOPISTAS
3	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA PATZCUARO – URUAPAN	ene-18	dic-18	1,504.00	5 ENTRONQUE S	PROCESO 2018	N/A	PNI494	AUTOPISTAS
4	LIBRAMIENTO DE URUAPAN	abr-19	dic-19	1,300.00	25.20	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PNI470	AUTOPISTAS
5	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-14	nov-14	190.44	1,890.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110003	---	CARRETERAS FEDERALES
6	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CA	ene-14	dic-14	600.00	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
7	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-14	dic-14	11.82	31	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
8	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	jun-15	oct-15	11.66	4.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110006	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
9	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2015.	ene-15	dic-15	547.07	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
10	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2015 DE LA RED FED LIBRE DE PEAJE	abr-15	dic-15	36.65	156.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110004	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CARRETERA NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN, TRAMO: MOJONERA - SAN ISIDRO	jul-15	feb-16	9.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
12	LOS REYES-LOS LIMONES	may-16	oct-16	8.00	0.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360028	---	CARRETERAS FEDERALES
13	LA CAPILLA-LA LOBERA	ago-16	dic-16	7.20	1.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360040	---	CARRETERAS FEDERALES
14	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2016	ene-16	dic-16	451.19	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
15	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	ago-16	dic-16	11.66	PUNTO DE CONFLICTO	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110006	---	CARRETERAS FEDERALES
16	TAFETAN-PLATANILLO	ago-16	jun-17	18.07	5.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360018	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
17	E.C HUETAMO-CHURUMUCO-(TURITZIO- CHARACUARO)	may-16	jun-17	5.00	0.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CARRETERAS FEDERALES
18	MODERNIZACION DEL CAMINO ETUCUARO-PARRITAS	may-17	ago-17	4.80	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
19	MODERNIZACION DEL CAMINO LAS MESAS DEL TERRENATE-EL BEJUCO	42845	oct-17	7.00	2	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360022	---	CARRETERAS FEDERALES
20	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2017	ene-17	oct-17	544.90	647.80	CONCLUIDAS 2013-2017	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
21	MODERNIZACION DEL CAMINO NARANJA DE TAPIA-ZIRAHUEN, TRAMO MOJONERA-SAN ISIDRO	may-17	oct-17	7.00	SEÑALAMIENTO	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
22	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EL PEDREGOSO-LAS LATAS	may-17	nov-17	5.00	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360043	---	CARRETERAS FEDERALES
23	MODERNIZACION DEL CAMINO LA PALMA – SAN JUAN TARARAMEO	ago-17	dic-17	3.50	1.30	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360050	---	CARRETERAS FEDERALES
24	CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN-ZAMORA (1A ETAPA)	feb-13	dic-17	343.78	38.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360010	PNI347	CARRETERAS FEDERALES
25	LOS HOYOS-E.C. (MEXICO 120)	sep-17	ene-18	3.50	1.30	CONCLUIDAS 2018	11093630005	---	CARRETERAS FEDERALES
26	BUENOS AIRES - EL CAHULOTE	nov-17	mar-18	7.00	2.00	CONCLUIDAS 2018	17096360002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
27	CG-252 MODER. DEL LIBRAMIENTO NORTE DE MORELIA, EN EL TRAMO SALIDA A SALAMANCA – SALIDA A QUIROGA	may-14	mar-15	526.00	5 Estructuras	INAUGURADAS 2013-2017	14096360010	PNI300	CARRETERAS FEDERALES
28	CG-254 AMPLIACION DE LA CARRETERA PATZCUARO - TACAMBARO	nov-13	may-15	254.10	109.00	INAUGURADAS 2013-2017	13096360002	PNI220	CARRETERAS FEDERALES
29	ANILLO PERIFERICO ORIENTE DE LA PIEDAD	may-11	oct-16	660.80	14.00	INAUGURADAS 2013-2017	10096360032	PE	CARRETERAS FEDERALES
30	COSTERA COAHUAYANA DE HIDALGO- LAZARO CARDENAS, TRAMO: EL HABILLAL- CALETA DE CAMPOS.	ago-09	feb-15	1,020.00	0.57	INAUGURADAS 2018	09096360029	PNI191	CARRETERAS FEDERALES
31	ZACAPU - ENTRONQUE AUTOPISTA MARAVATIO - ZAPOTLANEJO	dic-15	oct-17	263.30	8.67	INAUGURADAS 2018	N/A	---	CARRETERAS FEDERALES
32	CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN - ZAMORA (2A ETAPA)	oct-17	jul-18	225.32	4.00	PROCESO 2018	11096360010	---	CARRETERAS FEDERALES
33	MODERNIZACION DEL CAMINO: NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN	mar-18	ago-18	4.30	3.40	PROCESO 2018	14096360006	---	CARRETERAS FEDERALES
34	BUENOS AIRES - EL CAHULOTE	abr-18	ago-18	6.20	2.10	PROCESO 2018	17096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
35	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PEDREGOSO-LAS LATAS	abr-18	ago-18	5.30	1.40	PROCESO 2018	12096360043	---	CARRETERAS FEDERALES
36	MODERNIZACION DEL CAMINO: COAHUAYANA-EL CAMALOTE.	may-18	sep-18	7.10	2.20	PROCESO 2018	18096360002	---	CARRETERAS FEDERALES
37	CONST. AUT. J IQUILPAN-SAHUAYO, SEGUNDA ETAPA CONTINUACION DEL CG-152	jul-17	sep-18	855.40	12.60	PROCESO 2018	N/A	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
38	LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA.	ago-14	dic-18	1,339.25	171.00	PROCESO 2018	11096360009	---	CARRETERAS FEDERALES
39	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2018.	ene-18	dic-18	166.60	647.80	PROCESO 2018	11092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
40	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200	ago-09	dic-19	4,800.00	2,262.00	PROCESO 2019-2027	11096360003	---	CARRETERAS FEDERALES
41	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200. TR CALETA DE CAMPOS-MARUATA	abr-19	dic-19	2,061.00	102.70	PROYECTADAS 2019-2020	11096360008	---	CARRETERAS FEDERALES
42	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-15	dic-15	195.54	1,659.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110003	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
43	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-16	oct-16	4.30	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-16	nov-16	282.34	172.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-16	nov-16	136.68	1,627.85	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
46	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-17	nov-17	133.70	1,627.85	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
47	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	mar-17	nov-17	69.30	39.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
48	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-17	nov-17	4.18	228 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
49	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-18	dic-18	121.42	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
50	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-18	dic-18	4.18	232 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
51	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2018	43312	nov-18	155.76	---	PROYECTADAS 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
52	PROGRAMA DE RECONSTR., CONSER. RUTINARIA Y PERI. DE PUENTES 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	feb-14	dic-14	41.62	332.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13092110006	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
53	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-16	nov-16	30.98	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
54	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	may-17	nov-17	13.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
55	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS 2018	abr-18	sep-18	16.20	4 PUENTES	PROCESO 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
56	CHAMACUERO-TEJOCOTE DE LA CALERA	abr-12	jul-13	10.60	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
57	CUITZEO ZINAPARO TR: HUANDACAREO – PURUANDIRO (TRAMO DEL KM. 2+660 AL KM. 57+000)	mar-11	nov-13	147.50	77.72	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
58	TUPATARO (MICHOACAN) - PIÑICUARO (GUANAJUATO) HUANDACAREO, MICH. - PIÑACUARO, GTO	jun-13	dic-13	29.20	12.12	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
59	EL PANDILLO-TICUITACO	ago-11	dic-13	16.90	6.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360027	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
60	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	mar-14	jun-14	5.00	1.5	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	MODERNIZACION DEL CAMINO LA ESPERANZA-EL TEPEHUAJE	mar-14	jul-14	5.00	1.62	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	AMPLIACION DEL ACCESO SUR DE JACONA.	mar-14	ago-14	7.35	0.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	COJUMATLAN-EL NOGAL	mar-14	ago-14	7.00	0.94	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CLARA - LA CALERA	mar-14	ago-14	4.00	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	MODERNIZACION DEL CAMINO MARCOS CASTELLANOS - JIQUILPAN - E.C. CARRETERA A SAN MIGUEL	mar-14	ago-14	3.00	0.70	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360045	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA	jul-14	ago-14	10.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
67	CD. HIDALGO- MARAVATIO	mar-14	ago-14	4.49	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	mar-14	ago-14	5.00	0.03	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	mar-14	ago-14	5.00	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	jul-14	sep-14	3.93	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
71	MODERNIZACION DEL CAMINO LA HUACANA - POTURO.	feb-14	sep-14	15.00	5.32	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO VILLALONGIN-EL DEVANADOR	mar-14	sep-14	9.47	1.84	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	MODERNIZACION DEL E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - SAN JERONIMO CAÑADA DE BUENAVISTA	abr-14	sep-14	7.00	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PILAR - LAS JICAMAS	jun-14	sep-14	4.00	1.03	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	CONSTRUCCION DEL CAMINO PALOS MARIAS-SALITRE DE COPOLA. TR. PALOS MARIAS - EL DERRUMBADERO	jun-14	oct-14	7.60	0.94	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO – ATIJO	jun-14	nov-14	11.11	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360030	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ALCALDE-ACATLAN	ago-14	nov-14	9.20	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
78	MODERNIZACION DEL E.C. HUETAMO-ZITACUARO TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO-OCUARO	sep-14	nov-14	6.00	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	CONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - LA LOMA - SANTA MARIA	ago-14	nov-14	5.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAPU - ZIRAHUEN, TRAMO NARANJA DE TAPIA	sep-14	dic-14	4.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	MODERNIZACION DEL E.C HUETAMO-CHURUMUCO(TURITZIO- CHARACUARO)	oct-14	mar-15	11.00	4.04	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SENGUIO (CABECERA MUNICIPAL) - LOS REYES (ENTRONQUE TLALPUJAHUA)	jul-14	mar-15	8.98	6.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360047	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
83	CONSERVACIÓN EN TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: TINGAMBATO-SAN ANGEL ZURUMUCAPIO; TRAMO: DEL KM 0+000 AL	jul-14	mar-15	8.70	9.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
84	MODERNIZACION DEL ENTRONQUE SAN SEBASTIAN SALIDA PERIBAN (LIBRAMIENTO)	sep-14	mar-15	7.69	1.4	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360045	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
85	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO	sep-14	mar-15	6.00	1.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
86	MODERNIZACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - HOYO DEL AIRE	sep-14	may-15	9.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
87	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ENCANTO-ZIHUATZIO-ACHEROS-PURUARAN	sep-14	may-15	10.40	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
88	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CERRITO DE PESCADORES	sep-14	may-15	5.00	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
89	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+374	sep-14	may-15	4.80	1.37	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
90	COMBURINDIO – ACCESO AL PUENTE ZIRANDARO	sep-14	may-15	14.40	0.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360043	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
91	MODERNIZACION DEL CAMINO VILLAMAR EL PLATANAL	sep-14	may-15	11.94	0.30	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
92	MODERNIZACION DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS-SANTA MARIA	sep-14	may-15	10.00	2.84	CONCLUIDAS 2013-2017	08096360014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
93	MODERNIZACION DEL E.C. (ZITACUARO - TOLUCA) KM 89+000 LA CAÑADA - EL TIGRITO	sep-14	jun-15	5.49	0.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
94	MODERNIZACION DEL CAMINO GUACAMAYAS-JUNTAS DE CHAPACARICUARO	sep-14	jun-15	10.00	2.24	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
95	MODERNIZACION DEL CAMINO ZIRIMICUARO LA LAJA EMILIANO ZAPATA	sep-14	jul-15	6.24	1.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
96	MODERNIZACION DEL CAMINO ZINAPARO - ANGAMACUTIRO	sep-14	jul-15	6.00	1.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
97	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	sep-14	ago-15	9.56	3.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
98	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO MARTI MERCADO	sep-14	sep-15	10.50	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360046	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
99	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	jul-15	nov-15	5.76	1.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
100	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO-POTURO	ago-14	dic-15	10.00	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
101	EL ALCALDE-ACATLAN	jul-15	dic-15	8.15	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
102	SAN JUANICO - CHUCANDIRAN	jul-15	ene-16	1.43	0.52	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
103	RANCHO NUEVO - EL CORTIJO.	jul-15	feb-16	7.67	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
104	ACCESO A CERRITO DE PESCADORES	jul-15	feb-16	3.18	0.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
105	LOS REYES - LOS LIMONES	sep-15	feb-16	7.67	2.20	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
106	PUEBLO NUEVO - LA ARPITA	jul-15	feb-16	7.41	2.14	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
107	LIBRAMIENTO ZINAPECUARO	jul-15	feb-16	9.53	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360032	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
108	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO 18 KM	jul-15	mar-16	17.02	5.40	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
109	E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - TURITZIO - CHARACUARO	jul-15	mar-16	9.58	3.46	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
110	COJUMATLAN-EL NOGAL	ago-15	abr-16	8.75	1.96	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
111	E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	ago-15	abr-16	7.64	1.85	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
112	E.C. SAN JERONIMO - CAÑADA DE BUENAVISTA	jul-15	may-16	8.59	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
113	CHURUMUCO - ATIJO	ago-15	jul-16	18.03	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360030	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
114	ACCESO A FRANCISCO SARABIA	jul-15	jul-16	2.39	0.50	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
115	MODERNIZACION DEL CAMINO LA CAPILLA-LA LOBERA	sep-14	jul-16	7.97	2.30	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360040	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
116	ZINAPARO ANGAMACUTIRO	may-16	sep-16	10.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
117	TECOMATAN-E.C:(PAJACUARAN- LA LUZ)	jul-15	sep-16	7.68	2.68	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
118	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO (MUNICIPIO DE SENGUIO).	may-16	sep-16	6.00	0.90	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
119	SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	jul-15	sep-16	5.74	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
120	TECOMATAN-E.C (PAJACUARAN-LA LUZ)	abr-16	oct-16	2.10	0.58	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
121	URINGUITIRO - JUNTAS DE NANDIRO	mar-16	oct-16	10.00	2.82	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
122	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO	may-16	oct-16	6.00	2.9	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
123	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2016	feb-16	nov-16	52.00	38.77	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
124	MODERNIZACION DEL CAMINO PASO DE NUÑEZ - JANINDIPO	sep-14	nov-16	9.80	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
125	PARACUARO - JUCUTACATO	may-16	nov-16	8.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
126	MODERNIZACION DEL CAMINO TEPEHUAJE- AL ZANGARRO	sep-14	nov-16	6.00	1.08	CONCLUIDAS 2013-2017	09096360006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
127	MODERNIZACION DEL CAMINO CAPIRE DE BRAVO - ACUYO	sep-14	dic-16	18.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
128	JANAMBO - STA. ROSA DE LIMA	may-16	dic-16	8.00	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
129	EL ALCALDE-ACATLÁN	may-16	ene-17	8.00	2.40	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
130	SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA	jul-15	feb-17	7.67	1.34	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
131	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	may-16	feb-17	10.00	2.90	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
132	LA GUADALUPE-HOYO DEL AIRE	may-16	feb-17	10.00	3.18	CONCLUIDAS 2013-2017	14096360013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
133	MODERNIZACION DEL CAMINO ATIJO ZARATE	sep-14	abr-17	20.00	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
134	E.C. (TOMENDAN-IXTARO) TIPITARILLO	jul-15	jun-17	5.72	1.6	CONCLUIDAS 2013-2017	12096360038	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
135	CUATE-BARRANQUILLAS	may-16	jul-17	9.00	2.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096360009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
136	MONTE GRANDE - IXTARO TRAMO CANTERA - IXTARO TOMENDAN	ago-17	sep-17	6.70	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
137	ARROYO SECO - MONTECILLOS	may-17	oct-17	7.00	2.50	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
138	EL LIMON DE PAPATZINDAN - PURUNGUEO, TRAMO LA VIRGENCITA -PURUNGUEO	may-17	oct-17	7.00	2.70	CONCLUIDAS 2013-2017	15096360004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
139	SAN ANTONIO VILLALOGIN EL DEVANADOR	may-17	ene-18	7.00	1.80	CONCLUIDAS 2018	12096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
140	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUETAMO-CHURUMUCO) - SAN JERÓNIMO-C. DE BUENAVISTA	mar-18	jun-18	2.70	0.80	CONCLUIDAS 2018	13096360005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
141	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - LAS PILAS	nov-17	jun-18	5.00	1.10	CONCLUIDAS 2018	17096360001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
142	MODERNIZACION DEL CAMINO TECOMATAN - E.C. PAJACUARAN - LA LUZ	mar-14	jul-14	5.00	1.60	INAUGURADAS 2013-2017	13096360003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
143	MODERNIZACION DEL CAMINO TAFETAN-PLATANILLO	feb-14	jul-14	15.00	4	INAUGURADAS 2013-2017	10096360018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
144	E. C. DR. MIGUEL SILVA - NUEVO URECHO. CAMINO A LA COMUNIDAD DE ARAPARICUARIO	may-14	sep-14	10.00	2.90	INAUGURADAS 2013-2017	12096360014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
145	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS LETRAS-CASA BLANCA	mar-14	oct-14	6.00	1.80	INAUGURADAS 2013-2017	09096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
146	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: E.C. (COPETIRO-TANCITARO)-APUNDARO-PAREO	mar-18	jul-18	1.60	0.40	PROCESO 2018	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
147	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: MONTE GRANDE - IXTARO	mar-18	ago-18	1.70	0.5	PROCESO 2018	15096360002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
148	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (SANTA CRUZ-PUERTA DE COENEMBO)-COENEMBO	mar-18	ago-18	6.70	25.60	PROCESO 2018	14096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
149	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA, TRAMO: EL DURAZNO-PUENTE DE TIERRA	may-18	ago-18	4.60	---	PROCESO 2018	12096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
150	MODERNIZACION DEL CAMINO: LA PALMA - LA ANGOSTURA	abr-18	ago-18	5.90	1.80	PROCESO 2018	00000046057	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
151	SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA	may-16	nov-18	15.00	4.50	PROCESO 2018	12096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
152	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	ago-15	ago-19	8.13	2.96	PROCESO 2019-2027	14096360007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
153	LAS LETRAS-CASA BLANCA	mar-17	ago-19	7.55	2.34	PROCESO 2019-2027	09096360020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
154	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COALCOMAN – ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS	sep-14	sep-19	2,300.00	150.00	PROCESO 2019-2027	08096360012	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
155	E.C. (COTIJA - LA LAGUNILLA) - PLAN DEL CERRO	ago-15	sep-19	9.60	1.50	PROCESO 2019-2027	10096360021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
156	PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION EN 200 KM DE CAMINOS RURALES ZONAS INDIGENAS	ago-14	dic-19	620.00	200.00	PROCESO 2019-2027	12096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
157	CAYACO-HACIENDA VIEJA	jul-18	oct-18	10.00	4.00	PROYECTADAS 2018	12096360021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
158	EL SALITRE-EL PLATANAL	jul-18	oct-18	8.50	3.32	PROYECTADAS 2018	11096360026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
159	CARRETERA SAN MARCOS - RANCHO SECO, RANCHO SECO - EL SABINO, RANCHO SECO - TAHUEJO	abr-19	jul-19	15.00	4.00	PROYECTADAS 2019-2020	00000045270	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
160	CONST. PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN TRAMO CARRETERO PATAMBO - AGUA AGRIA	abr-19	jul-19	3.50	PUENTE	PROYECTADAS 2019-2020	00000046041	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
161	JACONA - LOURDES	jun-19	ago-19	10.00	2.85	PROYECTADAS 2019-2020	00000046029	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
162	LIBRAMIENTO DE PERIBAN	may-19	ago-19	14.10	2.00	PROYECTADAS 2019-2020	11096360024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
163	PURUARÁN - HACHEROS - EL ENCANTO	may-19	ago-19	12.00	3.00	PROYECTADAS 2019-2020	10096360028	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
164	CONTINUACION AV. CEDRON TRAMO: CASETA CERRO VERDE / PANTEON LA JOYA 3 KM	jun-19	ago-19	9.70	3.00	PROYECTADAS 2019-2020	00000046052	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
165	SAN RAFAEL TECARIO - SAN RAFAEL CUTZARONDIRO	jun-19	ago-19	8.00	2.50	PROYECTADAS 2019-2020	00000046033	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
166	ENTRONQUE PROCESIONAL EL BARRIO - EL FLECHERO	may-19	ago-19	7.00	1.00	PROYECTADAS 2019-2020	10096360019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
167	TACUPA - CHARACHARANDO 7 KM	jun-19	ago-19	6.00	1.90	PROYECTADAS 2019-2020	00000046050	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
168	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	may-19	ago-19	3.00	1.10	PROYECTADAS 2019-2020	14096360044	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
169	LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO (EL ORO) - TEPETONGO (NOPALERA - TEPETONGO)	jun-19	ago-19	2.70	0.80	PROYECTADAS 2019-2020	00000046053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
170	SANTA CRUZ - E.C. (PUERTA DE COENEMBO - TZIRANDANGATZIO)	jul-19	sep-19	6.69	2.50	PROYECTADAS 2019-2020	14096360031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
171	FELIPE CARRILLO PUERTO-FELIPE ANGELES-PUNTA DE AGUA-DIVISION DEL NORTE	mar-15	jun-15	4.26	4.26	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
172	APATZINGAN-AGUILILLA, TRAMO (APATZINGAN-DIVISION DEL NORTE)	mar-15	ago-15	8.00	20.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
173	REHABILITACION DE CAMINO LA PIEDAD - ZARAGOZA 7 KM	ago-15	ene-16	9.78	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
174	SAN JOSE DE GRACIA - AGUA CALIENTE	ago-15	ene-16	6.00	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
175	REHABILITACION DEL CAMINO MARAVILLAS - EL COLEXIO 3.5 KM	ago-15	ene-16	4.89	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
176	CHAVINDA - ESTACION MORENO	ago-15	abr-16	9.28	2.9	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
177	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2017	mar-17	ene-18	196.98	33 OBRAS	CONCLUIDAS 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
178	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2018	abr-18	ago-18	189.00	8 OBRAS	PROCESO 2018	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
179	CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS PARA AMPLIACION DE PATIO FERROVIARIO EN ISLA DEL CAYACAL	ago-13	dic-13	203.20	VÍAS FERREAS	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	FERROVIARIO
180	DESARROLLO DEL PATIO FERROVIARIO INTERMODAL DE LAZARO CARDENAS	dic-14	dic-18	47.90	3.35	PROCESO 2018	N/A	---	FERROVIARIO
181	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE RAYOS GAMMA A FULL SCAN	oct-12	feb-13	3.70	---	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
182	CERCADO EN EL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO	abr-13	may-13	0.25	CERCADO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
183	ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, EN RED DE ALUMBRADO Y RED DE FIBRA OPTICA	mar-13	jun-13	5.35	ALIMENTACION ELECTRICA	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
184	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS	may-13	ago-13	2.53	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
185	CONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQUETAS EN VIAL. DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO EN ISLA DEL CAYACAL	may-13	ago-13	2.86	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
186	RELLENO CON MATERIAL GRAVA ARENA EN AREAS COLINDANTES CON EL PUERTO	sep-13	oct-13	7.53	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
187	APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN ZONAS DE DESARROLLO ECOLOGICO"	sep-13	nov-13	5.95	DESARROLLO ECOLOGICO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
188	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE PANELES SOLARES ENERGÍA DEL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	sep-13	nov-13	3.64	PANELES SOLARES	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
189	REUBICACION DE ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE FIBRA OPTICA PARA EL CANAL SUROESTE	sep-13	nov-13	4.23	ALUMBRADO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
190	CONSTRUCCION DE RAMPA DE BOTADERO Y PATIO DE SERVICIOS PARA EMBARCACIONES MENORES	sep-13	nov-13	3.08	SEÑALAMIENTOS	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
191	RENIVELACION DE PROTECCION PLAYERA EN LA ISLA DE ENMEDIO	jun-13	dic-13	7.36	PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
192	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL EN LA ISLA DEL CAYACAL	oct-13	dic-13	3.51	PROTECCIÓN MARGINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
193	MANTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO	may-13	dic-13	3.07	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
194	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	abr-13	dic-13	6.71	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
195	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA DEL CANAL SUROESTE	nov-13	dic-13	6.11	VIALIDAD PERIFÉRICA	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
196	COLOCACION Y SUMINISTRO DE DEFENSAS EN TERMINALES DE USOS MULTIPLES.	oct-13	dic-13	6.04	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
197	CONST, SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION DE SISTEMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN VIALIDAD NORTE 1 ETAPA	nov-13	dic-13	5.75	---	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
198	OBRAS DE REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS	ene-14	dic-14	204.00	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
199	AMPLIACION DE CANALES Y DARSENAS	jun-13	dic-15	1,003.70	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	1209J3A0001	---	PUERTOS
200	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA NORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.	ene-01	dic-15	77.46	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0209J3A0001	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
201	REUBICACION DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA EN LA ISLA DEL CAYACAL	ene-11	dic-15	54.51	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0509J3A0004	---	PUERTOS
202	CONSTRUCCION DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y PATIOS DE USO COMUN	ene-09	dic-15	35.49	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0809J3A0002	---	PUERTOS
203	DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES EN EL RECINTO PORTUARIO	ene-09	nov-16	30.47	EDIFICIO	CONCLUIDAS 2013-2017	0809J3A0003	---	PUERTOS
204	TERMINAL GRANELERA	ago-14	dic-16	40.40	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3G0005	PNI076	PUERTOS
205	PROTECCION DE MARGENES PLAYERAS Y EN CANALES DE NAVEGACION.	ene-01	sep-17	342.00	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	0309J3A0002	---	PUERTOS
206	DRAGADO DE DARSENA NORTE Y ORIENTE EN PUERTO DE LAZARO CARDENAS	ene-10	may-13	940.30	DRAGADO 11 MILLONES M3	INAUGURADAS 2013-2017	0909J3A0003	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
207	RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE	jun-13	oct-13	55.02	RETIRO DE MATERIALES	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
208	CONSTRUCCION DE AREAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	dic-13	abr-14	5.89	---	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	---	PUERTOS
209	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES I	ene-13	jun-14	2,557.00	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI382	PUERTOS
210	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS.	may-09	jun-14	48.31	2.5 HECTAREAS	INAUGURADAS 2013-2017	0309J3A0018	---	PUERTOS
211	OFICINAS ADMINISTRATIVAS API Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA DEL CAYACAL	ago-12	oct-14	133.28	24,000 m2	INAUGURADAS 2013-2017	0409J3A0004	---	PUERTOS
212	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II. (ETAPA 1, FASE 1).	oct-12	mar-17	7,536.79	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI617	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
213	TERMINAL DE USOS MULTIPLES III.	ene-13	jul-17	189.87	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI323	PUERTOS
214	TERMINAL ESPECIALIZADA DE AUTOS	ene-17	abr-18	920.00	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2018	N/A	PNI309	PUERTOS
215	REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES I Y II	nov-17	ago-18	130.74	506 MTS DE MUELLE	PROCESO 2018	1709J3A0005	---	PUERTOS
216	ADUANA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS	mar-14	nov-18	405.83	60 POSICIONES ADICIONALES DE REVISIÓN	PROCESO 2018	1309J3A0003	---	PUERTOS
217	INSTALACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS	mar-18	nov-18	277.78	LÍNEAS SUBTERRÁNEAS	PROCESO 2018	1709J3A0004	---	PUERTOS
218	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ene-16	nov-18	91.57	3 PLANTAS DE TRATAMIENTO	PROCESO 2018	1109J2Z0010	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
219	CLUSTER LOGISTICO EN ISLA DE LA PALMA	ago-14	dic-18	55.00	CLUSTER LOGÍSTICO	PROCESO 2018	N/A	PNI473	PUERTOS
220	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y PATIO DE USO PÚBLICO	mar-18	mar-19	364.85	MUELLE Y PATIO	PROCESO 2019-2027	1709J3A0009	---	PUERTOS
221	PROLONGACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS	mar-18	mar-19	192.12	ESCOLLERAS	PROCESO 2019-2027	1609J3A0003	---	PUERTOS
222	AMPLIACIÓN DE SALA DE LLEGADA INTERNACIONAL PARA SEPARACIÓN DE FLUJO DE PASAJEROS EN URUAPAN	jul-13	jul-14	23.40	1 TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2017	1309JZL0014	---	AEROPUERTOS
223	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MORELIA	ago-18	dic-18	11.20	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2018	N/A	PE	AEROPUERTOS
224	AEROPUERTO DE LAZARO CARDENAS	abr-19	dic-19	1,000.00	1 PISTA	PROYECTADAS 2019-2020	N/A	PNI433	AEROPUERTOS
