




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
PUEBLA
CIERRE DE JUNIO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

JULIO 2018



SCT PUEBLA


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, JULIO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

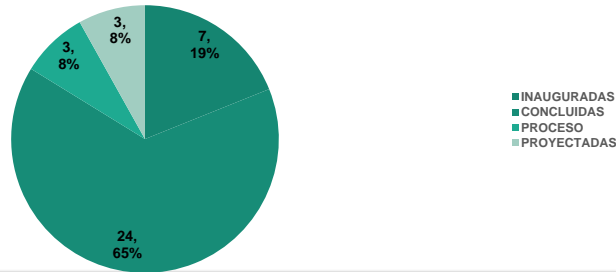

Obras MDP Km
A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **37** **31,058.6** **673.9**

| Concepto | No. Obras | Inversión total MDP | Longitud (KM) | CG |
|--|-----------|---------------------|----------------|----------|
| AUTOPISTAS | 4 | 20,189.53 | 66.45 | 2 |
| INAUGURADAS 2013-2017 | 2 | 19,439.05 | 49.6 | 1 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 1 | 7.68 | 0.85 | 0 |
| PROCESO 2018 | 1 | 742.80 | 16 | 1 |
| CARRETERAS FEDERALES | 14 | 5,408.68 | 184.91 | 3 |
| INAUGURADAS 2013-2017 | 3 | 2,329.74 | 48.7 | 1 |
| ENTREGADA 2018 | 2 | 1,689.01 | 78 | 2 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 7 | 606.32 | 18.21 | 0 |
| PROCESO 2018 | 1 | 183.61 | 0 | 0 |
| PROYECTADAS 2019-2020 | 1 | 600.00 | 40 | 0 |
| CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES | 1 | 114.00 | 73.4 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 1 | 114.00 | 73.4 | 0 |
| CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10 | 300.42 | 25.819 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 10 | 300.42 | 25.819 | 0 |
| CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 3 | 430.10 | 323.33 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 3 | 430.10 | 323.33 | 0 |
| FERROVIARIO | 2 | 4,314.97 | 0 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 1 | 1,652.00 | 0 | 0 |
| PROCESO 2018 | 1 | 2,662.97 | 0 | 0 |
| AEROPUERTOS | 3 | 300.90 | 0 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2017 | 1 | 65.90 | 0 | 0 |
| PROYECTADAS 2019-2020 | 2 | 235.00 | 0 | 0 |
| Total general | 37 | 31,058.60 | 673.909 | 5 |

AVANCE EN PROGRAMAS

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 2015 | Continuidad 2016 | Total |
|--|----------|------------------|----------|
| INVERSIÓN EJERCIDA PET | 1,782.02 | 3.89 | 1,785.91 |
| TELEVISIONES ENTREGADAS | 643,620 | 1,303 | 644,923 |
| MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT | 190 | | 190 |
| BENEFICIARIOS TDT | 676,735 | | 676,735 |



| MÉXICO CONECTADO | 2014-2017 |
|--|-----------|
| INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO | 233.02 |
| INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO | 33.26 |
| MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO | 199.76 |
| SITIOS CONTRATADOS | 4,495 |

| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | | | | | | |
| INVERSIÓN EJERCIDA PET | 86.56 | 82.99 | 83.80 | 44.62 | 38.20 | 336.17 |
| BENEFICIARIOS PET | 16,920 | 12,949 | 18,789 | 6,714 | 6,478 | 61,850 |
| CAMINOS PET | 0 | 0 | 506 | 288 | 288 | 506 |
| JORNALeros PAGADOS PET | 1,023,778 | 896,948 | 826,777 | 374,192 | 374,192 | 3,495,887 |
| MUNICIPIOS ATENDIDOS PET | 124 | 0 | 217 | 93 | 93 | 217 |
| LONGITUD PET | 3,207 | 2,444 | 0 | 999 | 0 | 6,650 |



| DATOS DE COMUNICACIONES | 2016 | Var % |
|---------------------------------|-----------|-------|
| HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL | 1,288,326 | 144% |
| HOGARES CON INTERNET | 472,334 | 29% |
| USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL | 2,675,776 | 33% |
| USUARIOS DE INTERNET | 2,816,384 | 40% |

| | |
|--|----------|
| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 1,785.91 |
| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 336.17 |
| MÉXICO CONECTADO | 233.02 |


Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018, mediante Oficio No.: C.SCT.6.20.413.0183/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/367/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

JULIO 2018

**ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
PUEBLA CON CIERRE A JUNIO DE 2018**

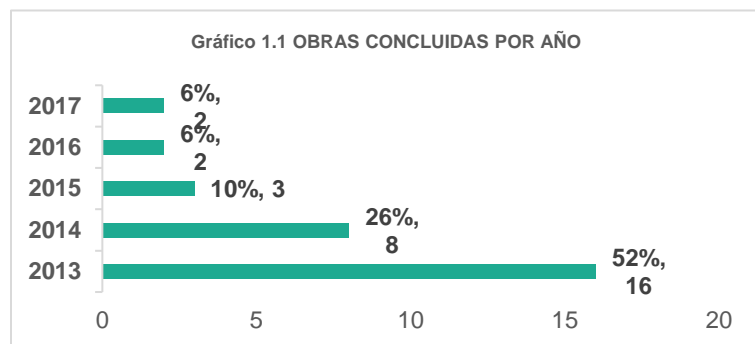

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

| SECTOR | NO. DE OBRAS | INVERSIÓN MDP |
|---------------------------------|--------------|------------------|
| AUTOPISTAS | 3 | 19,446.73 |
| CARRETERAS FEDERALES | 13 | 4,739.07 |
| CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13 | 730.52 |
| AEROPUERTOS | 1 | 65.90 |
| FERROVIARIO | 1 | 1,652.00 |
| Total general | 31 | 26,634.22 |

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

| FUNCIONARIO | NO. DE OBRAS | INVERSIÓN MDP |
|----------------------|--------------|------------------|
| PRESIDENTE | 3 | 20,322.95 |
| SECRETARIO | 3 | 2,444.85 |
| SUBSECRETARIO | 1 | 690.00 |
| Total general | 7 | 23,457.80 |

*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

| TIPO DE OBRA | OBRAS | INVERSIÓN % |
|----------------------|----------------|----------------|
| CONCLUIDAS | 64.86% | 10.23% |
| INAUGURADAS | 18.92% | 75.53% |
| PROCESO | 8.11% | 11.56% |
| PROYECTADAS | 8.11% | 2.69% |
| Total general | 100.00% | 100.00% |

Se registra un total de 37 Obras con una inversión de 31,058.60

Fecha de recepción: Martes 3 de julio de 2018 , mediante Oficio No.: C.SCT.6.20.413.0183/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Martes 3 de julio de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/367/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Meta (KM) | Situación actual | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO | Sector |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | ACCESO A LA AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN RAMAL ÁVILA CAMACHO (PLAN DE AYALA - VILLA ÁVILA CAMACHO) | abr-14 | ago-14 | 7.68 | 0.85 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 13096410001 | --- | AUTOPISTAS |
| 2 | AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN (TRAMO: NUEVO NECAXA-AVILA CAMACHO) | jun-08 | jun-14 | 8,939.05 | 36.60 | INAUGURADAS 2013-2017 | 03096500030 | PNI558 | AUTOPISTAS |
| 3 | CG-040 CONSTRUCCION DEL VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA AUTOPISTA MEXICO VERACRUZ TRAMO PLANTA VW | ago-14 | sep-16 | 10,500.00 | 13.00 | INAUGURADAS 2013-2017 | 12096410045 | PNI659 | AUTOPISTAS |
| 4 | CG-138 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LA GALARZA - AMATITLANES | may-17 | jul-18 | 742.80 | 16.00 | PROCESO 2018 | 14096410014 | PNI263 | AUTOPISTAS |
| 5 | ENTRONQUE LA CEIBA DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO -TUXPAN | ago-12 | dic-13 | 65.00 | 2.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 03096500030 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 6 | PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, EN LA CARRETERA MEXICO – TUXPAN (MEX-130) EN EL KM 97+280 | jul-12 | abr-14 | 110.00 | 0.71 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 11096410021 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 7 | SAN JOSÉ BUENAVISTA-ZARAGOZA | may-14 | oct-14 | 9.60 | 1.20 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 14096410001 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 8 | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CIUDAD SERDAN (ENTRONQUES Y ESTRUCTURAS) | mar-15 | dic-15 | 176.50 | 3 ENTRONQUES Y 3 ESTRUCTURAS | CONCLUIDAS 2013-2017 | 11096410022 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 9 | REYES DE VALLARTA - RICARDO FLORES MAGÓN | jul-15 | ago-16 | 14.11 | 2.30 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 14096410002 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 10 | PUEBLA-ATLIXCO, TRAMO: PERIFÉRICO ECOLÓGICO-ATLIXCO | sep-12 | nov-16 | 127.41 | 0.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 12096410023 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 11 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHIGNAHUAPAN ZACATLAN | jun-15 | sep-17 | 103.70 | 11.00 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 12096410043 | --- | CARRETERAS FEDERALES |

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Meta (KM) | Situación actual | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO | Sector |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 12 | CARRETERA PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEON ATLIXCO – IZUCAR DE MATAMOROS, KM 27+300 AL KM 55+000. | may-09 | may-13 | 690.00 | 27.7 | INAUGURADAS 2013-2017 | 06096410025 | PE | CARRETERAS FEDERALES |
| 13 | DISTRIBUIDOR VIAL 9 PERIFERICO DE PUEBLA | feb-13 | sep-15 | 883.90 | DISTRIBUIDOR | INAUGURADAS 2013-2017 | 11096410010 | PNI368 | CARRETERAS FEDERALES |
| 14 | CG-140 TEPEACA - TEHUACAN. | nov-13 | dic-16 | 755.84 | 21.00 | INAUGURADAS 2013-2017 | 13096410022 | PNI359 | CARRETERAS FEDERALES |
| 15 | CG-139 TEPEACA - ZACATEPEC. | oct-13 | ene-15 | 333.51 | 78.00 | ENTREGADA 2018 | 13096410029 | PNI211 | CARRETERAS FEDERALES |
| 16 | CG-041 MODERNIZACION DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA. | mar-14 | may-18 | 1,355.50 | 6 ENTRONQUES | ENTREGADA 2018 | 12096410042 | PNI358 | CARRETERAS FEDERALES |
| 17 | PUEBLA-ATLIXCO, TRAMO: PERIFÉRICO ECOLÓGICO-ATLIXCO | mar-18 | dic-18 | 183.61 | 2 PSV | PROCESO 2018 | 12096410023 | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 18 | PUEBLA-TLAPA | feb-19 | may-19 | 600.00 | 40.00 | PROYECTADAS 2019-2020 | | --- | CARRETERAS FEDERALES |
| 19 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016 | mar-16 | dic-16 | 114.00 | 73.40 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 15092110007 | --- | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES |
| 20 | E.C.(TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEON) - LOS REYES METZONTLA. | oct-13 | dic-13 | 9.99 | 2.30 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 12096410019 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 21 | EL CAPULIN - SAN JOSE PETLALCINGO - EJIDO SAN JOSE TIERRA COLORADA-TEXCALAPA | oct-13 | dic-13 | 6.00 | 1.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 10096410004 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 22 | SAN PEDRO CUAYUCA- PUENTE MARQUEZ. | oct-13 | dic-13 | 4.00 | 1 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 08096410018 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Meta (KM) | Situación actual | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO | Sector |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 23 | XOCHILOMA - GUADALUPE SABINAL - E.C. (CIUDAD SERDAN - EL SECO) | oct-13 | dic-13 | 3.99 | 0.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 10096410031 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 24 | SANTA CECILIA CLAVIJERO - COLONIA MIGUEL HIDALGO | oct-13 | dic-13 | 3.50 | 1.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 11096410019 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 25 | XONACATLAN -GUADALUPE VICTORIA - BUENA VISTA DE GUERRERO | feb-14 | jun-14 | 7.99 | 1.50 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 10096410014 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 26 | HUEHUETLAN EL CHICO - EL TECOCOYUCO. | feb-14 | jul-14 | 9.47 | 0.90 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 08096410025 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 27 | TEPANGO DE RODRIGUEZ TLANANCA DE HERNANDEZ | may-14 | dic-14 | 10.50 | 0.82 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 11096410024 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 28 | AFRICAM – TECALI DE HERRERA | jul-14 | feb-15 | 235.00 | 13.60 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 14096410010 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 29 | TEHUITZINGO-LOS HORNOS DE ZARAGOZA- SAN PEDRO CUAYUCA | oct-13 | feb-15 | 9.98 | 2.20 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 09096410024 | --- | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 30 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES 2016 | feb-16 | dic-16 | 234.54 | 132.23 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 16092100004 | --- | CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 31 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS | feb-17 | dic-17 | 163.56 | 140.80 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 16092100004 | --- | CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 32 | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA IZUCAR-CHIAUTLA DE TAPIA | may-17 | dic-17 | 32.00 | 50.30 | CONCLUIDAS 2013-2017 | 16092100004 | --- | CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES |
| 33 | PRIMER CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO CORREDOR CHACHAPA-TLAXCALANCINGO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. | nov-11 | ene-13 | 1,652.00 | --- | CONCLUIDAS 2013-2017 | | --- | FERROVIARIO |

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: JULIO DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: JUNIO DE 2018

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Meta (KM) | Situación actual | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO | Sector |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 34 | TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE-SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA | sep-13 | nov-18 | 2,662.97 | --- | PROCESO 2018 | | --- | FERROVIARIO |
| 35 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO DE PUEBLA 2012-2013 | ene-12 | dic-13 | 65.90 | AEROPUERTO | CONCLUIDAS 2013-2017 | 1209JZL0002 | --- | AEROPUERTOS |
| 36 | REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES Y ACCESO A RECINTO FISCALIZADO AEROPUERTO DE PUEBLA | feb-19 | dic-19 | 160.00 | AEROPUERTO | PROYECTADAS 2019-2020 | N/A | PE | AEROPUERTOS |
| 37 | REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES EN TEHUACAN | oct-18 | dic-19 | 75.00 | AEROPUERTO | PROYECTADAS 2019-2020 | | PE | AEROPUERTOS |
