



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DE CENTRO SCT
SINALOA
CIERRE DE JULIO 2018**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**



AGOSTO 2018

SCT SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO 2018

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP

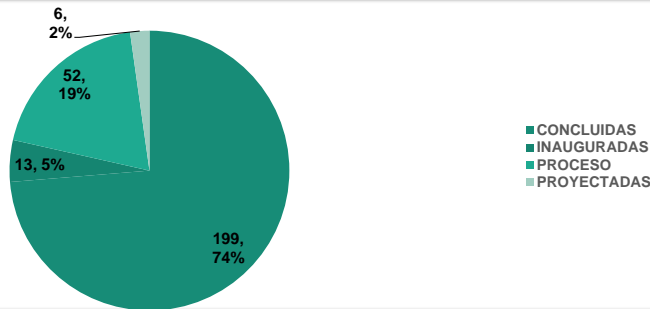

A la fecha, la SCT invierte en la

Obras 270

MDP 13,238.3

Km 16,368.3

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	1,495.00	38.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	1,495.00	38.00	0
CARRETERAS FEDERALES	27	3,132.89	1,449.54	0
CONCLUIDAS 2013-2017	13	269.19	1,397.78	0
INAUGURADAS 2013-2017	10	1,357.10	27.46	0
PROCESO 2018	2	256.00	1.30	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	939.60	14.00	0
PROCESO 2019-2027	1	311.00	9.00	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	106	830.17	9,555.76	0
CONCLUIDAS 2013-2017	79	640.77	8,529.91	0
CONCLUIDAS 2018	6	77.17	-	0
PROCESO 2018	18	100.68	1,016.90	0
PROYECTADAS 2018	3	11.55	8.95	0
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	6	293.29	0.72	0
CONCLUIDAS 2013-2017	5	289.49	0.72	0
PROCESO 2018	1	3.80	-	0
FONDEN	12	717.00	191.70	0
CONCLUIDAS 2013-2017	11	695.07	183.70	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	21.93	8.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADO	41	2,262.76	3,093.70	0
CONCLUIDAS 2013-2017	32	591.13	229.10	0
PROCESO 2018	9	1,671.63	2,864.60	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	68	733.20	2,012.20	0
CONCLUIDAS 2013-2017	47	550.69	866.30	0
CONCLUIDAS 2018	3	16.95	5.40	0
PROCESO 2018	18	165.56	1,140.50	0
FERROVIARIO	2	1,654.23	26.60	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	28.23	2.40	0
PROYECTADAS 2018	1	1,626.00	24.20	0
PUERTOS	3	2,038.57	0.11	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	70.00	-	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	200.00	0.11	0
PROCESO 2018	1	1,768.57	-	0
AEROPUERTOS	4	81.23	-	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	18.30	-	0
PROCESO 2018	2	52.93	-	0
PROYECTADAS 2018	1	10.00	-	0
Total general	270	13,238.34	16,368.34	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	659.97	-	659.97
TELEVISIONES ENTREGADAS	238,359	-	238,359
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	18	-	18
BENEFICIARIOS TDT	247,728	-	247,728



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTA	256.20
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO C	32.29
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	223.91
SITIOS CONTRATADOS	5,166

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	51.40	51.52	52.60	29.08	26.30	210.90
BENEFICIARIOS PET	14,687	16,186	19,860	8,841	9,064	68,638
CAMINOS PET	0	0	477	295	295	477
JORNALeros PAGADOS PET	609,272	571,062	518,572	262,585	262,585	2,224,076
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	18	0	18	18	18	18
LONGITUD PET	1,270	1,151	0	707	0	3,128



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	764,679	65%
HOGARES CON INTERNET	344,888	20%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,868,662	21%
USUARIOS DE INTERNET	1,721,898	42%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN...	659.97
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	210.90
MÉXICO CONECTADO	256.20

Fecha de recepción: Miércoles 8 de Agosto de 2018, mediante Oficio No.: SCT.6.24.01.-1655/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/420/2018 enviado por la DGAPDCST.

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS SINALOA CON CIERRE A JULIO DE 2018

Gráfico 1.1 OBRAS CONCLUIDAS POR AÑO


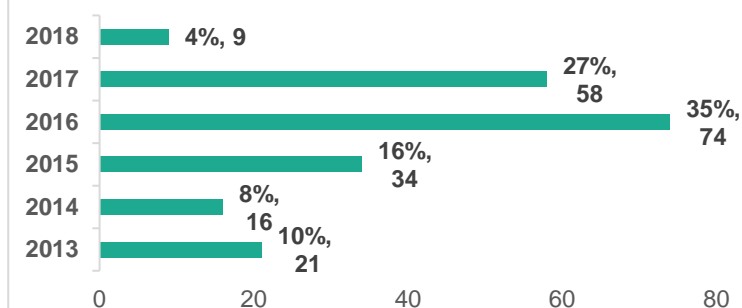


Gráfico 1.2 OBRAS POR CONCLUIR 2018-2025

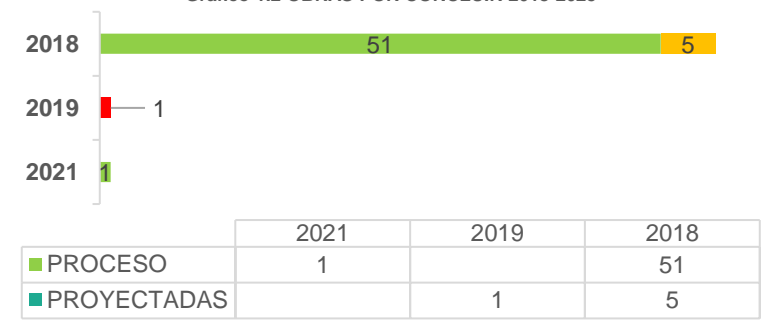

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	1	1,495.00
CARRETERAS FEDERALES	125	3,350.72
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	82	1,158.77
FERROVIARIO	1	28.23
PUERTOS	2	270.00
AEROPUERTOS	1	18.30
Total general	212	6,321.02

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	1	1,495.00
COORDINADOR GENERAL	1	200.00
GOBERNADOR	5	333.83
SECRETARIO	6	1,045.20
Total general	13	3,074.03

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	73.70%	24.53%
INAUGURADAS	4.81%	23.22%
PROCESO	19.26%	32.71%
PROYECTADAS	2.22%	19.54%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 270 Obras con una inversión de 13,238.34

Fecha de recepción: Miércoles 8 de Agosto de 2018 , mediante Oficio No.: SCT.6.24.01.-1655/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 9 de agosto de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/420/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
25	PSV ENTRONQUE RUIZ CORTINES, MEXICO - NOGALES	jun-18	dic-18	128.00	PSV	PROCESO 2018	17096450002	---	CARRETERAS FEDERALES
26	ENTRONQUE BENJAMÍN HILL-COSTERITA	nov-17	dic-18	128.00	1.30	PROCESO 2018	17096450001	---	CARRETERAS FEDERALES
27	LIBRAMIENTO DE ESCUINAPA	sep-16	dic-21	311.00	9.00	PROCESO 2019-2027	12092100007	---	CARRETERAS FEDERALES
28	CIRCUITO EXTERIOR DE CULIACÁN	ene-19	dic-19	939.60	14	PROYECTADAS 201	11096450008	---	CARRETERAS FEDERALES
114	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	may-18	ago-18	10.58	5.98	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA 1	may-18	ago-18	9.28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (641 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
116	BARRERA DE PROTECCION	may-18	ago-18	10.08	BARRERA DE PROTECCIÓN (4.57)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
117	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES	jul-18	oct-18	2.58	1 Puente	PROCESO 2018	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA 2	may-18	oct-18	9.28	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (398 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
119	SEÑALAMIENTO VERTICAL	may-18	nov-18	4.18	SEÑALAMIENTO VERTICAL (598 KM)	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
120	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.074 KM	mar-18	dic-18	6.50	137.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
121	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 137.972 KM	mar-18	dic-18	6.40	137.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
122	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 127.568 KM	mar-18	dic-18	6.20	120.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
123	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	5.00	119.75	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
124	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 83.87 KM	mar-18	dic-18	4.80	83.87	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
125	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 96.00 KM	mar-18	dic-18	4.60	96.00	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
126	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	mar-18	dic-18	4.50	88.2	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
127	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN TRAMOS EN 84.077 KM	mar-18	dic-18	4.30	64.27	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
128	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.90 KM	mar-18	dic-18	4.30	95.90	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
129	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA TRAMOS EN 68.935 KMS	mar-18	dic-18	4.10	68.93	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
130	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 179 PUENTES	mar-18	dic-18	2.50	179 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
131	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 109 PUENTES	mar-18	dic-18	1.50	109 PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
132	RECONSTRUCCIÓN DE LAS JUNTAS DE CALZADA DE LC	ago-18	sep-18	0.71	1 PUENTE	PROYECTADAS 201	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARP
133	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTEN	ago-18	nov-18	6.89	3.15	PROYECTADAS 201	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARP
134	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTEN	ago-18	nov-18	3.95	5.8	PROYECTADAS 201	#N/A	---	CONSERVACIÓN DE CARP
140	TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	may-18	ago-18	3.80	1 Puente	PROCESO 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
185	MODERNIZACIÓN BADIRAGUATO PARRAL KM 103+000 AL 106+000	ago-18	dic-18	95.17	3.00	PROCESO 2018	18096450001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
186	MODERNIZACIÓN BADIRAGUATO PARRAL KM 106+000 AL KM 110+000	ago-18	dic-18	86.51	4.00	PROCESO 2018	18096450001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
187	MODERNIZACIÓN BADIRAGUATO PARRAL KM 110+000 AL 112+600	ago-18	dic-18	68.68	2.60	PROCESO 2018	18096450001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
188	CULIACAN – PARRAL (ESTADOS: SINALOA - CHIHUAHUA)	dic-13	dic-18	768.87	140.00	PROCESO 2018	05096450004	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
189	EJE INTERREGIONAL: TOPOLOBAMPO – CHIHUAHUA; TRAMO: SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX.	abr-10	dic-18	534.39	906.00	PROCESO 2018	07096450009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
190	E.C. CULIACAN-SANALONA-ALCOYONQUI- E.C. A LO DE BARTOLO.	ago-13	dic-18	37.85	920.00	PROCESO 2018	13096450009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
191	E.C.F. MEXICO NO. 15 - LOMA DE TECUYO	may-13	dic-18	37.77	850.00	PROCESO 2018	12096450015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
192	CALLE 6, TRAMO MEXICO 15- CANAL ALTO	jun-12	dic-18	27.85	2.00	PROCESO 2018	12096450018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
193	CINCO HERMANOS - CASA BLANCA.	mar-14	dic-18	14.54	37.00	PROCESO 2018	13096450025	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
244	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MEXICO 15 - JESUS MARIA	may-18	ago-18	10.72	3.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
245	EJIDO MOCHIS-EJIDO LOUISIANA-PLAN DE SAN LUIS	jun-18	sep-18	14.00	8.10	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
246	REHABILITACION DEL CAMINO CHOIX-TABUCAHUI	jun-18	sep-18	12.00	8.30	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
247	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. MEXICO 15-NIO-BAMOA PUEBLO	jun-18	sep-18	10.50	19.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
248	REHABILITACION DEL CAMINO CALLE CERO-ALFONSO G. CALDERON	jun-18	sep-18	10.50	12.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
249	REHABILITACION DEL CAMINO AHOME-TAXTES	jun-18	sep-18	10.00	10.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
250	REHABILITACION DEL CAMINO LIMONCITO-BACHIMETO	jun-18	sep-18	8.00	2.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
251	ACCESO A MALECON DE TOPOLOBAMPO	jun-18	sep-18	8.00	1.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
252	REHABILITACION DEL CAMINO MOCORITO-ROSAMORADA	jun-18	sep-18	6.50	5.00	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
253	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA LABOR	jun-18	sep-18	5.00	2.90	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
254	E.C. MÉXICO 15-LA ENSENADA- PAREDÓN COLORADO-LA PRESA	jul-18	oct-18	17.00	4.80	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
255	CONSERVACION GUASAVE, SINALOA, SALVADOR ALVARADO Y MOCORITO	abr-18	oct-18	9.73	247.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
256	CONSERVACION CULIACAN	abr-18	oct-18	9.21	128	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMI
257	CONSERVACION MAZATLAN, CONCORDIA Y ESCUINAPA	abr-18	oct-18	8.34	166.60	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
258	CONSERVACION ELOTA, COSALA, SAN IGNACIO	abr-18	oct-18	8.01	160.1	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMI

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
259	CONSERVACION AHOME, EL FUERTE, CHOIX	abr-18	oct-18	7.48	149.50	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
260	CONSERVACION BADIRAGUATO	abr-18	oct-18	5.87	117.30	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
261	CONSERVACION AHOME	abr-18	oct-18	4.70	93.90	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
263	LIBRAMIENTO FERROVIARIO CULIACAN	sep-18	dic-18	1,626.00	24.20	PROYECTADAS 2018	14093110018	PE	FERROVIARIO
266	MODERNIZACION DEL PUERTO DE MAZATLAN	oct-13	dic-18	1,768.57	DRAGADO Y REHABILITACIÓN DE	PROCESO 2018	2T0003 Y 1609J2	PNI661	PUERTOS
268	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LOS MOCHIS	ene-15	dic-18	29.50	AEROPUERTO	PROCESO 2018	VERSION PRIVA	---	AEROPUERTOS
269	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MAZATLAN	ago-16	dic-18	23.43	AEROPUERTO	PROCESO 2018	VERSION PRIVA	PNI005	AEROPUERTOS
270	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CULIACAN.	sep-18	dic-18	10.00	1 TANQUE	PROYECTADAS 2018	NO APLICA	PE	AEROPUERTOS
