



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT  
BAJA CALIFORNIA  
CIERRE DE JULIO 2018**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**AGOSTO 2018**





## SCT BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, AGOSTO 2018

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP

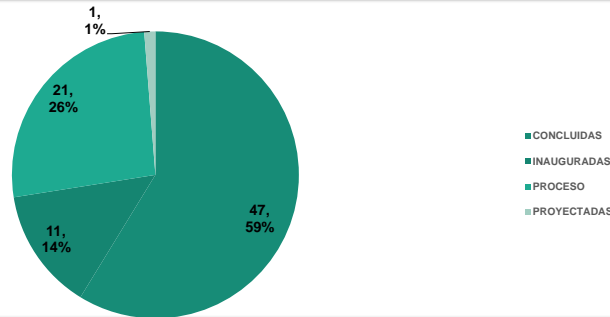

Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad:

80 9,771.2 11,540.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOISTAS</b>	<b>2</b>	<b>1,369.55</b>	<b>4.75</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	19.55	1.00	0
PROYECTADAS 2019-2020	1	1,350.00	3.75	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>22</b>	<b>2,892.49</b>	<b>169.26</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	11	1,006.77	49.92	0
INAUGURADAS 2013-2017	5	666.28	14.64	0
PROCESO 2018	6	1,219.44	104.70	0
<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>20</b>	<b>1,430.62</b>	<b>10,445.80</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	16	656.74	8,384.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	670.50	100.00	1
PROCESO 2018	3	103.38	1,961.80	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>2</b>	<b>37.55</b>	<b>4.00</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	17.59	2.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	19.96	2.00	0
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES</b>	<b>1</b>	<b>6.94</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
PROCESO 2018	1	6.94	-	0
<b>CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>22</b>	<b>178.39</b>	<b>891.40</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	14	102.55	891.40	0
PROCESO 2018	8	75.84	-	0
<b>FERROVIARIO</b>	<b>1</b>	<b>2,859.50</b>	<b>25.00</b>	<b>1</b>
PROCESO 2018	1	2,859.50	25.00	1
<b>PUERTOS</b>	<b>7</b>	<b>555.20</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	3	93.19	-	0
INAUGURADAS 2013-2017	3	86.55	-	0
PROCESO 2018	1	375.46	-	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>441.00</b>	<b>0.18</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	1	71.00	-	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	185.00	-	0
PROCESO 2018	1	185.00	0.18	0
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>9,771.24</b>	<b>11,540.39</b>	<b>2</b>

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOISTAS



43 CARRETERAS



24 CAMINOS RURALES



1 FERROVIARIO



7 PUERTOS



3 AEROPUERTOS

### AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	177.09	-	177.09
TELEVISIONES ENTREGADAS	63,942	0	63,942
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	3		3
BENEFICIARIOS TDT	66,484		66,484



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	186.36
INVERSIÓN PUNTOS MEXICO CONECTADO	32.79
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	153.57
SITOS CONTRATADOS	1,303

Programas





PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	29.93	32.55	28.30	16.87	14.20	121.84
BENEFICIARIOS PET	4,456	5,072	4,224	2,804	2,977	19,533
CAMINOS PET	0	0	120	55	55	120
JORNALES PAGADOS PET	340,523	340,181	278,789	127,593	127,593	1,214,679
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	4	5	5	5	5	5
LONGITUD PET	813	158	0	408	0	1,379



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	920,092	37%
HOGARES CON INTERNET	698,620	46%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,345,488	12%
USUARIOS DE INTERNET	2,444,339	39%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	177.09
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	121.84
MÉXICO CONECTADO	186.36

## ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS BAJA CALIFORNIA CON CIERRE A JULIO DE 2018

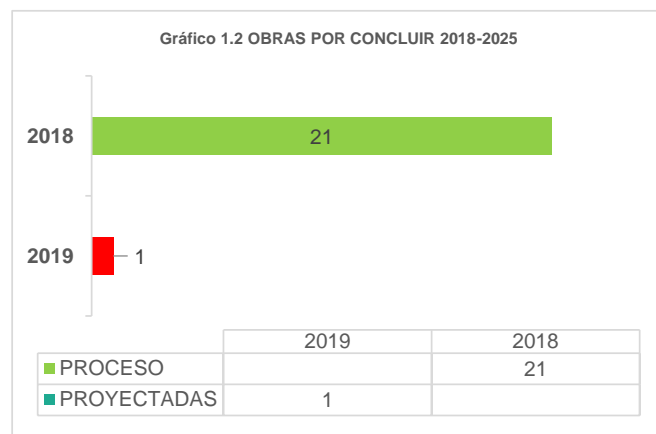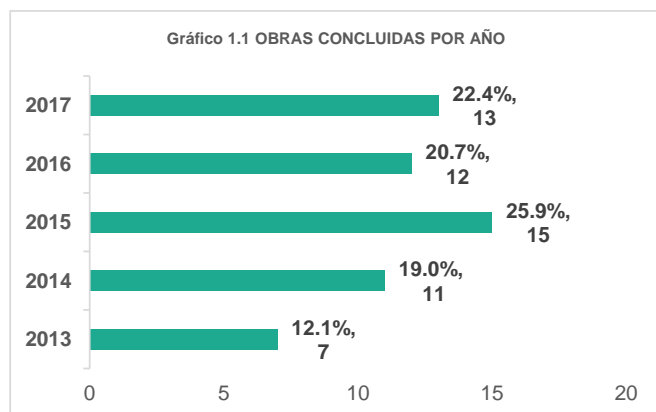

Tipo de Obra (Varios elementos)

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	1	19.55
CARRETERAS FEDERALES	33	3,000.29
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16	140.10
PUERTOS	6	179.74
AEROPUERTOS	2	256.00
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>3,595.68</b>

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	5	1,133.74
SECRETARIO	2	388.04
COORDINADOR GENERAL	1	27.11
SUBSECRETARIO	3	79.40
<b>Total general</b>	<b>11</b>	<b>1,628.29</b>

\*Estas obras están incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	58.75%	20.13%
INAUGURADAS	13.75%	16.66%
PROCESO	26.25%	49.39%
PROYECTADAS	1.25%	13.82%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se registra un total de 80 Obras con una inversión de 9,771.24

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
1	AMPLIACION CRUCE INTERNACIONAL PUERTA MEXICO/SAN ISIDRO EL CHAPARRAL	dic-14	abr-15	19.55	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	PNI141	AUTOPISTAS
2	CRUCE INTERNACIONAL OTAY II/OTAY EAST	ago-18	dic-19	1,350.00	3.75	PROYECTADAS 2019-2020	PNI478	AUTOPISTAS
3	MEXICALI – SAN FELIPE, TRAMO: EL FARO – SAN FELIPE, DEL KM 106+000 AL KM 111+000, INCLUYENDO 06 ESTRUCTURAS	jun-13	dic-13	108.50	5.00	CONCLUIDAS 2013-2017	PNI202	CARRETERAS FEDERALES
4	CARRETERA ENSENADA - LAZARO CARDENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNTA COLNETT DEL KM. 78+700 AL 87+258, INCLUYE PUENTE BUENOS AIRES EN EL KM 84+784,	feb-14	dic-14	102.30	8.50	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
5	LIBRAMIENTO DE ENSENADA (PRIMERA ETAPA (TERRACERIA)	feb-14	feb-15	139.40	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	PE	CARRETERAS FEDERALES
6	MEXICALI-LAGUNA CHAPALA TRAMO PUERTECITOS - LAGUNA CHAPALA SUBTRAMO DEL KM. 146+000 AL KM. 170+500. PUENTE KM. 158+055	oct-13	mar-15	236.60	24.50	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
7	MODERNIZACION DE LA CARRETERA: ENSENADA - LAZARO CARADENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNT COLONET	abr-15	nov-15	44.16	3.14	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
8	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	ago-15	dic-15	0.99	98 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
9	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL ENTRONQUE NODO PEMEX	abr-15	dic-15	51.40	1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA NODO PEMEX	feb-16	jun-17	74.63	6 CARRILES	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
11	LIBRAMIENTO ENSENADA (SUPRESION POR VIADUCTO DE 170 M) INCLUYE: E	abr-15	ago-17	189.77	1 VIADUCTO (2.1 KM)	CONCLUIDAS 2013-2	---	CARRETERAS FEDERALES
12	TRAMO 1 - MODERNIZACION: CARRETERA ESTATAL NO. 4 ESTATAL NO. 4, ENT	mar-17	oct-17	32.35	3.2	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
13	TRAMO 1 - MODERNIZACION: CARRETERA ESTATAL NO. 4 ESTATAL NO. 4, ENTRE PUENTE SAN FELIPITO Y ESTACION COAHUILA, KM. 28+980 AL KM. 31+500	mar-17	oct-17	26.67	3.48	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
14	SEGUNDO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA	ene-13	abr-15	203.04	0.228	INAUGURADAS 2013-2017	PE	CARRETERAS FEDERALES
15	CONSTRUCCION ENTRONQUE EL FARO KM38+600 CARRET. MEXICALI-SAN FELIPE	oct-14	may-15	75.70	0.71	INAUGURADAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
16	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS DEL KM 31	feb-14	may-15	140.40	1 PUENTE; 1 ENTRONQUE (4.6 KM)	INAUGURADAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
17	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS.	ago-14	ene-16	47.60	3 PUENTES	INAUGURADAS 2013-2017	---	CARRETERAS FEDERALES
18	TECATE - EL SAUZAL	feb-16	jun-17	199.54	13.7	INAUGURADAS 2013-2017	PE	CARRETERAS FEDERALES
19	CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES Y UN ENTRONQUE Y PAVIMETACION DEL KM 1	feb-16	jul-18	298.02	5 PUENTES (30.73 KM)	PROCESO 2018	PE	CARRETERAS FEDERALES
20	ENSENADA - PUNTA COLONET	ene-13	dic-18	529.48	68	PROCESO 2018	PE	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
21	CONSTRUCCION DE 4 PUENTES: LAS ARRASTRAS II Y LAS ARRASTRAS III, CARR: MEXICALI - LAGUNA CHAPAL	abr-15	dic-18	229.58	30.70	PROCESO 2018	---	CARRETERAS FEDERALES
22	MODERNIZACIÓN DE 7 A 12 M DE ANCHO DE CORONA DE LA CARRETERA ENS	mar-18	dic-18	70.93	6	PROCESO 2018	---	CARRETERAS FEDERALES
23	CARRETERA SAN FELIPE - PUERTECITOS, TRAMO POBLADO EJIDO DELICIAS - CAMPO LOS OLIVOS DEL KM 60+000 AL KM 68+600 INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 5 PUENTES	mar-18	dic-18	60.84	5 PUENTES	PROCESO 2018	---	CARRETERAS FEDERALES
24	CARRETERA SAN FELIPE - PUERTECITOS TRAMO CAMPO LOS OLIVOS - PUERTECITOS, DEL KM 68 AL 74, INCLUYE 2 PUENTES	mar-18	dic-18	30.59	2 PUENTES (5.6 KM)	PROCESO 2018	---	CARRETERAS FEDERALES
25	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	mar-15	dic-15	65.61	1842.1	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
26	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ago-15	dic-15	14.59	819	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
27	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ago-15	dic-15	3.17	1,818.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
28	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	sep-15	dic-15	105.06	55.80	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
29	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	abr-16	ago-16	75.13	19	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	mar-16	sep-16	36.76	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
31	SEÑALAMIENTO VERTICAL	mar-16	sep-16	27.18	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
32	BARRERA DE PROTECCION	mar-16	sep-16	15.08	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	RUTINARIA DE PUENTES	abr-16	oct-16	2.60	208 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
34	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	abr-16	dic-16	81.95	1,842.10	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	BARRERA DE PROTECCION	abr-17	sep-17	16.69	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	feb-17	sep-17	13.98	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	BARRERA DE PROTECCION	may-17	oct-17	14.87	8.80	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
38	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-17	oct-17	2.59	213 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
39	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-17	dic-17	97.92	1,873.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
40	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	abr-17	dic-17	83.56	106.20	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
41	CG-124 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TIJUANA - ROSARITO - TECATE,	jun-14	mar-16	670.50	100.00	INAUGURADAS 2013-2017	PNI328	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
42	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	may-18	sep-18	52.76	88.40	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
43	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2018	feb-18	dic-18	49.50	1,873.40	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-18	dic-18	1.12	PUENTES	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	RECONSTRUCCION DE PUENTES 2018	jul-18	dic-18	6.94	1 PUENTE	PROCESO 2018	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
46	EL CONDOR - JOSE MA. PINO SUAREZ	feb-14	sep-14	17.59	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
47	ECF 3 - CARMEN SERDAN	feb-14	sep-14	19.96	2.00	INAUGURADAS 2013-2017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
48	PAQUETE DE DIEZ (10) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y A	may-15	oct-15	6.50	114.367	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
49	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	jun-15	nov-15	8.08	150.85	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
50	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	may-15	mar-16	5.68	86.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES



**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
51	PAQUETE DE DOS (2) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	may-15	mar-16	7.95	46.18	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
52	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS	may-15	mar-16	7.00	154.8	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
53	PAQUETE 1 (UNO) OBRA DE CONSERVACION DE CARRETERA ALIMENTADORAS	sep-15	mar-16	3.49	1.9	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
54	PAQUETE III OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	7.12	238.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
55	PAQUETE II OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	3.07	42.00	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
56	PAQUETE I OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	feb-16	ago-16	3.01	44.8	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
57	PAQUETE II - CINCO (5) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	feb-17	sep-17	6.50	5 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
58	PAQUETE III - CINCO (5) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	sep-17	6.49	5 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
59	PAQUETE I - TRES (3) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	feb-17	sep-17	6.48	3 CARRETERAS	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
60	PAQUETE IV - (UNA) OBRA DE CONSERVACION DE CARRETERA ALIMENTADORAS	mar-17	oct-17	7.03	2.5	CONCLUIDAS 2013-2017	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
61	VALLE CHICO - RECONSTRUCCION: KM. 181.1 CARRETERA (MEXICALI - SAN FE	jul-17	dic-17	24.15	10	CONCLUIDAS 2013-2	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	CAMINO DR. ALBERTO OVIEDO MOTA (INDIVISO) - SOMBRERETE	jun-18	sep-18	2.31	5 PUENTES	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	PAQUETE LV - DOS (2) OBRAS DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE C	mar-18	sep-18	16.96	2 OBRAS	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	KM. 1.42 CAMINO (SAN JOSÉ DE LA ZORRA) - CAÑADA DEL TRIGO	jun-18	oct-18	6.17	---	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	PAQUETE L - CUATRO (4) OBRAS DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	mar-18	oct-18	14.62	4 OBRAS	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	PAQUETE LL - TRES (3) OBRAS DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE C	mar-18	oct-18	8.52	3 OBRAS	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
67	KM. 88.2 CARRETERA (TECATE - ENSENADA) - EL PORVENIR	may-18	nov-18	9.71	---	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	KM. 29.0 CARRETERA (TECATE - ENSENADA) - VALLE DE LAS PALMAS - UNIVERSIDAD	jun-18	dic-18	8.75	---	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	KM. 29.0 CARRETERA (TECATE - ENSENADA) - VALLE DE LAS PALMAS - UNIVERSIDAD	jun-18	dic-18	8.80	---	PROCESO 2018	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	CG-123 ESTABLECER, JUNTO CON EL GOBIERNO ESTATAL, UN SISTEMA DE TRANSPORTE ARTICULADO BRT	ago-13	ago-18	2,859.50	25.00	PROCESO 2018	PNI527	FERROVIARIO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	PNI Publicado	Sector
71	AMPLIACION MUELLE DE CABOTAJE EN EL PUERTO DE ENSENADA	dic-11	mar-13	23.13	1,000 m <sup>2</sup>	CONCLUIDAS 2013-2017	---	PUERTOS
72	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2 (3RA ETAPA)	dic-14	dic-15	39.71	9500m <sup>2</sup>	CONCLUIDAS 2013-2017	---	PUERTOS
73	MODERNIZACION DEL MALECON	nov-15	dic-15	30.35	MALECON	CONCLUIDAS 2013-2017	---	PUERTOS
74	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2 DEL PUERTO ENSENADA	nov-12	sep-13	37.60	10,000m <sup>2</sup>	INAUGURADAS 2013-2017	---	PUERTOS
75	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2 (2DA ETAPA)	nov-13	dic-14	21.84	9500m <sup>2</sup>	INAUGURADAS 2013-2017	---	PUERTOS
76	MODERNIZACION MALECON	oct-14	abr-15	27.11	MALECON	INAUGURADAS 2013-2017	---	PUERTOS
77	ESTRUCTURAS DE PROTECCION	dic-15	ago-18	375.46	ROMPEOLAS	PROCESO 2018	---	PUERTOS
78	AMPLIACION DE EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO DE MEXICALI	ene-16	dic-17	71.00	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	---	AEROPUERTOS
79	PUERTA DE LAS CALIFORNIAS. CRUCE FRONTERIZO EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA	jul-13	nov-15	185.00	CRUCE FRONTERIZO	INAUGURADAS 2013-2017	---	AEROPUERTOS
80	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TIJUANA	jul-13	dic-18	185.00	0.18	PROCESO 2018	PNI094	AEROPUERTOS
