



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT  
SAN LUIS POTOSÍ  
CIERRE DE AGOSTO 2018**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**


**SEPTIEMBRE 2018**



## SCT SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, SEPTIEMBRE 2018

### ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

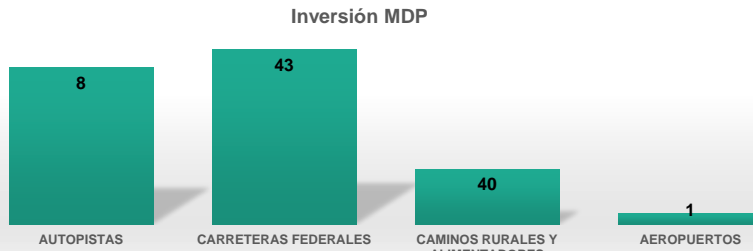

### ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS



Obras MDP Km

A la fecha, la SCT  
invierte en la Entidad:

92 10,710.8 15,828.3

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>8</b>	<b>4,212.52</b>	<b>1,109.70</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	2	672.77	43.00	0
INAUGURADAS 2013-2017	5	3,439.75	1,063.40	0
PROCESO 2018	1	100.00	3.30	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>20</b>	<b>4,116.47</b>	<b>1,819.50</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	10	1,890.78	1,541.34	0
CONCLUIDAS 2018	4	73.83	19.20	0
INAUGURADAS 2013-2017	4	1,780.30	252.30	1
PROCESO 2018	2	371.56	6.66	0
<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>19</b>	<b>563.84</b>	<b>8,769.29</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	13	399.15	6,715.45	0
CONCLUIDAS 2018	1	4.00	-	0
PROCESO 2018	5	160.69	2,053.84	0
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES</b>	<b>4</b>	<b>36.72</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	3	32.70	-	0
PROCESO 2018	1	4.02	-	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>37</b>	<b>609.55</b>	<b>3,157.12</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	36	603.35	3,155.80	0
CONCLUIDAS 2018	1	6.20	1.32	0
<b>CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>3</b>	<b>874.54</b>	<b>972.67</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2017	2	726.77	813.54	0
PROCESO 2018	1	147.77	159.13	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>297.20</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
PROCESO 2018	1	297.20	-	0
<b>Total general</b>	<b>92</b>	<b>10,710.84</b>	<b>15,828.28</b>	<b>1</b>

### AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	790.02	-	790.02
TELEVISIONES ENTREGADAS	285,340	-	285,340
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	58	-	58
BENEFICIARIOS TDT	289,022	-	289,022



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MÉXICO CONECTADO	214.08
INVERSIÓN PUNTOS MÉXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MÉXICO CONECTADO	164.78
SITIOS CONTRATADOS	1,624

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL</b>						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	58.33	57.88	58.20	41.26	38.70	254.36
BENEFICIARIOS PET	16,264	15,075	17,690	9,253	9,417	67,699
CAMINOS PET	0	0	313	245	245	313
JORNALES PAGADOS PET	739,439	630,849	573,497	374,322	374,322	2,692,429
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	52	0	58	51	51	58
LONGITUD PET	1,544	1,255	-	957	0	3,756



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	652,624	105%
HOGARES CON INTERNET	378,980	95%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	1,269,873	32%
USUARIOS DE INTERNET	1,335,486	62%

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	790.02
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	254.36
MÉXICO CONECTADO	214.08



Fecha de recepción: Lunes 10 de septiembre de 2018, mediante Oficio No.: 6.23.1.014/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/461/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

SEPTIEMBRE 2018

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS  
SAN LUIS POTOSÍ CON CIERRE A AGOSTO DE 2018

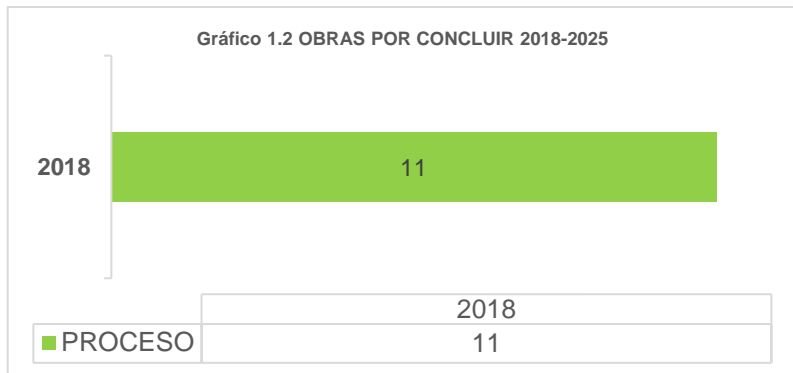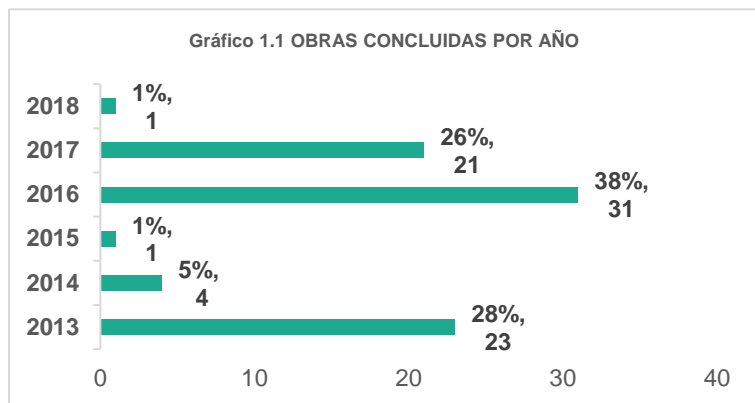

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
AUTOPISTAS	7	4,112.52
CARRETERAS FEDERALES	35	4,180.76
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	39	1,336.32
<b>Total general</b>	<b>81</b>	<b>9,629.60</b>

Cuadro 1.1 OBRAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	7	4,631.45
SECRETARIO	2	588.60
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>5,220.05</b>

\*Estas obras estan incluidas en el gráfico de obras concluidas por año

Cuadro 1.2 AVANCE EN NÚMERO DE OBRAS E INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	78.26%	41.17%
INAUGURADAS	9.78%	48.74%
PROCESO	11.96%	10.09%
<b>Total general</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se registra un total de 92 Obras con una inversión de 10,710.84

Fecha de recepción: Lunes 10 de septiembre de 2018, mediante Oficio No.: 6.23.1.014/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/461/2018 enviado por la DGAPDCST.

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-EBANO	ago-11	abr-13	606.20	40.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096440014	PNI454	AUTOPISTAS
2	CIUDAD VALLE -TAMPICO ENT. LIB. TAMUIN-PANUCO	abr-17	oct-17	66.57	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	10096440014	---	AUTOPISTAS
3	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-TAMPICO	jun-11	sep-13	557.00	946.00	INAUGURADAS 2013-2017	10096440014	PNI454	AUTOPISTAS
4	RIOVERDE-CIUDAD VALLES (PPS)	ago-08	sep-13	182.00	13.00	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI171	AUTOPISTAS
5	LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE SAN LUIS POTOSI	jun-11	may-14	1,166.00	31.2	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PNI305	AUTOPISTAS
6	AUTOPISTA CIUDAD VALLES - TAMUIN	nov-11	jun-16	3.05	49.1	INAUGURADAS 2013-2017	08096440011	PNI535	AUTOPISTAS
7	LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI	oct-14	ene-17	1,531.70	24.10	INAUGURADAS 2013-2017	N/A	PE	AUTOPISTAS
8	PROYECTO CD. VALLES-TAMPICO TR: LIB. TAMUIN-EN	mar-18	sep-18	100.00	3.3	PROCESO 2018	10096440014	---	AUTOPISTAS
9	MODERNIZACION DEL CAMINO ALAQUINES - NVA. REFORMA	mar-13	sep-13	8.68	21.90	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440002	---	CARRETERAS FEDERALES
10	BOULEVARD VALLES - TAMPICO	oct-11	sep-14	52.98	2.04	CONCLUIDAS 2013-2017	12096440009	---	CARRETERAS FEDERALES
11	TANLAJAS-SAN ANTONIO-EL PUENTE	abr-16	dic-16	8.44	3.1	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440007	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	SAN CIRO DEACOSTA-CORRAL QUEMADO	feb-16	dic-16	1.00	0.10	CONCLUIDAS 2013-2017	10096440011	---	CARRETERAS FEDERALES
13	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CAR	ene-16	dic-16	125.39	754.54	CONCLUIDAS 2013-2017	10092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
14	DAMIAN CARMONA- EL AGUACATE	mar-17	jun-17	9.59	1	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440027	---	CARRETERAS FEDERALES
15	PRESA VERDE - GALLOS BLANCOS	mar-17	jun-17	4.70	0.88	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440023	---	CARRETERAS FEDERALES
16	CD. VALLES-CHANTOL-LAS HUERTAS	mar-17	jul-17	8.82	2.24	CONCLUIDAS 2013-2017	08096440004	---	CARRETERAS FEDERALES
17	EC. QUINTA CHILLA-TAMACOL	jun-17	jul-17	5.40	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440025	---	CARRETERAS FEDERALES
18	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS (CPCC) 2017	ago-10	oct-17	1,665.78	754.54	CONCLUIDAS 2013-2017	10092110001	---	CARRETERAS FEDERALES
19	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES-BUENAVISTA	nov-17	ene-18	3.95	8.70	CONCLUIDAS 2018	17096440005	---	CARRETERAS FEDERALES
20	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "ARROYO GDE. UBICADO EN EL CAMINO EL BLANCO-LOS NAZARIOS	oct-17	ene-18	3.90	1 PUENTE	CONCLUIDAS 2018	15096440001	---	CARRETERAS FEDERALES
21	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SAN CIRO DE ACOSTA-EL AGUACATE	nov-17	feb-18	15.98	4.50	CONCLUIDAS 2018	10096440011	---	CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
22	MODERNIZACIÓN DE LA CARR. CARBONERA-T.C. (ENT. MORELOS-SALTILLO)	dic-17	jun-18	50.00	6.00	CONCLUIDAS 2018	17096440004	---	CARRETERAS FEDERALES
23	MODERNIZACION TR 1 RIO VERDE-RAYON TR 2 RAYON	ago-08	sep-13	182.00	36.6	INAUGURADAS 2013-2017	0	---	CARRETERAS FEDERALES
24	CG-049 ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EN SUS TRAMOS NORTE Y PONIENTE.	may-13	feb-15	1,009.70	194.00	INAUGURADAS 2013-2017	12096440010	PNI463	CARRETERAS FEDERALES
25	LIBRAMIENTO VILLA DE REYES	jul-10	jul-16	338.00	8.70	INAUGURADAS 2013-2017	10096440008	---	CARRETERAS FEDERALES
26	BOULEVARD SAN LUIS - CARR. 57 SLP-QRO.	jun-16	jul-17	250.60	13.00	INAUGURADAS 2013-2017	11096440003	---	CARRETERAS FEDERALES
27	MODERNIZACIÓN CARR FED. MEX 85 PORTEZUELO - C	mar-18	sep-18	267.60	4.3	PROCESO 2018	17096440002	---	CARRETERAS FEDERALES
28	BLVD.SAN LUIS-CARR 57 (SLP-QRO) PEF 2018	mar-18	oct-18	103.96	2.36	PROCESO 2018	11096440003	---	CARRETERAS FEDERALES
29	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	mar-16	ago-16	25.50	1,345.03	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
30	SEÑALAMIENTO VERTICAL	jun-16	ago-16	8.17	3,266 PIEZAS	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
31	BARRERA DE PROTECCION	jun-16	sep-16	10.09	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
32	BARRERA DE PROTECCION	jun-16	sep-16	10.07	BARRERA DE PROTECCION	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
33	CONSERVACION PERIODICA	feb-16	oct-16	98.35	55.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
34	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	feb-16	dic-16	3.19	137 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
35	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	feb-16	dic-16	59.17	1,280.80	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
36	BARRERA DE PROTECCIÓN 2017	abr-17	jul-17	4.00	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
37	CONSERVACION PERIODICA 2017	mar-17	ago-17	77.98	48.40	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
38	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2017	feb-17	oct-17	64.29	1,236.88	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
39	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2017	feb-17	oct-17	5.20	1,374.67	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110001	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
40	SEÑALAMIENTO VERTICAL 2017	feb-17	oct-17	3.00	857 PZAS.	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
41	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 2017	feb-17	dic-17	30.14	1,374.67	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
42	BARRERA DE PROTECCION 2018	may-18	ago-18	4.00	BARRERA	CONCLUIDAS 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
43	CONSERVACION PERIODICA 2018	mar-18	oct-18	61.60	51.3	PROCESO 2018	17092110007	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
44	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 2018	may-18	oct-18	25.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
45	SEÑALAMIENTO VERTICAL 2018	may-18	nov-18	3.00	SEÑALAMIENTOS	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
46	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS 2018	mar-18	dic-18	66.09	2,002.54	PROCESO 2018	17092110004	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
47	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2018	mar-18	dic-18	5.00	PUENTES	PROCESO 2018	17092110005	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
48	CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES	jun-16	sep-16	1.97	3 PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
49	RECONSTRUCCION DE PUENTES	may-16	dic-16	21.73	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110005	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
50	RECONSTRUCCION DE PUENTES 2017	mar-17	sep-17	9.00	PUENTES	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
51	CONSERVACIÓN PERIODICA DE PUENTES 2018	jun-18	oct-18	4.02	---	PROCESO 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES



**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
52	MATEHUALA - CIUDAD VICTORIA	feb-09	nov-09	53.40	2,913.00	CONCLUIDAS 2013-2017	08096440010	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
53	LOS ANGELES - MARAVILLAS Y RAMAL A NORIA DE LOS CONOS.	mar-12	jul-13	15.74	5.10	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
54	LA PROVIDENCIA - LLANO GRANDE	abr-13	jul-13	4.46	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
55	CAÑAS-IGNACIO ALLENDE (PUENTE)	abr-13	ago-13	5.99	0.066	CONCLUIDAS 2013-2017	09096440006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
56	SAN JOSE DEL GRITO- LAS CRUCES - YOLIAT - SAN FRANCISCO	may-07	oct-13	126.30	93.70	CONCLUIDAS 2013-2017	06096440021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
57	SANTA ANITA -PALO DE ARCO-TANCHACHIN	may-10	oct-13	43.62	15.60	CONCLUIDAS 2013-2017	10096440001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
58	CONSTRUCCION DEL PUENTE TONATICO.	ago-13	nov-13	8.32	0.04	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
59	TAPONA - POCITOS - PEYOTE	mar-12	dic-13	15.72	6.3	CONCLUIDAS 2013-2017	12096440006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
60	LAS CRUCES - LIMITES DE LOS ESTADOS SLP - ZAC.	jul-13	may-14	10.88	4.5	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	E.C.F. MEXICO NO. 57- EL JARALITO, TRAMO TEXAS- E	mar-14	jun-14	5.70	1.56	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440026	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
62	PUENTE VEHICULAR PUENTE LA MAROMA	mar-14	jul-14	3.19	0.02	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	RAMAL A REAL DE CATORCE; TR: KM. 0+000 AL KM. 21+000.	abr-13	jul-14	10.40	21.00	CONCLUIDAS 2013-2017	12096440018	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	VENADO - EL EPAZOTE	abr-13	ago-14	46.07	20.10	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	PUENTE: VEHICULAR EN ARROYO XOCHITITLA	abr-14	sep-14	0.98	0.09	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	BOULEVARD EN LA CARRETERA VALLES 85	dic-11	dic-14	39.20	1.66	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
67	EL CHILARES - LA MAROMA (SAN LUIS POTOSI APOYO A CONAGUA CG 052 PRESA LA MAROMA)	jul-15	ago-16	24.80	21.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440013	PE	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	CONST. PUENTE E.C.(RIO VERDE-SLP) -LA MEDIA LUNA, TRAMO:E C 70	may-16	dic-16	18.42	PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	MORELOS-JUAN SARABIA-EL BOZAL-LAVICTORIA-LA M	mar-16	dic-16	12.94	4.4	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	LOS CARRIZOS-COXCATLAN-AXTLA	jul-16	dic-16	12.70	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT  
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
71	LA CUESTA-TANCANHUITZ	feb-16	dic-16	11.76	2.12	CONCLUIDAS 2013-2017	15096440003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	TANCANHUITZ-HUEHUETLAN	feb-16	dic-16	11.54	2.60	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO WADLEY SAN JOSE DE CORONADOS	feb-16	dic-16	11.48	2.10	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTACION	feb-16	dic-16	10.82	3.04	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	LA ESPERANZA-SANTA ELENA	feb-16	dic-16	10.61	3.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	AQUISMÓN-XOLMON-UNIÓN DE GUADALUPE	feb-16	dic-16	9.83	2.9	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	EST. MOCTEZUMA-MATANZAS	feb-16	dic-16	9.58	3.01	CONCLUIDAS 2013-2017	14096440002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
78	RAMAL SAN SEBASTIÁN	feb-16	dic-16	9.49	3.42	CONCLUIDAS 2013-2017	15096440006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	SAN CIRO DE ACOSTA-VAQUEROS-E.C. 70 (RAMAL LA LUZ)	feb-16	dic-16	6.69	2.04	CONCLUIDAS 2013-2017	07096440001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	EL HERRERO-LA LUZ	feb-16	dic-16	5.40	1.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096440001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	E.C. 57-SAN FRANCISCO	feb-16	dic-16	5.29	1.36	CONCLUIDAS 2013-2017	10096440013	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	MODERNIZACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CERRITOS-SAN JOSE DE TURRUBIARTES-LAS POZAS-RINCONADA	abr-16	dic-16	5.20	1.90	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

**COORDINACION GENERAL DE CENTROS SCT**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT**  
**SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**

MES DE DIFUSIÓN: SEPTIEMBRE DE 2018



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: AGOSTO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Meta (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
83	VALLE DE SAN JUAN-RINCÓN DEL REFUGIO	feb-16	dic-16	4.22	0.87	CONCLUIDAS 2013-2017	12096440004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
84	MAGDALENO CEDILLO-ZAMACHIHUE	mar-17	jul-17	9.60	4.20	CONCLUIDAS 2013-2017	16096440002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
85	AGUA ZARCA-PAPAGAYOS	mar-17	jul-17	9.58	3.40	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440021	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
86	CAMINO TLALETLA-PILATENO, EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	mar-17	jul-17	7.93	2.00	CONCLUIDAS 2013-2017	15096440004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
87	SAN FRANCISCO-CERRO GRANDE-XINICTLE	jun-16	jul-17	5.50	3.80	CONCLUIDAS 2013-2017	13096440017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
88	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EC. 57 - NORIA DE LOS CASTILLO	oct-17	ene-18	6.20	1.32	CONCLUIDAS 2018	17096440001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
89	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS 2017	feb-16	dic-17	367.57	375.4	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
90	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS 2017	feb-17	dic-17	359.20	438.14	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
91	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2018	mar-18	nov-18	147.77	159.13	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
92	MODERNIZACION AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI	dic-16	dic-18	297.20	1 TERMINAL	PROCESO 2018	N/A	PNI003	AEROPUERTOS
