



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT
CHIAPAS**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

SEPTIEMBRE 2018




SCT CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, SEPTIEMBRE 2018

Infraestructura de Comunicaciones y transportes


ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

- 1 AUTOPISTAS
- 26 CARRETERAS
- 55 CAMINOS RURALES



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

- 0 FERROVIARIO
- 9 PUERTOS
- 2 AEROPUERTOS

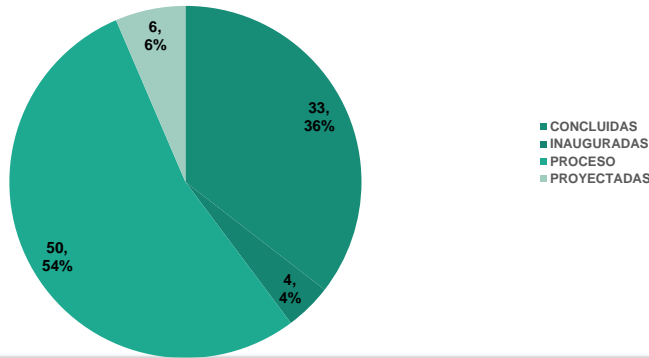

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **93** Obras, **17,808.7** MDP, **29,127.6** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	3,094.50	178	0
PROCESO 2018	1	3,094.50	178	0
CARRETERAS FEDERALES	20	6,294.77	865.531	4
CONCLUIDAS 2013-2017	6	826.10	73.271	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	490.20	172	1
PROCESO 2018	6	3,637.97	521.3	2
PROCESO 2019-2027	3	386.50	3.96	0
PROYECTADAS 2018	1	450.00	11	0
PROYECTADAS 2019-2020	3	504.00	84	0
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	4	1,557.34	4918.76	2
CONCLUIDAS 2013-2017	2	812.69	4758.36	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	254.65	86.4	1
PROCESO 2018	1	490.00	74	1
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	2	510.95	4745.83	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	255.95	2377.18	0
PROCESO 2018	1	255.00	2368.65	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	50	3,426.16	16454.68	0
CONCLUIDAS 2013-2017	14	474.30	1118.8	0
PROCESO 2018	33	2,438.27	12838.18	0
PROCESO 2019-2027	3	513.59	2497.7	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5	1,137.05	1962.1	1
CONCLUIDAS 2013-2017	3	593.65	1633.9	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	391.40	70	1
PROCESO 2018	1	152.00	258.2	0
PUERTOS	9	512.94	0.16	0
CONCLUIDAS 2013-2017	6	427.70	0.16	0
PROCESO 2018	1	40.00	0	0
PROYECTADAS 2018	2	45.24	0	0
AEROPUERTOS	2	1,275.02	2.5	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	6.02	0	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	1,269.00	2.5	0
Total general	93	17,808.73	29,127.56	7

AVANCE EN PROGRAMAS

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	1,917.95	11.85	1,929.80
TELEVISIONES ENTREGADAS	696,715	3,972	696,715
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	116		116
BENEFICIARIOS TDT	730,299		730,299



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	448.39
INVERSIÓN PUNTOS MEXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO CONECTADO	399.09
SITIOS CONTRATADOS	4,333

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PET	101.42	53.98	97.50	58.69	49.80	361.39
BENEFICIARIOS PET	21,385	20,805	21,837	13,374	124,448	201,849
CAMINOS PET	0	0	397	267	267	397
JORNALES PAGADOS PET	1,147,950	1,044,069	960,774	457,691	457,691	4,068,175
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	86	0	118	70	70	118
LONGITUD PET	2,600	1,912	0	1,146	0	5,658



DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON INTERNET	173,486	13%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,115,336	21%
USUARIOS DE INTERNET	1,540,909	45%



Fecha de recepción: Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante Oficio No.: SCT-707-1.11.089/2018 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/443/2018 enviado por la DGAPDCST.

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	1,929.80
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	361.39
MÉXICO CONECTADO	448.39

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

SEPTIEMBRE 2018

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
CHIAPAS CON CIERRE A AGOSTO DE 2018

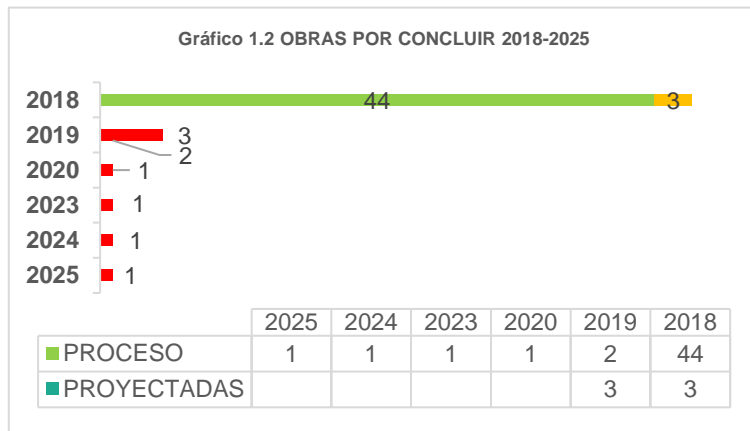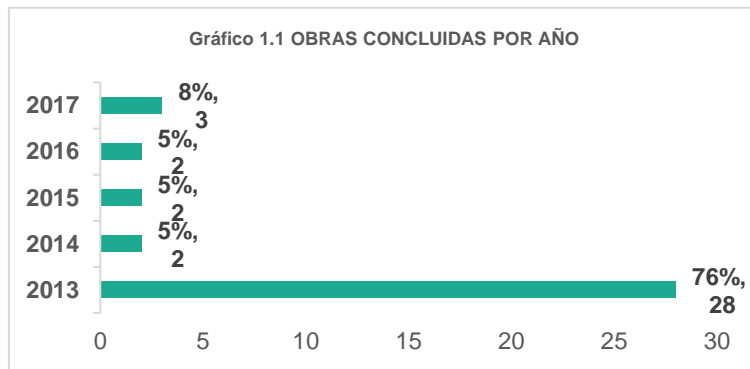

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	18	1,459.35
CARRETERAS FEDERALES	11	2,639.59
PUERTOS	6	427.70
AEROPUERTOS	2	1,275.02
Total general	37	5,801.66

Cuadro 1.1 OBRAS CONCLUIDAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	1	1,269.00
SECRETARIO	1	490.20
COORDINADOR GENERAL	2	646.05
Total general	4	2,405.25

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
CONCLUIDAS	35.48%	19.07%
INAUGURADAS	4.30%	13.51%
PROCESO	53.76%	61.81%
PROYECTADAS	6.45%	5.61%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 93 Obras con una inversión de 17,808.73

Fecha de recepción: Jueves 6 de septiembre de 2018 , mediante Oficio No.: SCT-707-1.11.089/2018 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Jueves 6 de septiembre de 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/443/2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (PRIMERA ETAPA)	abr-16	dic-18	3,094.50	178.00	PROCESO 2018	15096270004	PNI656	AUTOPISTAS
2	LA TRINITARIA - PAV. DEL CAMINO JOSE MARIA MORELOS	ago-10	nov-13	27.07	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270010	---	CARRETERAS FEDERALES
3	PUENTE VEHICULAR, EJIDO LEON BRINDIS, MAPASTEPEC.	oct-13	mar-14	10.11	0.05	CONCLUIDAS 2013-2017	13096270006	---	CARRETERAS FEDERALES
4	COAPA - CENICEROS, MUNICIPIO PIJJIAPAN	oct-09	jun-14	34.72	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	09096270011	---	CARRETERAS FEDERALES
5	PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA MARTHA	mar-14	dic-14	9.35	0.02	CONCLUIDAS 2013-2017	14096270035	---	CARRETERAS FEDERALES
6	GALILEA DOS LAGUNAS, RAMAL A YASHLUMILJA	ago-11	dic-14	24.85	11.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270023	---	CARRETERAS FEDERALES
7	CG-233 MODERNIZAR LA CARRETERA RANCHO NUEVO - COMITÁN, TRAMO: TEOPISCA - COMITÁN	may-11	ene-17	720.00	45.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270019	---	CARRETERAS FEDERALES
8	CG-113 MODERNIZAR LOS LIBRAMIENTOS NORTE Y SUR DE TUXTLA GUTIERREZ	nov-13	feb-15	490.20	172.00	INAUGURADAS 2013-2017	13096270009	PNI274	CARRETERAS FEDERALES
9	CRUCERO TONINA-CRUCERO MONTELIBANO	feb-13	dic-18	347.55	58.00	PROCESO 2018	07096270003	---	CARRETERAS FEDERALES
10	CG-234 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, PRIMERA ETAPA	sep-10	dic-18	1,500.00	35.50	PROCESO 2018	06096270013	---	CARRETERAS FEDERALES
11	RIZO DE ORO-LA CONCORDIA 2 PUENTES	nov-14	dic-18	669.91	2 PUENTES	PROCESO 2018	11096270038	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
12	CG-008 MODERNIZACION CARRETERA A LA FRONTERA DESDE COMITAN	oct-13	dic-18	482.00	400.00	PROCESO 2018	13096270008	PNI339	CARRETERAS FEDERALES
13	PALENQUE-CATAZAJA.	abr-15	dic-18	450.00	26.80	PROCESO 2018	14096270033	---	CARRETERAS FEDERALES
14	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR: SAN QUINTÍN - SANTA MARTHA COROZAL	may-17	dic-18	188.51	1.00	PROCESO 2018	11096270037	---	CARRETERAS FEDERALES
15	SABANILLA - MOYOS	jun-07	dic-19	114.34	0.70	PROCESO 2019-2027	07096270002	---	CARRETERAS FEDERALES
16	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR SANTA MARTHA COROZAL - RÓMULO CALZADA	may-17	dic-23	142.99	0.96	PROCESO 2019-2027	11096270045	---	CARRETERAS FEDERALES
17	MONTE LIBANO – SAN JOSE	feb-10	dic-24	129.17	2.30	PROCESO 2019-2027	09096270016	---	CARRETERAS FEDERALES
18	MODERNIZAR LA CARRETERA QUE VA DE COATZACOALCOS A TUXTLA GUTIERREZ	dic-18	dic-18	450.00	11.00	PROYECTADAS 2018	06096470005	PNI259PNI330	CARRETERAS FEDERALES
19	POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA	ene-19	dic-19	174.00	29.00	PROYECTADAS 2019-2020	11096270051	---	CARRETERAS FEDERALES
20	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: NUEVO HUIXTÁN - BÉLGICA	ene-19	dic-19	186.00	31.00	PROYECTADAS 2019-2020	11096270043	---	CARRETERAS FEDERALES
21	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: BÉLGICA - NUEVO MOMÓN	ene-19	dic-19	144.00	24.00	PROYECTADAS 2019-2020	11096270040	---	CARRETERAS FEDERALES
22	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES (40 OBRAS)	mar-15	dic-15	352.81	2381.18	CONCLUIDAS 2013-2017	003; 14092110004; 14	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
23	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES	feb-16	dic-16	459.88	2,377.18	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004; 15092110005; 15092110006; 15092110007; 15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
24	CG-237, REHABILITAR LA CARRETERA MOTOZINTLA - TAPACHULA	ago-13	dic-13	254.65	86.40	INAUGURADAS 2013-2017	12092110016	PNI192	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
25	CG-111 MODERNIZAR LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - VILLAFLORES, PRIMERA ETAPA.	ene-17	dic-18	490.00	74.00	PROCESO 2018	44359	PNI394	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
26	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017	feb-17	dic-17	255.95	2,377.18	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
27	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018	feb-18	dic-18	255.00	2,368.65	PROCESO 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
28	E.C. ARRIAGA - TONALA - EL TERRERO - OTOTAL	jun-07	dic-08	17.51	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
29	E.C. (LARRAINZAR MITONTIC) ICALUMTIC	jul-11	nov-13	26.77	5.58	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
30	NUEVO PUENTE - IXTAPILLA - NUEVO TEPEYAC	jun-12	nov-13	27.08	7.42	CONCLUIDAS 2013-2017	12096270010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
31	EMILIANO ZAPATA CINTALAPA.	abr-12	nov-13	19.22	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
32	E.C. HUITIUPAN-SIMOJOVEL-EL OCOTAL.	jun-12	nov-13	14.35	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	08096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
33	E.C. ARRIAGA - TONALA - OTOTAL (RAMAL GALEANA CALENTURA)	abr-12	jun-14	21.65	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
34	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	may-07	jul-14	74.49	13.50	CONCLUIDAS 2013-2017	06096270008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
35	HERMENEGILDO GALEANA LAS DELICIAS	sep-10	sep-14	83.60	26.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
36	E.C.E. CHIAPAS NO. 230 CUAUHTEMOC	jun-11	sep-14	35.14	9.21	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
37	E.C. (VILLAFLORES -OCOZOCOAUTLA) - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	jun-12	sep-14	17.05	4.6	CONCLUIDAS 2013-2017	12096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	BOCHIL LUIS ESPINOZA.	jun-11	sep-14	50.08	20.25	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	TRES PUENTES BAYALEMO DOS.	jun-11	sep-14	23.74	3.2	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	PASO DEL SOLDADO - OJO DE AGUA.	jun-12	sep-14	21.33	6.04	CONCLUIDAS 2013-2017	13096270005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	EL PINAR - E.C. TENEJAPA, TR: KM. 0 + 000 AL 9 + 897.9	jun-11	dic-14	42.29	990.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
42	SAN ISIDRO – ISLA SAN JOSE	mar-12	nov-18	74.56	15.00	PROCESO 2018	11096270057	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	E.C. (TUXTLA-VILLAFLORES)-ROBLADA GRANDE	mar-14	nov-18	4.32	11.00	PROCESO 2018	12096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	PUEBLO VIEJO - RAFAEL CAL Y MAYOR (LIM. DE EDOS. CHS Y OAX.).	feb-12	dic-18	315.00	22.50	PROCESO 2018	10096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
45	TRIUNFO DE MADERO - PUEBLO VIEJO	feb-12	dic-18	48.17	2,500.00	PROCESO 2018	10096270022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
46	VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA	mar-12	dic-18	31.30	6.97	PROCESO 2018	12096270002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
47	ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC	abr-09	dic-18	287.33	46	PROCESO 2018	05096270015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
48	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	ene-08	dic-18	162.10	30.00	PROCESO 2018	07096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
49	VALDIVIA - PALMARCITO.	abr-04	dic-18	160.29	430.00	PROCESO 2018	05096270006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
50	PIJIJAPAN AEROPUERTO. TRAMO: AEROPUERTO (MARIANO MATAMOROS) ZACULAPA.	jul-10	dic-18	118.08	23.00	PROCESO 2018	09096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
51	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CHAPAYAL	jun-04	dic-18	107.16	334.00	PROCESO 2018	05096270002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
52	SESECAPA-LAS SALINAS	sep-11	dic-18	98.84	2,050.00	PROCESO 2018	11096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
53	MOTOZINTLA BELISARIO DOMINGUEZ VILLAHERMOSA - EJIDO BERRIOSABAL	oct-11	dic-18	95.42	20.00	PROCESO 2018	11096270034	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
54	BELISARIO DOMINGUEZ - LAS CABAÑAS.	sep-05	dic-18	82.41	25.00	PROCESO 2018	05096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
55	CAMINO: E.C. CIUDAD CUAUHEMOC- CHIHUAHUA-ANGEL ALBINO CORZO.	mar-09	dic-18	75.54	18.00	PROCESO 2018	08096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
56	E.C. (NUEVO MEXICO - SAN JUAN CARRIZAL)	oct-11	dic-18	73.71	17.20	PROCESO 2018	11096270035	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
57	SANTA CATARINA - LOS NARANJOS	jun-07	dic-18	69.79	189.00	PROCESO 2018	07096270012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
58	OXCHUC - PLAZA YOCHIB	jun-07	dic-18	61.76	2,255.00	PROCESO 2018	07096270008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
59	ACAPETAGUA-EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA	jul-08	dic-18	57.10	17.7	PROCESO 2018	07096270015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
60	EL PARAISO - EL NOPAL	jun-05	dic-18	55.75	170.00	PROCESO 2018	05096270024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA	jun-14	dic-18	52.20	9.00	PROCESO 2018	14096270011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	CHAPINGO-EJIDO MORELOS	sep-11	dic-18	45.90	10.70	PROCESO 2018	11096270053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	CAMINO: FRONTERA HIDALGO-CANTON EL CARMEN	nov-08	dic-18	43.30	14.60	PROCESO 2018	08096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
64	CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA-EJIDO FRANCISCO I. MADERO.	feb-09	dic-18	41.10	10	PROCESO 2018	08096270001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	E.C. (COPAINALA TECPATAN) RIVERA CAMPECHE	jul-12	dic-18	40.91	883.00	PROCESO 2018	11096270012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	STA. ELOISA - EL ZAPOTE - E.C. (NVO.TEPEYAC - IXTAPILLA); INCLUYE RAMAL A CHITAMA.	jun-12	dic-18	38.11	1,066.00	PROCESO 2018	11096270058	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
67	TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO.	mar-14	dic-18	34.34	1,250.00	PROCESO 2018	11096270055	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	YABTECLUM - PUEBLA	jun-11	dic-18	31.72	1,200.00	PROCESO 2018	11096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	SINALOA NICOLAS BRAVO	sep-11	dic-18	30.10	6.00	PROCESO 2018	11096270020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	TEOPISCA NUEVO LEON	mar-13	dic-18	28.80	11.00	PROCESO 2018	13096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
71	E.C. (HUITIUPAN EL BOSQUE) SAN FRANCISCO PORTUGAL EL JARDIN.	may-12	dic-18	24.87	87.00	PROCESO 2018	12096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	SIMOJOVEL - LA PIMIENTA	may-12	dic-18	24.66	88.00	PROCESO 2018	12096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	SAN VICENTE - SANTUARIO DOS - SANTUARIO - EMBARCADERO.	jun-12	dic-18	15.45	20.46	PROCESO 2018	11096270031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA)-EJ. DR. SAMUEL BRINDIS	oct-13	dic-18	8.18	2.05	PROCESO 2018	13096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
75	TUMBALA - KHANIL	ene-04	dic-19	118.50	0.60	PROCESO 2019-2027	05096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	JOSE MARIA MORELOS - LA RAYA LIM. EDOS. (CHS-TAB)	may-12	nov-20	17.09	2,486.00	PROCESO 2019-2027	12096270001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	COJTMIL - JETJA - EL DIAMANTE CRUCERO PIÑAL	ene-08	dic-25	378.00	11.10	PROCESO 2019-2027	08096270011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
78	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	abr-15	dic-15	221.76	810.08	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	mar-16	dic-16	351.49	823.82	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2017	jul-17	nov-17	20.40	SEÑALAMIE	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMI
81	CG-112, MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN CHIAPA DE CORZO Y EMIL. ZAPATA, PARRAL,	ago-13	dic-13	391.40	70.00	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	PNI246	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2018	may-18	dic-18	152.00	258.20	PROCESO 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
83	DRAGADO DE MANTENIMIENTO PUERTO MADERO	mar-13	abr-13	19.00	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3C0002	---	PUERTOS
84	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN PUERTO	jul-13	dic-13	63.21	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J3C0001	---	PUERTOS
85	PROLONGACION DE LA ESCOLLERA ORIENTE	sep-13	dic-13	100.00	0.16	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3C0003	---	PUERTOS
86	RED CONTRAINCENDIOS PRIMERA ETAPA	ago-13	sep-14	3.77	RED CONTRAINCENDIOS	CONCLUIDAS 2013-2017	1009J3C0002	---	PUERTOS
87	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA PLAYA PONIENTE DE PUERTO CHIAPAS, PRIMERA Y SE	oct-13	dic-14	115.42	ROMPEOLAS	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
88	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN PUERTO CHIAPAS	nov-17	dic-17	126.30	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT**



MES DE DIFUSIÓN: OCTUBRE DE 2018

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: SEPTIEMBRE DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
89	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO-PORTUARIA EN LA REGIÓN PACÍFICO SUR (PROTECCIÓN LONGITUDINAL COSTERA)	may-18	nov-18	40.00	---	PROCESO 2018	0	---	PUERTOS
90	CENTRO LOGÍSTICO EN PUERTO CHIAPAS	oct-18	nov-18	41.20	CENTRO LOGISTICO	PROYECTADAS 2018	0	---	PUERTOS
91	ADQUISICIÓN DE UNA ECONOBODEGA EN PUERTO CHIAPAS	oct-18	dic-18	4.04	ECONOBODEGA	PROYECTADAS 2018	0	---	PUERTOS
92	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAPACHULA	ene-14	dic-15	6.02	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	AEROPUERTOS
93	AEROPUERTO PALENQUE	abr-11	feb-14	1,269.00	2.50	INAUGURADAS 2013-2017	0	PNI207	AEROPUERTOS
