



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
HIDALGO**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

OCTUBRE 2016

SCT HIDALGO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



2 AUTOPISTAS



10 CARRETERAS



100 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO




0 PUERTOS




0 AEROPUERTO

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

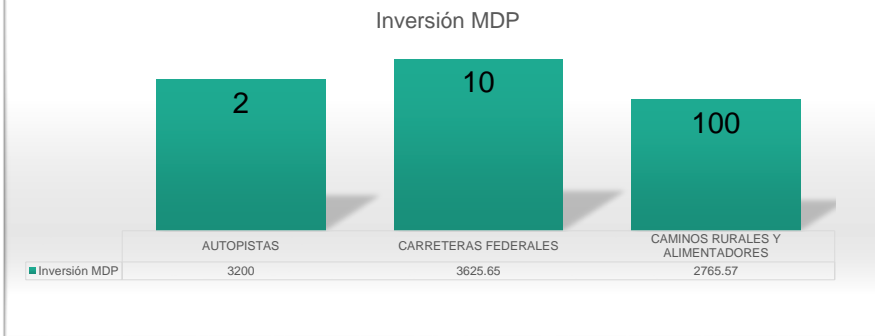

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

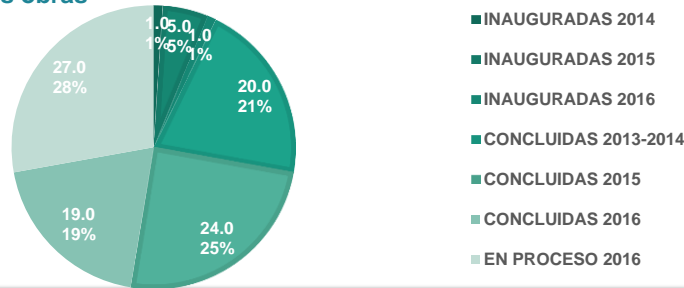

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		308,218.0	308,218.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		104,275.0	104,275.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		296,159.0	296,159.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		83.0	83.0

AVANCE EN PROGRAMAS

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	74.81	71.51	67.20	213.52
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	68	65	68	68
JORNALES	852,683	748,735	69,645,522	71,246,940
BENEFICIARIOS	11,992	14,170	10,551	36,713
LONGITUD	1,852.08	1,509.00		3,361.08
CAMINOS			478	478



Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte 112 9,591.2 1,643.3

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	3,200.00	32.60	1
PROYECTADAS 2016-2018	2	3,200.00	32.60	1
CARRETERAS FEDERALES	10	3,625.65	1,116.96	1
INAUGURADAS 2015	4	519.73	2.50	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	64.30	-	0
EN PROCESO 2016	1	311.59	1,014.16	0
EN PROCESO 2017-2018	3	2,590.03	100.30	1
PROYECTADAS 2016-2018	1	140.00	-	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	100	2,765.57	493.77	0
INAUGURADAS 2015	1	7.37	0.90	0
CONCLUIDAS 2013-2014	19	284.70	70.25	0
CONCLUIDAS 2015	24	170.66	40.15	0
CONCLUIDAS 2016	19	249.30	37.44	0
EN PROCESO 2016	26	941.87	158.28	0
EN PROCESO 2017-2018	4	724.45	140.55	0
PROYECTADAS 2016-2018	5	68.22	38.20	0
INAUGURADAS 2014	1	58.60	2.00	0
INAUGURADAS 2016	1	260.40	6.00	0
Total general	112	9,591.22	1,643.33	2

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,702			1702
INMUEBLES ESCOLARES	1,121			1121
CENTROS DE SALUD	314			314
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	243			243
OFICINAS DE GOBIERNO	22			22
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	2			2

Fecha de recepción: Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.13.4911/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-508/2016 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	01/02/2014	31/12/2014	58.60	INAUGURADO EL 22 DE JULIO DE 2016.	2.00	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
2	PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION BOULEVARD FELIPE ANGELES-AV. NUEVO PACHUCA PLAZA DE TOROS	01/07/2012	31/12/2014	183.80	INAUGURADA 31-MAR-15	1.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330011	PE
3	DISTRIBUIDOR VIAL MUNICIPIOS UNIDOS (TULIPANES)	01/06/2012	01/12/2013	175.20	INAUGURADA 31-MAR-15	DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330010	--
4	PUENTE COLONIAS E INTERSECCION BLVD. FELIPE ANGELES BLVD. SANTA CATARINA BLVD. NUEVO HIDALGO	01/08/2012	15/07/2014	81.33	INAUGURADA 31-MAR-15	PSV (1.0 Km)	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096330009	--
5	DISTRIBUIDOR VIAL EL MINERO	01/05/2014	31/12/2014	79.40	INAUGURADA 31-MAR-15	1.00	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096330006	PE
6	ACCESO A GRUTAS DE TOLANTONGO	16/02/2015	26/11/2015	7.37	FECHA DE INAUGURACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.	0.90	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
7	ENTRONQUE MEXICO - PACHUCA VILLA DE TEZONTEPEC	16/06/2011	02/12/2015	260.40	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00345 OBRA INAUGURADA EL 22 DE JULIO DE 2016.	6.00	INAUGURADAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330001	PNI136
8	JOROBAS-TULA, DISTRIBUIDOR VIAL PIV LA ZAL	01/10/2011	01/12/2013	64.30	N/A	DISTRIBUIDOR	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	03096330023	--
9	RECONSTRUCCION DEL BLVD RAMON G BONFIL.	01/02/2014	15/09/2014	38.69	N/A	4.86	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	--
10	CAMINO: CHILCUAHUTLA-ALFAJAYUCAN.	16/05/2013	30/12/2014	34.21	N/A	6.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096330016	--
11	PROGRESO - EL TEPHE	01/02/2014	30/12/2014	30.30	N/A	24.28	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330029	--
12	E.C. KM. 12+000 (MOLANGO - XOCHICOATLAN)- ZAPOCOATLAN - TEXCACO	01/02/2014	31/12/2014	22.89	N/A	1.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	--
13	RECONSTRUCCION PACHUCA-TULANCINGO- LOS ROMEROS	16/07/2013	30/12/2013	17.70	N/A	3.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330010	--
14	HUICHAPAN TLAXCALILLA. PRIMERA ETAPA	01/02/2014	30/09/2014	17.04	N/A	5.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	--
15	SAN SEBASTIAN DE JUAREZ - SANTA MARIA MACUA	16/05/2013	30/11/2013	15.60	N/A	4.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330006	--
16	EC (HUICHAPAN - IXMIQUILPAN) - SAN FRANCISCO SACACHICHILCO	16/05/2013	30/12/2013	13.00	N/A	6.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330022	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
17	C.E. IXTLAHUACO-CALNALI	16/02/2014	15/09/2014	11.20	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330005	--
18	CIRCUITO LOMA CENTRO - LA LOMA	23/05/2013	07/11/2013	10.24	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330027	--
19	E.C. MEXICO 45 - EL DURAZNO, INCLUYE RAMAL	23/05/2013	30/11/2013	10.04	N/A	1.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330022	--
20	SANTA CRUZ-COCINILLAS	02/07/2013	30/11/2013	9.91	N/A	2.32	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330023	--
21	RANCHO UNIVERSITARIO - SAN MIGUEL HUATENGO - LA ERA.	11/11/2013	31/12/2013	9.90	N/A	0.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330001	--
22	HUAZALINGO - TLANCHINOL	16/02/2014	31/12/2014	9.60	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	--
23	E.C. (PACHUCA - TUXPAN) - LA MESA	16/02/2014	31/12/2014	9.60	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	--
24	RECONSTRUCCION DEL BLV DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE ZEMPOALA.	16/02/2014	15/09/2014	9.58	N/A	0.29	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330008	--
25	VISTA HERMOSA REMEDIOS LOS CRUCES.	01/04/2014	31/12/2014	7.90	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330006	--
26	AV. IGNACIO LOPEZ RAYON - EL DEXTHO	01/04/2014	31/12/2014	4.80	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330010	--
27	EL BARRIDO - DIOS PADRE	21/05/2014	31/12/2014	2.50	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	--
28	TEPEJI DEL RIO - TULA DE ALLENDE (PUENTES VEHICULARES)	01/04/2014	31/01/2015	57.90	N/A	2 puentes 1.1 km	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	--
29	EL OLIVO - CUESTA COLORADA - TEXCADHO	01/09/2014	31/08/2015	10.00	LOS DATOS DEL REGISTRO ANTE LA SHCP FUE PROPORCIONADO POR CDI..	0.70	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	--
30	ACCESO A EPAZOYUCAN	16/02/2015	28/10/2015	9.80	OBRA QUE PRESENTA PROBLEMÁTICA SOCIAL	2.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
31	ALFAJAYUCAN - LA SALITRERA	16/02/2015	26/11/2015	9.80	N/A	2.45	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
32	LA ESTANZUELA - IHMSYS	16/02/2015	27/11/2015	9.80	N/A	3.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
33	BOULEVARD ORIENTE DE ACTOPAN	16/02/2015	15/06/2015	9.60	N/A	9.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
34	COCINILLAS – TECOCOMULCO	16/06/2015	15/12/2015	9.59	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	--
35	PORTEZUELO - SANTIAGO IXTLAHUACA - DANGHU - CALTIMACAN.	21/05/2014	31/01/2015	6.00	N/A	1.10	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330003	--
36	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - ARENALITO	21/04/2014	15/01/2015	6.00	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330012	--
37	ACCESO A TOLCAYUCA	16/02/2015	30/06/2015	5.87	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
38	SAN NICOLAS – AV. ALLENDE – REMEDIOS – ORIZABITA	16/06/2015	30/11/2015	5.19	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
39	EL RINCON – FRAY FRANCISCO	16/02/2015	31/08/2015	4.90	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
40	C.E. COL. MIGUEL HIDALGO – COL. BENITO JUAREZ	16/05/2015	30/11/2015	3.82	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
41	SAN PEDRO CAPULA – LA ESTACION	16/02/2015	30/09/2015	3.14	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
42	C.E. TEPATEPEC – BELLA AIROSA – EL MENDOZA	16/06/2015	15/12/2015	3.10	N/A	1.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
43	C.E. 4 CAMINOS – LA CALZADA	16/06/2015	15/12/2015	2.50	N/A	1.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
44	LOS VIOLINES – EMILIANO ZAPATA.	16/02/2015	30/06/2015	2.45	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
45	E.C. (IXMIQUILPAN - PROGRESO)- MAGUEY BLANCO- MANZANA EL BOTHI	21/06/2014	31/01/2015	2.40	N/A	0.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330007	--
46	AV. 25 DE JULIO - MIGUEL HIDALGO	16/07/2015	31/08/2015	2.30	N/A	0.54	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330011	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
47	C.R. BARRIO DEL ORO – LA LOMA DEL ORO – C.F. MEXICO - LAREDO	16/06/2015	30/11/2015	2.16	N/A	1.75	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
48	LOS FILTROS	16/02/2015	31/08/2015	1.47	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
49	CALLE FRANCISCO ZARCO – CALLE MAZATLAN	16/06/2015	30/11/2015	1.27	N/A	0.33	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
50	C.R. NUEVO MEXICO – LAS FUENTES	16/06/2015	15/12/2015	0.92	N/A	0.36	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
51	C.R. ACCESO A ARAMBO	16/06/2015	15/12/2015	0.68	N/A	0.32	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
52	SINGUILUCAN - SANTA ANA CHICHICUAUTLA	01/10/2010	12/02/2016	83.82	N/A	18.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330011	--
53	E.C. (HUAUTLA - CHILITECO) - METLATEPEC - CHAPOPOTE	16/07/2015	31/08/2016	31.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.78 KM.	1.77	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330025	--
54	PISAFLORES - CHALAHUITE - LA ARENA	16/10/2015	18/03/2016	25.00	N/A	0.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096330016	--
55	TIANGUISTENGO ATLAPEXCO, TRAMO: OTLAMALACATLA - PAPATLATA	16/06/2015	31/08/2016	18.00	ASIGNACIÓN APROBADA EN 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 13.0 KM.	2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330001	--
56	METZTITLAN – ZOQUIZOQUIPAN	16/06/2015	31/08/2016	15.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.46 KM.	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330012	--
57	HUAZALINGO - TLANCHINOL	16/02/2016	31/08/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00939	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096330015	--
58	LAGUNITA - BANXU	01/09/2014	12/02/2016	9.00	LA OBRA SE CONCLUYE A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEBIDO A QUE FUE NECESARIO LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL SEÑALAMIENTO SERÁ CONSIDERADO PARA ETAPA POSTERIOR.	1.27	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01409633009	--
59	EL MANANTIAL - EL DEZHA	01/11/2014	04/03/2016	9.00		1.42	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	016S179001	--
60	ARCO PONIENTE: PROGRESO - MANDHO - SANTA ANA	16/07/2015	08/03/2016	8.30	N/A	1.73	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
61	E.C. (OTONGO - TEPEHUACAN DE GUERRERO) - ACAYUCA	16/07/2015	31/08/2016	8.10	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.98 KM.	0.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330020	--
62	LÓPEZ FLORES - LÓPEZ FLORES 2DA. SECCIÓN	16/06/2015	07/03/2016	4.80	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330005	--
63	SAN CLEMENTE - PALACIOS	16/06/2015	31/03/2016	4.79	N/A	0.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330015	--
64	BOULEVARD ORIZABITA	16/05/2015	12/02/2016	4.51	N/A	2.04	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
65	E.C. (IXMIQUILPAN - CARDONAL) - CERRITOS, INCLUYE CIRCUITO ANTONIO HERNÁNDEZ	16/10/2015	24/05/2016	4.40	N/A	0.75	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330015	--
66	EL BARRIDO - DIOS PADRE	16/07/2015	08/03/2016	4.22	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01342,	1.15	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330009	--
67	C.R. PAREDES REMEDIOS – DURAZNO – SAN JUANICO	16/06/2015	12/02/2016	4.21	N/A	0.85	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330011	--
68	C.R. BOCAMIÑO - SAN JUAN TEPA	16/06/2015	08/03/2016	2.22	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
69	C.E. CANAL REQUENA – EL VEINTE	16/06/2015	15/02/2016	1.44	N/A	0.64	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
70	C.R. SAN JOSE - SACRAMONTES	16/06/2015	15/02/2016	0.89	N/A	0.32	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
71	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2016 HIDALGO	16/02/2016	30/12/2016	311.59	PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE UTILIZAN 5 CLAVES PRESUPUESTALES.	1,014.16	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007, 15092110008, 15092110004, 15092110006, 15092110010	--
72	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2016 HIDALGO	15/07/2016	31/12/2016	159.89		76.81	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
73	VIALIDAD EN EL ENCAUZAMIENTO LA PAZ - LOS TUZOS	16/09/2016	30/12/2016	135.00		5.12	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330014	--
74	FERRERÍA DE APULCO - SAN PEDRO VAQUERÍAS	16/07/2015	30/11/2016	94.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 29.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 4.0 KM.	17.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330023	--
75	BOULEVARD LAS TORRES	16/08/2015	15/12/2016	53.40	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 36.3 MDP, PARA UNA META DE 1.4 KM.	2.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330021	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
76	CARDONAL - ARENALITO - LA MESA - CIENEGUILLITAS - LOS LIRIOS - LA UNIÓN	16/10/2015	31/10/2016	51.90	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.0 KM.	8.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330012	--
77	TEPEJI DEL RIO - TULA	01/06/2016	30/12/2016	49.40	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01272	1.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330027	--
78	BLVD. RAMÓN G. BONFIL	16/09/2016	30/12/2016	48.18	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00943	2.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330007	--
79	CUESTA COLORADA - LA CIENEGA	16/07/2015	30/12/2016	46.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 KM, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM.	4.80	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330006	--
80	ACCESO A TUZANCOAC	16/07/2015	30/11/2016	42.40	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM.	2.73	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330005	--
81	C.R. SAN NICOLAS QUETZALAPA - SAN NICOLAS OCTUPILLA	16/06/2015	30/12/2016	29.90	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 20.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.76 KM.	2.76	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330017	--
82	BICENTENARIO SIONISTA: VILLA DE LA PAZ - SAN ANDRÉS ORIZABITA - ESPIRITÚ - QUIXPEDHE	16/07/2015	31/10/2016	25.20	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.93 KM.	5.07	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330003	--
83	OJO DE AGUA - SANTA ROSA - SAN JERÓNIMO	16/07/2015	31/10/2016	21.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.6 KM.	7.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096330005	--
84	SAUCILLO - PLOMOSAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN	16/07/2015	31/10/2016	19.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 5.4 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 0.66 KM.	1.95	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330002	--
85	SANTA MARIA NATIVITAS - CHACALAPA	16/10/2015	30/11/2016	18.80	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.0 KM	3.10	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330017	--
86	LA MISIÓN - PUERTO DE LOS NARANJOS	16/08/2015	30/11/2016	18.50	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 15.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.3 KM.	1.65	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330016	--
87	COCINILLAS - TECOCOMULCO	16/03/2016	31/10/2016	15.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01783	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330013	--
88	E.C. KM 12+000 (MOLANGO-XOCHICOATLÁN)-ZAPOCOATLAN-TEXCACO	16/03/2016	30/11/2016	15.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00344	1.93	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330011	--
89	PUENTE RANCHO NUEVO	01/03/2016	30/11/2016	15.00	N/A	0.12	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330008	--
90	ORIZABITA - LOS ARCOS	16/07/2015	31/10/2016	12.10	ASIGNACIÓN APROBADA EN PEF 2016 ES DE 10.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 1.38 KM.	2.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330010	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
91	E.C. PACHUCA - TUXPAN - LA MESA	16/03/2016	15/11/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00940	2.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330023	--
92	CERRO BOLUDO-LA LOMITA-RANCHO NUEVO	16/02/2016	31/10/2016	10.00	N/A	1.02	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096330001	--
93	SAN BARTOLO TUTOTEPEC - SAN MIGUEL	16/03/2016	15/10/2016	10.00	N/A	0.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330027	--
94	HUICHAPAN - TLAXCALILLA	16/09/2016	30/12/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_00944	1.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330005	--
95	VALLE AZUL: SAN ANDRES ORIZABITA-ESPINO-CERRITOS-NEQUETEJE	16/02/2016	31/10/2016	10.00	N/A	1.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096330004	--
96	ARCO PONIENTE: PROGRESO-MANDHÓ-SANTA ANA	01/03/2016	31/10/2016	10.00	CONTINUACIÓN DE LA OBRA OB_SCT_01959	0.52	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330002	--
97	EL GARAMBUYO - EL MAYE	16/03/2016	31/12/2016	10.00	N/A	1.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096330025	--
98	PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO-QUERETARO)	16/02/2009	31/12/2018	1,326.00	LOS DATOS REGISTRADOS CORRESPONDEN A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO. ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 185.0 MDP PARA UNA META DE 5.5 KM.	61.80	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096330030	PNI438
99	CG 080 CONTINUAR CON LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA	01/06/2013	29/12/2017	800.03	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 238.0 MDP, PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE 11.0 KM Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE ATOTONILCO II.	18.50	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096330002	PNI533
100	CIUDAD SAHAGUN - CALPULALPAN	01/02/2012	29/12/2017	464.00	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO. ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 190.0 MDP, PARA UNA META DE 3.0 KM.	20.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096330029	PE
101	EJE INTERESTATAL ACTOPAN-ATOTONILCO	01/07/2008	30/11/2018	336.94	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 KM, PARA TRABAJOS FALTANTES EN 8.4 KM.	46.30	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096330006	PE
102	JUAREZ HIDALGO - TLAHUILTEPA	01/02/2010	01/12/2017	289.43	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 2.4 KM.	50.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096330015	--
103	TECOZAUTLA - TASQUILLO	01/07/2010	28/02/2017	57.50	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 28.0 MDP PARA UNA META DE 4.6 KM.	39.60	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330006	--
104	HUEHUETLA - SAN LORENZO - LIM. IXHUATLÁN DE MADERO, PUEBLA	16/10/2015	15/02/2017	40.58	ASIGNACIÓN POR LICITAR EN 2016 ES DE 26.08 MDP, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 3.0 KM.	4.65	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096330026	--
105	MINERAL DEL MONTE - ENTRONQUE HUASCA	01/02/2017	31/12/2018	1,900.00	AUN NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO DE COSTO BENEFICIO ACTUALIZADO.	9.60	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	12096330030	PNI521

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE HIDALGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
106	CG-082 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO IXMIQUILPAN	01/02/2017	31/12/2018	1,300.00	AUN NO SE DEFINE EL TRAZO DEFINITIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL COSTO BENEFICIO.	23.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	EN TRAMITE	PNI447
107	DISTRIBUIDOR VIAL LA HUASTECA	01/02/2017	31/07/2018	140.00	ASIGNACIÓN PARA 2016 ES DE 121.0 MDP.	PSV	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096330020	--
108	E.C. (SAN BARTOLO - SAN MIGUEL) - PIE DEL CERRO	01/02/2017	31/10/2017	22.22	EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	4.90	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330008	--
109	HUAUTLA TOHUACO AMATZINTLA - CHAPOPOTE (LIM. EDOS HGO Y VER)	01/02/2017	31/10/2017	20.00	EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA CONTRATACIÓN.	5.30	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096330026	--
110	ACUATEMPA-SAN SALVADOR-TOLTITLÁN	01/02/2017	31/10/2017	10.30	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	25.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/62	--
111	CHILIJAPA-TEYAHUALA-TEXCAPA	01/02/2017	31/10/2017	10.00	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	1.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/63	--
112	CHAPULHUACAN-TEPEHUÁCAN-CRUZ VERDE	01/02/2017	31/10/2017	5.70	REGISTRO ANTE LA SHCP EN TRÁMITE. EN ESPERA DE PRESUPUESTO 2017 PARA SU CONTRATACIÓN.	1.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/64	--
