



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
MICHOCACÁN**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

OCTUBRE 2016

SCT MICHOACAN 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



6 AUTOPISTAS



23 CARRETERAS



120 CAMINOS RURALES



2 FERROVIARIO



35 PUERTOS




2 AEROPUERTO


Programas



ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

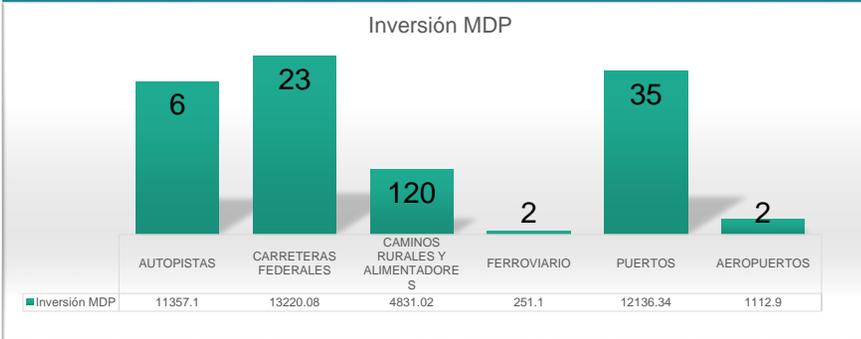

Estatus de las obras

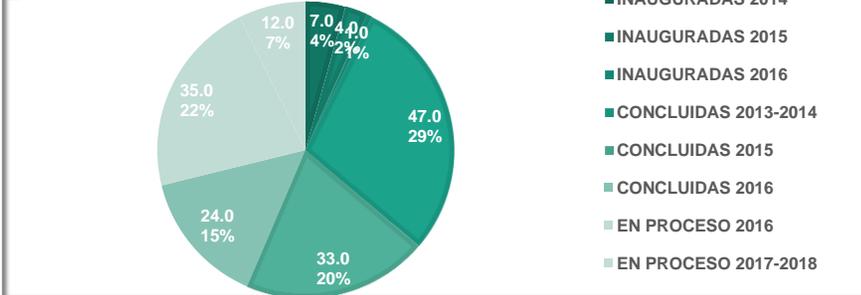

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 2014 | 2015 | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|
| INVERSIÓN ACUMULADA | 919.1 | 322.2 | 1,241.2 |
| BENEFICIARIOS | | | |
| BENEFICIARIO IV ETAPA | | | |
| TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS | 441,000.0 | 480,994.0 | 921,994.0 |
| MUNICIPIOS BENEFICIADOS | | | |

| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| INVERSIÓN 2014 | 114.28 | 124.43 | 114.00 | 352.71 |
| MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT | 104 | 102 | 107 | 107 |
| JORNALES | 1,406,940 | 1,368,198 | 607,581 | 3,382,719 |
| BENEFICIARIOS | 29,264 | 28,776 | 9,206 | 67,246 |
| LONGITUD CAMINOS | 4,570.60 | 4,131.00 | 235 | 8,701.60 |
| | | | 235 | 235 |



Fecha de recepción: Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: SCT.6.15.303.119/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-1/511/2016 enviado por la DGAPDCST

Obras **188** MDP **42,908.5** Km **11,469.8**
A la fecha, la SCT invierte en

| Concepto | No. Obras | Inversión total MDP | Longitud (KM) | CG |
|--|------------|---------------------|------------------|----------|
| AUTOPISTAS | 6 | 11357.1 | 183.4 | 2 |
| CONCLUIDAS 2016 | 2 | 5754 | 97.2 | 0 |
| EN PROCESO 2016 | 1 | 1815 | 46 | 1 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 2 | 2488.1 | 15 | 1 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 1 | 1300 | 25.2 | 0 |
| CARRETERAS FEDERALES | 23 | 13220.08 | 9866.67 | 3 |
| CONCLUIDAS 2013-2014 | 4 | 843.88 | 2900.8 | 0 |
| CONCLUIDAS 2015 | 6 | 2032.52 | 2576.32 | 1 |
| EN PROCESO 2016 | 8 | 1039.18 | 1815.85 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 3 | 6726.4 | 2471 | 1 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 1 | 2061 | 102.7 | 0 |
| INAUGURADAS 2016 | 1 | 517.1 | 0 | 1 |
| CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 120 | 4831.02 | 1416.341 | 0 |
| INAUGURADAS 2015 | 4 | 36 | 10.3 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2014 | 25 | 732.21 | 138.465 | 0 |
| CONCLUIDAS 2015 | 23 | 191.89 | 76.686 | 0 |
| CONCLUIDAS 2016 | 22 | 176.04 | 54.73 | 0 |
| EN PROCESO 2016 | 23 | 593.88 | 740.69 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 2 | 2920 | 350 | 0 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 21 | 181 | 45.47 | 0 |
| FERROVIARIO | 2 | 251.1 | 3.353 | 0 |
| INAUGURADAS 2014 | 1 | 203.2 | 0 | 0 |
| EN PROCESO 2016 | 1 | 47.9 | 3.353 | 0 |
| PUERTOS | 35 | 12136.34 | 0 | 0 |
| INAUGURADAS 2014 | 6 | 3739.8 | 0 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2014 | 18 | 281.67 | 0 | 0 |
| CONCLUIDAS 2015 | 4 | 1171.15 | 0 | 0 |
| EN PROCESO 2016 | 2 | 90.47 | 0 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 4 | 6328.25 | 0 | 0 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 1 | 525 | 0 | 0 |
| AEROPUERTOS | 2 | 1112.9 | 0 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 1 | 112.9 | 0 | 0 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
| Total general | 188 | 42908.54 | 11469.764 | 5 |

| MÉXICO CONECTADO | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|--|-------|------|------|-------|
| INVERSIÓN | | | | |
| TOTAL | 1,986 | | | 1,986 |
| INMUEBLES ESCOLARES | 1,277 | | | 1,277 |
| CENTROS DE SALUD | 384 | | | 384 |
| BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO | 171 | | | 171 |
| OFICINAS DE GOBIERNO | 82 | | | 82 |
| ESPACIOS PÚBLICOS | 72 | | | 72 |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES I | 01/01/2013 | 30/06/2014 | 2,557.00 | OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION INAUGURADA SEP-14 | 1 TERMINAL | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | | PNI382 |
| 2 | DRAGADO DE DARSENA NORTE Y ORIENTE EN PUERTO DE LAZARO CARDENAS | 01/01/2010 | 01/05/2013 | 940.30 | INAUGURADA 22-JUL-14 | DRAGADO 11 MILLONES M3 | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | 0909J3A0003 | -- |
| 3 | CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS PARA AMPLIACION DE PATIO FERROVIARIO EN ISLA DEL CAYACAL | 01/08/2013 | 28/12/2013 | 203.20 | INAUGURADA 22-JUL-14 | VÍAS FERREAS | INAUGURADAS 2014 | FERROVIARIO | | -- |
| 4 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS API Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA DEL CAYACAL | 01/08/2012 | 01/10/2014 | 133.28 | INAUGURADA 13-NOV-14 | 24,000 m2 | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | 0409J3A0004 | -- |
| 5 | RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE | 03/06/2013 | 31/10/2013 | 55.02 | INAUGURADA 22-JUL-14 | RETIRO DE MATERIALES | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | | -- |
| 6 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS. | 01/05/2009 | 30/06/2014 | 48.31 | INAUGURADA 22-JUL-14 | 2.5 HECTAREAS | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | 0309J3A0018 | -- |
| 7 | CONSTRUCCION DE AREAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS | 28/12/2013 | 30/04/2014 | 5.89 | INAUGURADA 22-JUL-14 | -- | INAUGURADAS 2014 | PUERTOS | | -- |
| 8 | MODERNIZACION DEL CAMINO TAFETAN-PLATANILLO | 27/02/2014 | 26/07/2014 | 15.00 | 31 DE MARZO DE 2014 | 4.00 | INAUGURADAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360018 | -- |
| 9 | E. C. DR. MIGUEL SILVA - NUEVO URECHO. CAMINO A LA COMUNIDAD DE ARAPARICUARIO | 09/05/2014 | 07/09/2014 | 10.00 | 01 DE ABRIL DE 2014 | 2.90 | INAUGURADAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360014 | -- |
| 10 | MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS LETRAS-CASA BLANCA | 23/03/2014 | 18/10/2014 | 6.00 | INAUGURADA 01-ABR-15 | 1.80 | INAUGURADAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360020 | -- |
| 11 | MODERNIZACION DEL CAMINO TECOMATAN - E.C. PAJACUARAN - LA LUZ | 12/03/2014 | 19/07/2014 | 5.00 | INAUGURADA 26-MAR-15 | 1.60 | INAUGURADAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360003 | -- |
| 12 | CG-252 MODER. DEL LIBRAMIENTO NORTE DE MORELIA, EN EL TRAMO SALIDA A SALAMANCA – SALIDA A QUIROGA | 16/05/2014 | 31/03/2015 | 517.10 | PSV "CENTRAL" PSV "PEDREGAL" PSV "LAGO" PSV "REALITO" | 5 Estructuras | INAUGURADAS 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 14096360010 | PNI300 |
| 13 | CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CA | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 600.00 | ES UN CONTRATO PLURIANUAL 2012 - 2018 SE REPORTA LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA | 647.80 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 11092110001 | -- |
| 14 | DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15/07/2014 | 01/09/2014 | 393.00 | E Y P DE LOS CAMINOS: LIBRAMIENTO MARTI MERCADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 5+130. LA CAPILLA- LA LOBERA, TRAMO DEL KM. 5+700 AL KM. 8+200.Y E.C. HUETAMO-ZITÁCUARO, TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO -OCUARO | ESTUDIOS | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092110001 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 15 | OBRAS DE REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 204.00 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | TERMINAL | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 16 | PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 01/03/2014 | 30/11/2014 | 190.44 | N/A | 1,890.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 13092110003 | -- |
| 17 | QUITZEO ZINAPARO TR: HUANDACAREO – PURUANDIRO (TRAMO DEL KM. 2+660 AL KM. 57+000) | 01/03/2011 | 01/11/2013 | 147.50 | N/A | 77.72 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096360015 | -- |
| 18 | PROGRAMA DE RECONSTR., CONSER. RUTINARIA Y PERI. DE PUENTES 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 41.62 | N/A | 332.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 13092110006 | -- |
| 19 | TUPATARO (MICHOACAN) - PIÑICUARO (GUANAJUATO) HUANDACAREO, MICH. - PIÑACUARO, GTO | 01/06/2013 | 01/12/2013 | 29.20 | N/A | 12.12 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360025 | -- |
| 20 | EL PANDILLO-TICUITACO | 31/08/2011 | 11/12/2013 | 16.90 | N/A | 6.70 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360027 | -- |
| 21 | MODERNIZACION DEL CAMINO LA HUACANA - POTURO. | 27/02/2014 | 15/09/2014 | 15.03 | N/A | 5.32 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360020 | -- |
| 22 | PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 30/05/2014 | 31/12/2014 | 11.82 | N/A | 31.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 13092110004 | -- |
| 23 | MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO – ATIJO | 05/06/2014 | 27/11/2014 | 11.10 | N/A | 5.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360030 | -- |
| 24 | CHAMACUERO-TEJOCOTE DE LA CALERA | 16/04/2012 | 01/07/2013 | 10.60 | N/A | 3.20 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360024 | -- |
| 25 | MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA | 19/07/2014 | 19/08/2014 | 10.00 | N/A | 2.80 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360044 | -- |
| 26 | MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO VILLALONGIN-EL DEVANADOR | 12/03/2014 | 24/09/2014 | 10.00 | N/A | 1.84 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360003 | -- |
| 27 | MODERNIZACION DEL CAMINO EL ALCALDE-ACATLAN | 15/08/2014 | 30/11/2014 | 9.20 | N/A | 3.20 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360008 | -- |
| 28 | CONSTRUCCION DEL CAMINO PALOS MARIAS-SALITRE DE COPOLA. TR. PALOS MARIAS - EL DERRUMBADERO | 21/06/2014 | 28/10/2014 | 7.60 | N/A | 0.94 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360020 | -- |
| 29 | RELLENO CON MATERIAL GRAVA ARENA EN AREAS COLINDANTES CON EL PUERTO | 16/09/2013 | 30/10/2013 | 7.53 | N/A | | PUERTO | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 30 | RENIVELACION DE PROTECCION PLAYERA EN LA ISLA DE ENMEDIO | 17/06/2013 | 13/12/2013 | 7.36 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 31 | AMPLIACION DEL ACCESO SUR DE JACONA. | 25/03/2014 | 01/08/2014 | 7.35 | N/A | 0.20 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360047 | -- |
| 32 | COJUMATLAN-EL NOGAL | 25/03/2014 | 01/08/2014 | 7.00 | N/A | 0.94 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360001 | -- |
| 33 | MODERNIZACION DEL E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - SAN JERONIMO CAÑADA DE BUENAVISTA | 02/04/2014 | 26/09/2014 | 7.00 | N/A | 2.30 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360005 | -- |
| 34 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | 15/04/2013 | 30/12/2013 | 6.71 | N/A | PUERTO | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 35 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA DEL CANAL SUROESTE | 13/11/2013 | 30/12/2013 | 6.11 | N/A | VIALIDAD PERIFÉRICA | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 36 | COLOCACION Y SUMINISTRO DE DEFENSAS EN TERMINALES DE USOS MULTIPLES. | 14/10/2013 | 30/12/2013 | 6.04 | N/A | TERMINAL | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 37 | MODERNIZACION DEL E.C. HUETAMO-ZITACUARO TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO-OCUARO | 01/09/2014 | 30/11/2014 | 6.00 | N/A | 2.50 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360011 | -- |
| 38 | APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN ZONAS DE DESARROLLO ECOLOGICO" | 16/09/2013 | 14/11/2013 | 5.95 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 39 | CONST, SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION DE SISTEMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN VIALIDAD NORTE 1 ETAPA | 13/11/2013 | 30/12/2013 | 5.75 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 40 | ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, EN RED DE ALUMBRADO Y RED DE FIBRA OPTICA | 22/03/2013 | 19/06/2013 | 5.35 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 41 | E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO | 12/03/2014 | 19/06/2014 | 5.00 | N/A | 1.50 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360024 | -- |
| 42 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS | 12/03/2014 | 22/08/2014 | 5.00 | N/A | 0.03 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360028 | -- |
| 43 | MODERNIZACION DEL CAMINO LA ESPERANZA-EL TEPEHUAJE | 26/03/2014 | 26/07/2014 | 5.00 | N/A | 1.62 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360033 | -- |
| 44 | MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN | 12/03/2014 | 22/08/2014 | 5.00 | N/A | 0.90 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360001 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 45 | CONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - LA LOMA - SANTA MARIA | 15/08/2014 | 30/11/2014 | 5.00 | N/A | 2.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360052 | -- |
| 46 | CD. HIDALGO- MARAVATIO | 25/03/2014 | 21/08/2014 | 4.49 | N/A | 3.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 07096360020 | -- |
| 47 | MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CLARA - LA CALERA | 12/03/2014 | 01/08/2014 | 4.24 | N/A | 1.90 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360026 | -- |
| 48 | REUBICACION DE ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE FIBRA OPTICA PARA EL CANAL SUROESTE | 12/09/2013 | 25/11/2013 | 4.23 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 49 | MODERNIZACION DEL CAMINO EL PILAR - LAS JICAMAS | 29/06/2014 | 26/09/2014 | 4.00 | N/A | 1.03 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360005 | -- |
| 50 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAPU - ZIRAHUEN, TRAMO NARANJA DE TAPIA | 24/09/2014 | 01/11/2014 | 4.00 | N/A | 1.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100001 | -- |
| 51 | ACTUALIZACION DEL PORTAL DE RAYOS GAMMA A FULL SCAN | 01/10/2012 | 28/02/2013 | 3.70 | OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 52 | INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE PANELES SOLARESENERGIA DEL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS | 16/09/2013 | 15/11/2013 | 3.64 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 53 | CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL EN LA ISLA DEL CAYACAL | 17/10/2013 | 15/12/2013 | 3.51 | N/A | PROTECCIÓN MARGINAL | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 54 | CONSTRUCCION DE RAMPA DE BOTADERO Y PATIO DE SERVICIOS PARA EMBARCACIONES MENORES | 12/09/2013 | 30/11/2013 | 3.08 | N/A | -- | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 55 | MANTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO | 27/05/2013 | 22/12/2013 | 3.07 | N/A | PUERTO | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 56 | MODERNIZACION DEL CAMINO MARCOS CASTELLANOS - JIQUILPAN - E.C. CARRETERA A SAN MIGUEL | 25/03/2014 | 06/08/2014 | 3.00 | N/A | 0.70 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360045 | -- |
| 57 | CONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQUETAS EN VIALI. DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO EN ISLA DEL CAYACAL | 23/05/2013 | 20/08/2013 | 2.86 | N/A | GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 58 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS | 27/05/2013 | 14/08/2013 | 2.53 | N/A | PUERTO | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |
| 59 | CERCADO EN EL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO | 24/04/2013 | 10/05/2013 | 0.25 | N/A | CERCADO | CONCLUIDAS 2013-2014 | PUERTOS | | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Terminó | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO | |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----|
| 60 | AMPLIACION DE CANALES Y DARSENAS | 03/06/2013 | 31/12/2015 | 1,003.69 | N/A | | PUERTO | CONCLUIDAS 2015 | PUERTOS | 1209J3A0001 | -- |
| 61 | COSTERA COAHUAYANA DE HIDALGO- LAZARO CARDENAS, TRAMO: EL HABILLAL- CALETA DE CAMPOS. | 31/12/2009 | 31/08/2015 | 987.50 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 7 A 12 M. DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN CON ACOTAMIENTOS LATERALES DE 2.5 M., EN UNA LONGITUD DE 40.5 KM. | 0.22 Km de estr. Y 0.35 Km de accesos | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 09096360029 | PNI191 | |
| 62 | CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2015. | 02/01/2015 | 31/12/2015 | 547.07 | EL AVANCE CORRESPONDE A LA ASIGNACION 2015 | 647.80 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 11092110001 | -- | |
| 63 | CG-254 AMPLIACION DE LA CARRETERA PATZCUARO - TACAMBARO | 01/11/2013 | 31/05/2015 | 254.10 | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 7 MTS. A 21 MTS CON 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN Y ACOTAMIENTOS LATERALES DE 2.5 MTS. EN UNA LONGITUD DE 10.9 KMS. | 109.00 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 13096360002 | PNI220 | |
| 64 | PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 195.54 | SE MODIFICA Y REDUCE A 195.540 MDP POR ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE INVERSIÓN NO . 5SC.OMI.15.-049 DE FECHA 10 DICIEMBRE 2015 | 1,659.52 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 14092110003 | -- | |
| 65 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA NORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL. | 01/01/2001 | 31/12/2015 | 77.46 | N/A | | PUERTO | CONCLUIDAS 2015 | PUERTOS | 0209J3A0001 | -- |
| 66 | REUBICACION DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA EN LA ISLA DEL CAYACAL | 12/01/2011 | 31/12/2015 | 54.51 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | | PUERTO | CONCLUIDAS 2015 | PUERTOS | 0509J3A0004 | -- |
| 67 | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2015 DE LA RED FED LIBRE DE PEAJE | 13/04/2015 | 31/12/2015 | 36.65 | N/A | | 156.00 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 14092110004 | -- |
| 68 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y PATIOS DE USO COMUN | 01/01/2009 | 31/12/2015 | 35.49 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | | PUERTO | CONCLUIDAS 2015 | PUERTOS | 0809J3A0002 | -- |
| 69 | COMBURINDIO - ACCESO AL PUENTE ZIRANDARO | 01/09/2014 | 30/05/2015 | 14.40 | N/A | | 0.82 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360043 | -- |
| 70 | MODERNIZACION DEL CAMINO VILLAMAR EL PLATANAL | 01/09/2014 | 30/05/2015 | 11.94 | N/A | | 0.30 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096360026 | -- |
| 71 | PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 30/06/2015 | 31/12/2015 | 11.66 | SE REALIZO TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEL PUNTO DE CONFLICTO T. ZINAPECUARO - ZINAPECUARO | | 4.00 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 14092110006 | -- |
| 72 | MODERNIZACION DEL E.C HUETAMO-CHURUMUCO(TURITZIO- CHARACUARO) | 01/10/2014 | 06/03/2015 | 11.00 | N/A | | 4.04 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360012 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 73 | MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO MARTI MERCADO | 01/09/2014 | 10/09/2015 | 10.50 | N/A | 2.00 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360046 | -- |
| 74 | MODERNIZACION DEL CAMINO EL ENCANTO-ZIHUATZIO-ACHEROS-PURUARAN | 01/09/2014 | 20/05/2015 | 10.40 | N/A | 2.30 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360028 | -- |
| 75 | MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO-POTURO | 01/08/2014 | 16/12/2015 | 10.00 | N/A | 3.40 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360019 | -- |
| 76 | MODERNIZACION DEL CAMINO GUACAMAYAS-JUNTAS DE CHAPACARICUARO | 01/09/2014 | 12/06/2015 | 10.00 | N/A | 2.24 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360016 | -- |
| 77 | MODERNIZACION DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS-SANTA MARIA | 01/09/2014 | 31/05/2015 | 10.00 | N/A | 2.84 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096360014 | -- |
| 78 | MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA | 01/09/2014 | 03/08/2015 | 9.56 | N/A | 3.50 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360007 | -- |
| 79 | MODERNIZACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - HOYO DEL AIRE | 01/09/2014 | 15/05/2015 | 9.00 | N/A | 2.80 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360013 | -- |
| 80 | REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SENGUIO (CABECERA MUNICIPAL) - LOS REYES (ENTRONQUE TLALPUJAHUA) | 15/07/2014 | 25/03/2015 | 8.98 | N/A | 6.00 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360047 | -- |
| 81 | CONSERVACION EN TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: TINGAMBATO-SAN ANGEL ZURUMUCAPIO; TRAMO: DEL KM 0+000 AL | 29/07/2014 | 25/03/2015 | 8.73 | N/A | 9.60 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360046 | -- |
| 82 | EL ALCALDE-ACATLAN | 27/07/2015 | 21/12/2015 | 8.15 | N/A | 2.60 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360008 | -- |
| 83 | APATZINGAN-AGUILILLA, TRAMO (APATZINGAN-DIVISION DEL NORTE) | 12/03/2015 | 15/08/2015 | 7.99 | N/A | 20.00 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |
| 84 | MODERNIZACION DEL ENTRONQUE SAN SEBASTIAN SALIDA PERIBAN (LIBRAMIENTO) | 01/09/2014 | 25/03/2015 | 7.69 | N/A | 1.40 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360045 | -- |
| 85 | MODERNIZACION DEL CAMINO ZIRIMICUARO LA LAJA EMILIANO ZAPATA | 01/09/2014 | 27/07/2015 | 6.24 | N/A | 1.50 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360015 | -- |
| 86 | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO | 01/09/2014 | 25/03/2015 | 6.00 | N/A | 1.40 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360009 | -- |
| 87 | MODERNIZACION DEL CAMINO ZINAPARO - ANGAMACUTIRO | 01/09/2014 | 27/07/2015 | 6.00 | N/A | 1.20 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096360016 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 88 | (E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA | 27/07/2015 | 20/11/2015 | 5.76 | N/A | 1.52 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360044 | -- |
| 89 | MODERNIZACION DEL E.C. (ZITACUARO - TOLUCA) KM 89+000 LA CAÑADA - EL TIGRITO | 01/09/2014 | 09/06/2015 | 5.49 | N/A | 0.60 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360005 | -- |
| 90 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CERRITO DE PESCADORES | 01/09/2014 | 29/05/2015 | 5.00 | N/A | 1.00 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360039 | -- |
| 91 | CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+374 | 01/09/2014 | 29/05/2015 | 4.80 | N/A | 1.37 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360038 | -- |
| 92 | FELIPE CARRILLO PUERTO-FELIPE ANGELES-PUNTA DE AGUA-DIVISION DEL NORTE | 12/03/2015 | 01/06/2015 | 4.26 | N/A | 4.26 | CONCLUIDAS 2015 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |
| 93 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA | 30/09/2012 | 31/07/2016 | 3,656.00 | LIB. PONIENTE DE MORELIA (AUT. CUITZEO-PÁTZCUARO) SE COMPONE DEL TRAMO CAPULA-PÁTZCUARO AL 99% (EN OPERACIÓN). TRAMO CAPULA-CUITZEO AL 99% (EN OPERACIÓN). EL AVANCE FÍSICO GENERAL 99%. | 63.70 | CONCLUIDAS 2016 | AUTOPISTAS | | PNI563 |
| 94 | AUTOPISTA CUITZEO-PATZCUARO (TRAMO CAPULA-CUITZEO) | 30/09/2012 | 31/07/2016 | 2,098.00 | ESTE TRAMO PERTENECE AL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA, AHORA AUTOPISTA CUITZEO-PÁTZCUARO. EL TRAMO INICIA EN EL ENT. COPANDARO Y CONCLUYE EN ENT. CAPULA. OBRA A CARGO DE LA D.G.D.C. | 33.50 | CONCLUIDAS 2016 | AUTOPISTAS | | PNI563 |
| 95 | CHURUMUCO - ATIJO | 12/08/2015 | 28/07/2016 | 18.03 | N/A | 5.00 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360030 | -- |
| 96 | TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO 18 KM | 27/07/2015 | 04/03/2016 | 17.02 | N/A | 5.40 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360001 | -- |
| 97 | ZINAPARO ANGAMACUTIRO | 16/05/2016 | 29/09/2016 | 10.00 | EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 9.93 HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA | 2.00 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096360016 | -- |
| 98 | REHABILITACION DE CAMINO LA PIEDAD - ZARAGOZA 7 KM | 26/08/2015 | 04/01/2016 | 9.78 | | 5.00 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |
| 99 | CARRETERA NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN, TRAMO: MOJONERA - SAN ISIDRO | 27/07/2015 | 22/02/2016 | 9.59 | | 2.70 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360006 | -- |
| 100 | E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - TURITZIO - CHARACUARO | 27/07/2015 | 04/03/2016 | 9.58 | N/A | 3.46 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360012 | -- |
| 101 | CHAVINDA - ESTACION MORENO | 26/08/2015 | 20/04/2016 | 9.28 | N/A | 2.90 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 102 | COJUMATLAN-EL NOGAL | 11/08/2015 | 13/04/2016 | 8.75 | N/A | 1.96 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360001 | -- |
| 103 | E.C. SAN JERONIMO - CAÑADA DE BUENAVISTA | 27/07/2015 | 20/05/2016 | 8.59 | N/A | 2.70 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360005 | -- |
| 104 | MODERNIZACION DEL CAMINO LA CAPILLA-LA LOBERA | 01/09/2014 | 29/07/2016 | 7.97 | N/A | 2.30 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360040 | -- |
| 105 | TECOMATAN-E.C.(PAJACUARAN- LA LUZ) | 27/07/2015 | 29/09/2016 | 7.68 | ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURIDICA. | 2.68 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360003 | -- |
| 106 | LOS REYES - LOS LIMONES | 08/09/2015 | 17/02/2016 | 7.67 | | 2.20 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360028 | -- |
| 107 | RANCHO NUEVO - EL CORTIJO. | 27/07/2015 | 05/02/2016 | 7.67 | N/A | 2.20 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360010 | -- |
| 108 | E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN | 11/08/2015 | 29/04/2016 | 7.64 | N/A | 1.85 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360001 | -- |
| 109 | PUEBLO NUEVO - LA ARPITA | 27/07/2015 | 17/02/2016 | 7.41 | | 2.14 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360017 | -- |
| 110 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO (MUNICIPIO DE SENGUIO). | 20/05/2016 | 29/09/2016 | 6.00 | | 0.90 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360009 | -- |
| 111 | SAN JOSE DE GRACIA - AGUA CALIENTE | 26/08/2015 | 04/01/2016 | 5.75 | N/A | 2.60 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |
| 112 | SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS | 27/07/2015 | 29/09/2016 | 5.74 | POR CONCLUIR. | 1.90 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360028 | -- |
| 113 | REHABILITACION DEL CAMINO MARAVILLAS - EL COLEXIO 3.5 KM | 26/08/2015 | 04/01/2016 | 4.89 | N/A | 3.00 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14092100002 | -- |
| 114 | ACCESO A CERRITO DE PESCADORES | 27/07/2015 | 05/02/2016 | 3.18 | TRAMO 2015 OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00628) | 0.82 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360039 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 115 | ACCESO A FRANCISCO SARABIA | 27/07/2015 | 28/07/2016 | 2.39 | TRAMO 2015 OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00629) | 0.50 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360038 | -- |
| 116 | SAN JUANICO - CHUCANDIRAN | 27/07/2015 | 29/01/2016 | 1.43 | N/A | 0.52 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360029 | -- |
| 117 | CG-152 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JIQUILPAN - SAHUAYO | 08/10/2014 | 30/12/2016 | 1,815.00 | RAMAL A JIQUILPAN, PRIMERA ETAPA, ENT. AUT. MARAVATIO A ZAPOTLANEJO – ENT. SAHUAYO (KM. 100+000 AL 107+427.018 Y DEL KM. 202+000 AL 228+000). EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A DICHO RAMAL. | 46.00 | EN PROCESO 2016 | AUTOPISTAS | | PNI515 |
| 118 | ANILLO PERIFERICO ORIENTE DE LA PIEDAD | 01/02/2013 | 31/10/2016 | 548.10 | SE ASIGNARON 25.9 MDP EN 2016, PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA | 14.00 | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 10096360032 | PE |
| 119 | CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2016 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 346.19 | Contrato Plurianual concluye en 2018 | 647.80 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11092110001 | -- |
| 120 | CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 01/03/2016 | 30/11/2016 | 300.39 | PENDIENTE FOTOGRAFÍAS D E ACTUALIZARAN LO ANTES POSIBLE | 172.80 | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110007 | -- |
| 121 | CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 02/02/2016 | 31/12/2016 | 127.86 | PENDIENTE FOTOGRAFÍAS S E ACTUALIZARAN LO ANTES POSIBLE | 1,627.85 | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110008 | -- |
| 122 | TERMINAL GRANELERA | 01/08/2014 | 31/12/2016 | 60.00 | N/A | 1 TERMINAL | EN PROCESO 2016 | PUERTOS | 1109J3G0005 | PNI076 |
| 123 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2016 | 26/02/2016 | 17/10/2016 | 52.00 | | 38.77 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100002 | -- |
| 124 | DESARROLLO DEL PATIO FERROVIARIO INTERMODAL DE LAZARO CARDENAS | 01/12/2014 | 30/12/2016 | 47.90 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | 3.35 | EN PROCESO 2016 | FERROVIARIO | | -- |
| 125 | RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 02/05/2016 | 30/11/2016 | 35.98 | PENDIENTE FOTOGRAFÍAS SE ACTUALIZARAN LO ANTES POSIBLE | --- | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110005 | -- |
| 126 | DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES EN EL RECINTO PORTUARIO | 01/01/2009 | 31/12/2016 | 30.47 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | EDIFICIO | EN PROCESO 2016 | PUERTOS | 0809J3A0003 | -- |
| 127 | MODERNIZACION DEL CAMINO ATJO ZARATE | 01/09/2014 | 28/10/2016 | 20.00 | SE JUNTÓ LA INVERSIÓN Y FECHA DE TERMINO DE LOS TRAMOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015. UNA VEZ QUE SEA CONCLUIDO EL 2014, SE DARÁ DE ALTA EL 2015 POR SEPARADO. | 5.50 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360031 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 128 | MODERNIZACION DEL CAMINO CAPIRE DE BRAVO - ACUYO | 01/09/2014 | 30/11/2016 | 18.00 | SE JUNTÓ LA INVERSIÓN Y FECHA DE TERMINO DE LOS TRAMOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015. UNA VEZ QUE SEA CONCLUIDO EL 2014, SE DARÁ DE ALTA EL 2015 POR SEPARADO. | 2.80 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360017 | -- |
| 129 | PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 15/08/2016 | 30/11/2016 | 15.50 | | PUNTO DE CONFLICTO | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110006 | -- |
| 130 | SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA | 09/05/2016 | 04/11/2016 | 15.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 12.94 MDP Y HUBO PROGRAMA DIFERIDO | 4.50 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360044 | -- |
| 131 | E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO | 09/05/2016 | 06/10/2016 | 10.00 | EL MONTO CONTRATADO ES 10.61 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA | 2.90 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360024 | -- |
| 132 | URINGUITIRO - JUNTAS DE NANDIRO | 22/03/2016 | 15/10/2016 | 10.00 | EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 10.83 | 2.82 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360003 | -- |
| 133 | LA GUADALUPE-HOYO DEL AIRE | 20/05/2016 | 30/11/2016 | 10.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 9.57 MDP | 3.18 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360013 | -- |
| 134 | MODERNIZACION DEL CAMINO PASO DE NUÑEZ - JANINDIPO | 01/09/2014 | 30/11/2016 | 9.80 | N/A | 3.00 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360029 | -- |
| 135 | E.C. (COTIJA - LA LAGUNILLA) - PLAN DEL CERRO | 11/08/2015 | 30/12/2016 | 9.60 | ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA. | 1.50 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360021 | -- |
| 136 | LIBRAMIENTO ZINAPECUARO | 22/07/2015 | 30/12/2016 | 9.53 | ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA. | 2.40 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360032 | -- |
| 137 | CUATE-BARRANQUILLAS | 14/05/2016 | 31/12/2016 | 9.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 9.59 Y HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA | 2.80 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 13096360009 | -- |
| 138 | MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA | 26/08/2015 | 30/12/2016 | 8.13 | TRAMO 2015, OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00637) ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA. | 2.96 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360007 | -- |
| 139 | JANAMBO - STA. ROSALIMA | 13/05/2016 | 31/12/2016 | 8.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 7.64 MDP | 2.00 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360013 | -- |
| 140 | EL ALCALDE-ACATLÁN | 05/05/2016 | 30/11/2016 | 8.00 | EL MONTO CONTRATADO ES 8.49 MDP | 2.40 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360008 | -- |
| 141 | PARACUARO - JUCUTACATO | 14/05/2016 | 15/10/2016 | 8.00 | EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 7.66 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA | 2.50 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360016 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 142 | SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA | 27/07/2015 | 15/10/2016 | 7.67 | N/A | 1.34 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360002 | -- |
| 143 | LAS LETRAS-CASA BLANCA | 17/05/2016 | 15/12/2016 | 7.55 | HUBO DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA | 2.34 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360020 | -- |
| 144 | SANTA CRUZ - E.C. (PUERTA DE COENEMBO - TZIRANDANGATZIO) | 26/08/2015 | 30/11/2016 | 6.69 | EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA. | 2.50 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360031 | -- |
| 145 | MODERNIZACION DEL CAMINO TEPEHUAJE- AL ZANGARRO | 01/09/2014 | 30/11/2016 | 6.00 | ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. | 1.08 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 09096360006 | -- |
| 146 | TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO | 06/05/2016 | 30/11/2016 | 6.00 | EL MONTO CONTRATADO ES 6.67 MDP | 2.90 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360001 | -- |
| 147 | E.C. (TOMENDAN-IXTARO) TIPITARILLO | 27/07/2015 | 30/11/2016 | 5.72 | EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA. | 1.60 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360038 | -- |
| 148 | E.C HUETAMO-CHURUMUCO-(TURITZIO- CHARACUARO) | 20/05/2016 | 30/11/2016 | 5.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 4.50 | 0.40 | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 14096360012 | -- |
| 149 | CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 4.35 | PENDIENTE FOTOGRAFIAS SE ACTUALIZARAN LO ANTES POSIBLE | PUENTES | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110004 | -- |
| 150 | (E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA | 06/05/2016 | 30/11/2016 | 3.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 3.49 | 1.10 | EN PROCESO 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 14096360044 | -- |
| 151 | LOS REYES-LOS LIMONES | 06/05/2016 | 15/10/2016 | 2.00 | EL MONTO CONTRATADO ES DE 2.64 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA | 0.80 | EN PROCESO 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 12096360028 | -- |
| 152 | TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II. (ETAPA 1, FASE 1). | 01/10/2012 | 30/04/2017 | 5,282.65 | N/A | 1 TERMINAL | EN PROCESO 2017-2018 | PUERTOS | | PNI617 |
| 153 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | 01/08/2009 | 30/06/2018 | 4,800.00 | ESTA OBRA SE COMPRENDE: TRAMO: EL HABILLAL-CALETA DE CAMPOS (CONCLUIDO). TRAMO: CALETA DE CAMPOS-MARUATA, AÚN NO LICITADO. TRAMO: MARUATA - LIMITE DE ESTADOS MICH/COL. CONCLUIDOS 12.4 KMS. | 2,262.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096360003 | -- |
| 154 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COALCOMAN - ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS | 24/09/2014 | 21/02/2018 | 2,300.00 | LONGITUD TOTAL ES DE 150 KM. EN EL EJERCICIO 2014 SE CONTRATÓ Y CONCLUYÓ EL TRAMO D E 3.02 KM. CON UNA INVERSIÓN DE 22.7 MDP. | 150.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 08096360012 | PE |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 155 | AMPLIACION DE LA AUTOPISTA PATZCUARO – URUAPAN | 09/05/2015 | 30/12/2017 | 1,504.00 | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO. EN REPETIDAS OCASIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO SE HA PEDIDO INFORMACIÓN SIN TENER RESPUESTA. | 5 ENTRONQUE S | EN PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS | | PNI494 |
| 156 | LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA. | 01/08/2014 | 01/12/2018 | 1,246.40 | OBRA EN PROCESO. SE TRABAJA EN EL RAMAL CAMELINAS: TERRACERIAS, VIADUCTO, TÚNEL 1 Y TÚNEL 2 | 171.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096360009 | -- |
| 157 | CG-156 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ZITACUARO - VALLE DE BRAVO | 30/11/2015 | 31/05/2017 | 984.10 | LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA RETRASADA, PRIMERO POR LA FALTA DE APORTACIONES PENDIENTES QUE ADEUDABA EL GOB. DEL EDO. MEX. Y AHORA PORQUE SE HAN PRESENTADO CONFLICTOS CON LOS FLETEROS DE LA ZONA. | 15.00 | EN PROCESO 2017-2018 | AUTOPISTAS | NO REQUIERE | PNI428 |
| 158 | CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN - ZAMORA | 01/04/2013 | 31/12/2018 | 680.00 | OBRA EN PROCESO. DERIVADO DEL RECORTE PRESUPUESTAL, SE ESTA ENVIANDO FORMATO DE PAGO INMEDIATO, SOLICITADO POR LA DGPO PARA SOLICITUD DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA OBRA. | 38.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096360010 | PNI347 |
| 159 | PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION EN 200 KM DE CAMINOS RURALES ZONAS INDIGENAS | 20/08/2014 | 30/11/2017 | 620.00 | LOS 200 KM. EN LAS ZONAS INDÍGENAS CONSTA DE 33 CAMINOS DE LOS CUALES: SE CONCLUYO 1 EN EL EJERCICIO 2014 DE 3 KM, CON UNA INVERSIÓN DE 9.9 MDP. | 200.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360024 | -- |
| 160 | TERMINAL DE USOS MULTIPLES III. | 11/01/2013 | 31/12/2017 | 577.60 | N/A | 1 TERMINAL | EN PROCESO 2017-2018 | PUERTOS | | PNI323 |
| 161 | PROTECCION DE MARGENES PLAYERAS Y EN CANALES DE NAVEGACION. | 01/01/2001 | 15/12/2017 | 342.00 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | PUERTO | EN PROCESO 2017-2018 | PUERTOS | 0309J3A0002 | -- |
| 162 | CLUSTER LOGISTICO EN ISLA DE LA PALMA | 01/08/2014 | 30/12/2018 | 126.00 | N/A | CLUSTER LOGÍSTICO | EN PROCESO 2017-2018 | PUERTOS | | PNI473 |
| 163 | AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MORELIA | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 112.90 | LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL AEROPUERTOS, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN. | AEROPUERTO | EN PROCESO 2017-2018 | AEROPUERTOS | | PE |
| 164 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200. TR CALETA DE CAMPOS-MARUATA | 01/03/2017 | 30/06/2018 | 2,061.00 | OBRA A LA FECHA NO INICIADA, CON UNA LONGITUD DE 102.7 KMS., NO SE CUENTA CON PROYECTO DEBIDO LA PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE PÓMARO, DEL MUNICIPIO DE AQUILA. | 102.70 | PROYECTADAS 2016-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096360008 | -- |
| 165 | LIBRAMIENTO DE URUAPAN | 01/03/2017 | 01/12/2018 | 1,300.00 | OBRA A CARGO DE LA DGDC | 25.20 | PROYECTADAS 2016-2018 | AUTOPISTAS | | PNI470 |
| 166 | AEROPUERTO DE LAZARO CARDENAS | 31/10/2016 | 01/12/2018 | 1,000.00 | POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE REHABILITARA EL EDIFICIO TERMINAL Y ÁREA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS CON UNA INVERSIÓN DE 10 MDP EN CUATRO MESES DEL 1/08/16 AL 28/11/16. | -- | PROYECTADAS 2016-2018 | AEROPUERTOS | | PNI433 |
| 167 | TERMINAL ESPECIALIZADA DE AUTOS | 31/10/2016 | 31/12/2017 | 525.00 | SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE SE RESUELVA UNA INCONFORMIDAD | 1 TERMINAL | PROYECTADAS 2016-2018 | PUERTOS | | PNI309 |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Terminó | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 168 | CARRETERA SAN MARCOS - RANCHO SECO, RANCHO SECO - EL SABINO, RANCHO SECO - TAHUEJO | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 15.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 4.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 45270 | -- |
| 169 | CAYACO-HACIENDA VIEJA | 14/10/2016 | 30/12/2016 | 15.00 | ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL MES DE JULIO | 4.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360021 | -- |
| 170 | LIBRAMIENTO DE PERIBAN | 14/10/2016 | 30/12/2016 | 14.10 | ESTA PROPUESTA PARA LICITAR EN EL MES DE JULIO | 2.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 11096360024 | -- |
| 171 | EL SALITRE-EL PLATANAL | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 12.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 3.32 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46065 | -- |
| 172 | PURUARÁN - HACHEROS - EL ENCANTO | 14/10/2016 | 30/12/2016 | 12.00 | ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL MES DE JULIO | 3.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360028 | -- |
| 173 | SAN ANTONIO VILLALOGIN EL DEVANADOR | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 10.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 1.80 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 12096360003 | -- |
| 174 | JACONA - LOURDES | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 10.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.85 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46029 | -- |
| 175 | EL LIMON DE PAPTZINDAN - PURUNGUEO, TRAMO LA VIRGENCITA -PURUNGUEO | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 10.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.70 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360004 | -- |
| 176 | CONTINUACION AV. CEDRON TRAMO: CASETA CERRO VERDE / PANTEON LA JOYA 3 KM | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 9.70 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 3.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46052 | -- |
| 177 | MONTE GRANDE - IXTARO TRAMO CANTERA - IXTARO TOMENDAN | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 8.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.50 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360002 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Terminó | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|--|--------------|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 178 | ARROYO SECO - MONTECILLOS | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 8.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.50 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360003 | -- |
| 179 | SAN RAFAEL TECARIO - SAN RAFAEL CUTZARONDIRO | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 8.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.50 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46033 | -- |
| 180 | ENTRONQUE PROCESIONAL EL BARRIO - EL FLECHERO | 14/10/2016 | 30/12/2016 | 7.00 | ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL MES DE JULIO | 1.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 10096360019 | -- |
| 181 | SAN ANTONIO - LAS HUERTAS - LAS PILAS | 16/03/2017 | 31/05/2017 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 1.10 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46044 | -- |
| 182 | LA PALMA - SAN JUAN BENITO JUAREZ | 16/03/2017 | 31/05/2017 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 1.30 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | | -- |
| 183 | CONCLUSION DE LA CARRETERA SANTA CATARINA - TICUITACO 4 KM | 28/10/2016 | 30/12/2016 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO | 1.40 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46054 | -- |
| 184 | E.C. ACUITZIO DEL CANJE-VILLA MADERO A ZIPARAPIO EL ALTO | 16/03/2017 | 31/05/2017 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017. | 2.00 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15096360005 | -- |
| 185 | TACUPA - CHARACHARANDO 7 KM | 27/10/2016 | 30/12/2016 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO | 1.90 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46050 | -- |
| 186 | LA PALMA - LA ANGOSTURA | 28/10/2016 | 30/12/2016 | 6.00 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO | 1.80 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46057 | -- |

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUBLICADO |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 187 | CONST. PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN TRAMO CARRETERO PATAMBO - AGUA AGRIA | 27/10/2016 | 30/12/2016 | 3.50 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO | PUENTE | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46041 | -- |
| 188 | LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO (EL ORO) - TEPETONGO (NOPALERA - TEPETONGO) | 28/10/2016 | 30/12/2016 | 2.70 | LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO | 0.80 | PROYECTADAS 2016-2018 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 46053 | -- |
