




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
SINALOYA**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**


OCTUBRE 2016



SCT SINALOA 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

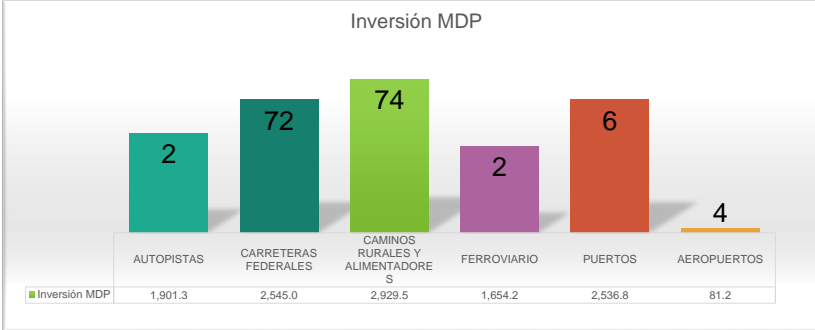

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

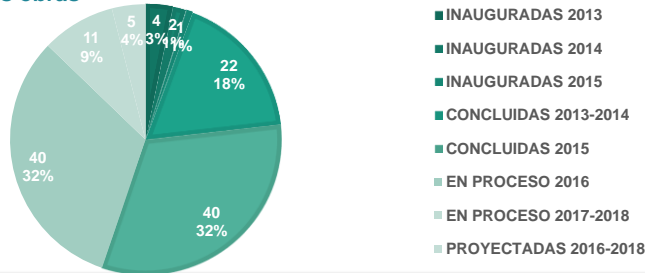

Obras

MDP

Km

A la fecha, la SCT invierte

160

11,648.1

12,364.4

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	1,901.34	45.00	0
INAUGURADAS 2015	1	1,758.00	38.00	0
CONCLUIDAS 2015	1	143.34	7.00	0
CARRETERAS FEDERALES	72	2,545.02	8,663.94	0
INAUGURADAS 2013	4	311.90	3.78	0
CONCLUIDAS 2013-2014	5	733.04	16.54	0
CONCLUIDAS 2015	19	494.46	6,046.83	0
EN PROCESO 2016	24	552.39	2,426.42	0
EN PROCESO 2017-2018	1	311.00	9.00	0
CONCLUIDAS 2016	19	142.23	161.37	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	74	2,929.52	3,627.80	0
INAUGURADAS 2014	1	21.93	8.00	0
CONCLUIDAS 2013-2014	15	498.99	98.67	0
CONCLUIDAS 2015	20	566.83	177.80	0
EN PROCESO 2016	16	168.81	37.58	0
EN PROCESO 2017-2018	6	1,421.27	2,855.00	0
CONCLUIDAS 2016	16	251.69	450.75	0
FERROVIARIO	2	1,654.23	26.60	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	28.23	2.40	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1,626.00	24.20	0
PUERTOS	6	2,536.80	1.05	0
INAUGURADAS 2014	1	200.00	0.11	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	70.00	-	0
EN PROCESO 2017-2018	1	1,389.00	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	3	877.80	0.94	0
AEROPUERTOS	4	81.23	-	0
EN PROCESO 2017-2018	3	71.23	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	10.00	-	0
Total general	160	11,648.14	12,364.39	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		251,407.0	251,407.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		251,407.0	251,407.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL		231,853.0	231,853.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		18.0	18.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		18.0	18.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	51.40	51.52	48.30	151.22
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	18	18	17	18
JORNALES	609,272	571,062	476,950	1,657,284
BENEFICIARIOS	14,687	16,186	7,210	38,083
LONGITUD CAMINOS	1,269.89	1,151.10	401	2,420.99

Fecha de recepción: Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: SCT.6.24.01.-2408/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/520/2016 enviado por la DGAPDCST

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,954			1,954
INMUEBLES ESCOLARES	1,608			1,608
CENTROS DE SALUD	150			150
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	117			117
OFICINAS DE GOBIERNO	74			74
ESPACIOS PÚBLICOS	4			4
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	1			1

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	INSTALACIÓN PARA CONCENTRADO DE COBRE EN TOPOLOBAMPO.	30/01/2017	30/12/2017	423.80	OBRA SUSPENDIDA	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		PNI268
2	LIBRAMIENTO FERROVIARIO CULIACAN	30/01/2017	31/12/2018	1,626.00	NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2015	24.20	PROYECTADAS 2016-2018	FERROVIARIO	14093110018	PE
3	OBRA DE ATRAQUE SUR EN TERMINAL DE TRANSBORDADORES	30/01/2017	29/12/2017	154.00	N/A	0.13	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		--
4	REPARACION DEL ROMPEOLAS DEL CRESTON Y CHIVO:	42736	dic-18	300.00		0.81	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS	1109J2T0005	--
5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CULIACAN.	01/01/2017	31/12/2018	10.00		1 TANQUE	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE
6	CULIACAN – PARRAL (ESTADOS: SINALOA - CHIHUAHUA)	01/12/2013	01/11/2017	768.87	DE 2004 HASTA 2012 SE INVIRTIERON 463.47 MDP EN 74.0 KMS Y EN 2014 SE INVIRTIÓ 52.86 MDP EN 8.0 KMS HASTA NIVEL BASE . EN 2015 SE EJERCIERON 8.0 MDP EN ADEUDO DE 2014.	140.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096450004	PE
7	AMPLIACION DEL AEROPUERTO CULIACAN	01/08/2016	31/12/2018	18.30	N/A	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI016
8	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MAZATLAN	42583	dic-18	23.43	N/A	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI005
9	MODERNIZACION DEL PUERTO DE MAZATLAN	01/10/2013	31/12/2018	1,389.00	N/A	PUERTO	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	1209J2T0003	PNI661
10	EJE INTERREGIONAL: TOPOLOBAMPO – CHIHUAHUA; TRAMO: SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX.	16/04/2010	31/12/2018	534.39	2010-38.95 MDP; 2011-119.48 MDP; 2012-38.41 MDP; 2013-15.43 MDP; 2014-17.80 MDP; 2015-SIN RECURSOS, 2016-76.8 MDP.	906.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096450009	--
11	E.C. CULIACAN-SANALONA-ALCOYONQUI- E.C. A LO DE BARTOLO.	01/08/2013	31/12/2018	37.85	EN 2013 SE INVIRTIERON 24.95 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 4.15 MDP. EN 2015 NO SE ASIGNARON RECURSOS.	920.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	1309640009	--
12	E.C.F. MEXICO NO. 15 - LOMA DE TECUYO	01/05/2013	31/12/2018	37.77	EN 2013 SE INVIRTIERON 6.45 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 8.85 MDP. EN 2015 NO SE ASIGNARON RECURSOS.	850.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450015	--
13	CALLE 6, TRAMO MEXICO 15- CANAL ALTO	01/06/2012	31/12/2018	27.85	EN 2012 SE INVIRTIERON 9.60 MDP. EN 2014 SE INVIRTIERON 4.50 MDP EN 2015 SE REASIGNO RECURSO A GOBIERNO DEL ESTADO POR 5.88 MDP EN 2016 SE TIENEN ASIGNADOS 7.87 MDP PARA EJECUTARSE POR ESTE CENTRO	2.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450018	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
14	CINCO HERMANOS - CASA BLANCA.	01/03/2014	01/12/2018	14.54	EN 2014 SE INVIRTIERON 6.76 MDP. EN 2015 NO SE ASIGNARON RECURSOS.	37.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450025	--
15	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LOS MOCHIS	01/01/2015	01/01/2018	29.50	N/A	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		--
16	MODERNIZACION ENTRONQUE MEXICO 15-AHOME	41913	dic-16	375.00	OBRA EN PROCESO: PRIMERA ETAPA CON UNA INVERSIÓN DE 55.5 MDP, CONCLUIDA; SEGUNDA ETAPA CON UNA INVERSIÓN DE 111.7 MDP, CONCLUIDA; TERCERA ETAPA CON UNA INVERSIÓN DE 65.0 MDP, CONCLUIDA.	9.2	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	12096450020	--
17	E.C. CULIACÁN-HUIZACHES-ANTORCHISTA	16/02/2016	30/10/2016	6.50	OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE	1.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
18	CSV RUT 83.87 KM TEPIC-MAZATLÁN	16/02/2016	30/11/2016	5.66	OBRA CONTRATADA 201625CBA006W002016, LATITUD DE TERMINO: 23.0264 Y LONGITUD: -105.92537.	83.87	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
19	CSV RUT PTES 123 KM TEPIC-MAZATLÁN, DURANGO-MAZATLÁN Y MAZATLAN-CULIACÁN	16/02/2016	30/11/2016	1.89	OBRA CONTRATADA 201625CBA007W002016, CON LATITUD DE TERMINO 23.26387 Y LONGITUD DE TERMINO -106.41369	123 PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	--
20	CSV RUT 96.00 KM TEPIC-MAZATLÁN	42416	nov-16	5.44	OBRA CONTRATADA 201625CBA008W002016, CON LATITUD DE TERMINO 23.26387 Y LONGITUD DE TERMINO -106.41369	4.9	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
21	E.C. (EL FUERTE-CHOIX) EL BABU-BAYMENA	19/04/2016	30/10/2016	9.21		1.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096450009	--
22	CSV RUT 95.9 KM DURANGO-MAZATLAN	42537	nov-16	6.98		95.9	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
23	CSV RUT 119.75 KM MAZATLAN-CULIACAN	42537	nov-16	6.41		119.75	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
24	CSV RUT 137.074 KM MAZATLAN-CULIACAN	16/06/2016	30/11/2016	7.34		137.07	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
25	CSV RUT 68.935 KM MAZATLAN-CULIACAN	16/06/2016	30/11/2016	3.69		68.94	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
26	CSV RUT 88.20 KM PERICOS-PARRAL	16/06/2016	30/11/2016	4.72		88.20	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
27	CSV RUT 84.077 KM CULIACAN-LOS MOCHIS	42537	nov-16	4.50		84.077	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
28	CSV RUT 127.568 KM LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO	16/06/2016	30/11/2016	6.83		127.57	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
29	CSV RUT 137.972 KM LOS MOCHIS-CIUDAD OBREGON	42537	nov-16	7.39		137.972	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
30	E.C. MEXICO 15-15 DE SEPTIEMBRE-COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	01/03/2016	30/10/2016	9.60		2.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450004	--
31	PUENTE EL QUELITE - MARMOL	16/04/2016	15/11/2016	19.20		10.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450015	--
32	E.C. MEXICO 15-RANCHO VIEJO-ENTRONQUE AUSTOPISTA BENITO JUAREZ	16/04/2016	15/11/2016	14.40		3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096450007	--
33	5 HERMANOS-CASAS BLANCAS	02/05/2016	01/12/2016	4.80		1.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450025	--
34	VILLA MORELOS-LA CURVA	02/05/2016	01/12/2016	2.30		0.52	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450020	--
35	PUENTE ULTIMO VADO	16/04/2016	15/11/2016	14.40		PUENTE	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450006	--
36	PUENTE LAS HABITAS	42476	nov-16	14.40		PUENTE	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALI	14096450005	--
37	E.C. (INTERNACIONAL MÉXICO 15-SAN JOSÉ DE LA BRECHA)-PLAYA BUENA VISTA	16/04/2016	15/11/2016	10.52		3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450014	--
38	CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE UBICADO EN EL CAMINO E.C. MÉXICO 15-MOCORITO-EL VALLE	16/04/2016	15/11/2016	4.80		0.06	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450019	--
39	LIBRAMIENTO DE ESCUINAPA	42614	dic-18	311.00		9	EN PROCESO 2017-	CARRETERAS FEDERALES	12092100007	--
40	E.C. PERICOS-RECOVECO-ESTACION RETES	04/07/2016	02/11/2016	8.30		4.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
41	RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO	16/06/2016	30/11/2016	24.19		49.47	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
42	CONSTRUCCIÓN DE 5 PARADEROS DE AUTOBUSES	16/06/2016	14/10/2016	1.48		26.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
43	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 166 PUENTES	16/06/2016	30/11/2016	2.18		PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	--
44	SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	16/06/2016	31/12/2016	4.12		696.60	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES		--
45	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES	16/06/2016	31/12/2016	7.37		696.90	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES		--
46	ESCUINAPA - TEACAPAN	01/08/2016	31/10/2016	11.46		2.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
47	MÉXICO 15 - EL RECODO	01/08/2016	31/10/2016	11.08		3.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
48	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	16/07/2016	15/11/2016	10.79		4.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
49	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECICLADO EN PLANTA EN CALIENTE (RAP)	01/08/2016	01/12/2016	17.05		--	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/08/2016	08/11/2016	9.00		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/08/2016	08/11/2016	9.00		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/08/2016	08/11/2016	10.00		SEÑALAMIENTO VERTICAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
53	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES, RUIZ CORTINEZ NO. 3	01/09/2016	09/12/2016	8.00		PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	--
54	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTES EN RECUPERACION DE PAVIMENTO Y CARPETA	01/09/2016	24/12/2016	28.00		--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
55	TRABAJOS DE CONSERVACION PERIÓDICA CONSISTENTES EN RENIVELACIONES DE TRAMOS AISLADOS	12/09/2016	30/11/2016	8.20		--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
56	TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	12/09/2016	15/11/2016	5.00		--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
57	LIBRAMIENTO MAZATLAN DE CUOTA	01/02/2012	31/12/2014	1,758.00	INAUGURADA 29-ABR-15	38.00	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS	CONCESION	PNI488
58	PASO DEPRIMIDO JESUS KUMATE	08/10/2012	29/10/2013	108.70	INAUGURADA 01-NOV-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.48	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450022	--
59	PSV ENTRADA NORTE DE MAZATLAN	01/10/2012	31/07/2013	145.00	NO ES SUSCEPTIBLE DE INAUGURAR OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN	0.58	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	10096450015	--
60	PASO DEPRIMIDO ENTRE LOS BOULEVARES LOLA BELTRAN Y ROLANDO ARJONA	08/10/2012	15/09/2013	114.00	INAUGURADA 01-SEP-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL	0.47	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450021	--
61	BADIRAGUATO-SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	01/06/2014	31/03/2015	89.30	SE REALIZO CONTRATO POR 89.3 MDP PARA 8.0 KMS DE LOS CUALES SE EJERCIERON SOLO 47.12 MDP YA QUE LA SHCP REALIZO UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS.EN 2015 SE PAGO ADEUDO 2014 POR 8.13 MDP	8.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096450004	--
62	CONSTRUCCION DEL MUELLE PARA CRUCEROS	04/02/2013	10/03/2014	70.00		400 M2	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		--
63	CARRETERA MEXICO 15 - EL MORAL.	01/05/2013	01/09/2013	4.00		0.78	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450011	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
64	PASO DEPRIMIDO VILLAS DEL RIO.	16/07/2013	30/11/2013	29.40	INAUGURADA 01-NOV-13 POR GOBERNADOR DEL ESTADO Y PRESIDENTE MUNICIPAL	0.60	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096450027	--
65	PUENTE: PORTACELI	01/11/2012	01/12/2013	30.00	N/A	0.27	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450019	--
66	E.C.F. MEXICO 15 - BEBELAMA DE SAN LORENZO.	01/08/2013	01/12/2013	14.06	N/A	2.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450004	--
67	ENTRONQUE CARRETERA MEXICO 15 BLVD. LOLA BELTRAN.	09/09/2013	23/12/2013	59.80	INAUGURADA 22-DIC-13 POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	2.23	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	13096450022	--
68	CARRETERA ANGOSTURA-SALVADOR ALVARADO.	01/05/2013	01/12/2013	34.08	N/A	3.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13096450015	--
69	INSTALACION PARA GRANEL AGRICOLA TOPOLOBAMPO	01/09/2013	30/11/2014	200.00	INAUGURADA 09-DIC-14	0.11	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	0609J2W0009	PNI082
70	IMALA - SANALONA.	01/04/2013	01/06/2014	56.69	N/A	9.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450001	--
71	VILLA UNION LA AMAPA	01/06/2013	01/06/2014	60.09		13.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450002	--
72	DIMAS - BARRAS DE PIAXTLA	01/05/2013	01/06/2014	41.15	2013: 3.2 KMS Y 8.51 MDP 2014: 2.5 KMS Y 10.2 MDP	8.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450029	--
73	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ARRAYANES CHELE.	01/10/2013	01/06/2014	21.46	AÑO 2013 SE INVIRTIERON 6.07 MDP. AÑO 2014 SE INVIRTIERON 10.35 MDP	0.12	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450010	--
74	E.C. NAVOLATO- EL CASTILLO-LA CURVA- SAN PEDRO	22/04/2014	21/08/2014	21.93	RECURSOS FONDEN	8.00	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
75	EL VERGEL - COL. HIDALGO - LAS AGUAMITAS	05/05/2014	04/09/2014	19.29	FONDOS FONDEN	7.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
76	CAIMANERO-EL TIGRE- CONSTITUYENTES- COL. INDEPENDENCIA	22/05/2014	31/03/2015	74.70	FONDOS FONDEN	28.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
77	CARRETERA: CULIACAN – LOS MOCHIS TRAMO: ACCESO NORTE DE CULIACAN DEL KM. 13+900 AL KM. 16+000	16/04/2014	30/11/2014	70.50		2.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	10096450008	--
78	E.C. ANGOSTURA - GUAMUCHIL – PROTOMARTIR	16/05/2014	31/03/2015	64.63	FONDOS FONDEN	23.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
79	SAN PEDRO- NAVOLATO	01/05/2014	01/12/2014	76.50	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE.	14.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
80	CULIACAN-NAVOLATO (TR. CULIACAN-SAN PEDRO) 0+000 – 9+000	16/05/2014	15/09/2014	56.06	RECURSOS FONDEN	9.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
81	E.C. ANGOSTURA- LA REFORMA- COSTA AZUL	16/05/2014	31/03/2015	41.27	FONDOS FONDEN	15.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
82	PUENTE RIO BALUARTE CARRETERA: TEPIC – MAZATLAN, TRAMO: LIM.EDOS.NAY./SIN.-MAZATLAN KM. 221+278	01/11/2013	30/11/2014	268.46		0.72	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13092110006	--
83	AUTOPISTA BENITO JUAREZ CUERPO A KM.107+000 AL 110+00	05/08/2014	28/02/2015	143.34	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE	7.00	CONCLUIDAS 2015	AUTOPISTAS		--
84	SINALOA DE LEYVA- OCORONI	04/08/2014	15/02/2015	69.70	FONDOS FONDEN	25.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
85	PROTOMARTIR-GATO DE LARA	18/08/2014	15/01/2015	41.92	FONDOS FONDEN ACTAS EN TRAMITE	14.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
86	BACHIMETO-ROSA MORADA	18/08/2014	18/12/2014	31.20	FONDOS FONDEN	11.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--
87	CONSTRUCCION TAMAZULA EL AMOLE.	01/08/2013	01/08/2014	27.90	INVERSIÓN 2013: 7.78 MDP 2.4 KMS 2014: 9.91 MDP 2.2 KMS 2015: 3.2 MDP TRANSFERIDOS A GOBIERNO DEL ESTADO	6.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450014	--
88	VILLA MORELOS - LA CURVA (5.9 KM).	01/09/2013	01/06/2014	24.06	INVERSIÓN 2013: 10.56 MDP Y 4.0 KMS 2014: 6.60 MDP Y 4.0 KMS	5.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450020	--
89	EL PROGRESO-EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	01/05/2012	01/08/2014	17.99	AÑO 2012 SE INVIRTIERON 12.17 MDP PARA 3.0 KMS. AÑO 2014 SE INVIRTIO 4.5 MDP PARA 1.2 KMS.	4.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450008	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
90	E.C. INTERNACIONAL MEXICO 15 - LOS ANGELES DEL TRIUNFO	01/05/2012	01/08/2014	18.54	INVERSION 2012: 8.6 MDP 2.6 KMS INVERSION 2014: 4.9 MDP 1.4 KMS INVERSION 2015 MEDIANTE CONVENIO DE REASIGNACION A GOB. DEL ESTADO: 4.9 MDP .7 KMS	5.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450006	--
91	CONSTRUCCION DE ESPUELAS PARA FFCC	18/03/2014	30/12/2014	28.23	N/A	2.40	CONCLUIDAS 2013-2014	FERROVIARIO	1109J2W0006	--
92	CULIACAN-SANALONA DEL KM 19+800 AL KM 23+000.	24/03/2015	21/07/2015	12.76	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
93	E.C. INT. - COMPUERTAS -E.C. L.M.-AHOME DEL KM 2+000 AL KM 5+400.	24/03/2015	21/07/2015	12.11	N/A	3.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
94	MEXICO 15 -SAN IGNACIO DEL KM 0+000 AL KM 6+100 EN TRAMOS AISLADOS;	16/03/2015	13/07/2015	12.41	N/A	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
95	VILLA UNION-WALAMO-LOS POZOS DEL KM 4+500 AL KM 10+500 T.A.	25/03/2015	22/07/2015	12.76		3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
96	CULIACANCITO - ENTRONQUE A EL TAMARINDO DEL KM 8+800 AL KM 12+300.	24/03/2015	21/07/2015	11.88	N/A	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
97	E.C.(MEX 15-EST. DIMAS)-PIAXTLA DE ABAJO DEL Y MEXICO 15-ESTACION DIMAS DEL KM 13+500 AL KM 16+200.	25/03/2015	22/07/2015	11.56	N/A	3.90	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
98	MEXICO 15 - ESTACION DIMAS DEL KM 17+800 AL KM 21+800 ; MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA	25/03/2015	22/07/2015	11.44	NA.	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
99	MEXICO 15-EJ. 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 2+000 AL KM 5+700	27/03/2015	24/07/2015	11.09	NA.	3.70	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
100	BARRERA DE PROTECCION PARA NIVEL DE CONTENCIÓN 4 O SUPERIOR, EN RED FEDERAL DE CARRETERAS 5350 M	01/04/2015	15/10/2015	7.48		5449.0 M.L.	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, 1RA. ETAPA.	01/04/2015	15/10/2015	6.25		139.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, 2DA. ETAPA.	01/04/2015	15/10/2015	6.28		139.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
103	CONSERVACION DE TRAMOS, TR LIM. NAY./SIN-MAZATLAN, CARRETERA TEPIC-MAZATLAN	16/02/2015	30/11/2015	5.53		83.87	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
104	CONSERVACION DE TRAMOS EN 92.40 KM,TR LIM. DGO./SIN. - ENT. VILLA UNION, CARRETERA DURANGO -	16/02/2015	30/11/2015	4.98		92.40	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
105	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE DE SINALOA	01/04/2015	15/10/2015	5.01		5,400.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
106	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS EN 95.9 KM,TR LIM.DGO/SIN.-ENT.VILLA UNION, CARRETERA DGO-MAZATLAN.	16/02/2015	30/11/2015	3.96		95.90	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
107	CONSERVACION DE 37.50 KM. DE RED SECUNDARIA,TR PERICOS-BADIRAGUATO CARRETERA PERICOS-PARRAL +	16/02/2015	30/11/2015	2.30		37.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	--
108	CONSERVACION EN 40 PUENTES, TRAMOS LIM.NAY./SIN. CARRETERA TEPIC-MAZATLAN,	16/04/2015	30/11/2015	0.79		40 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110005	--
109	PSV GABRIEL LEYVA	01/06/2015	31/12/2015	100.30		1.40	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096450014	--
110	PSV ENTRADA SUR MAZATLAN	01/06/2015	31/12/2015	94.40		1.10	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096450013	--
111	TRABAJOS FALTANTES PIV PEDRO INFANTE	16/04/2015	10/11/2015	126.40		0.44	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092100005	--
112	RENIVELACION Y MICROCARPETA PASO POR EL BURRION	16/04/2015	15/07/2015	6.14		5.60	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
113	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUASAVE-LAS GLORIAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+200	01/06/2015	30/06/2016	67.70	OBRA CON RECURSOS FONDEN	29.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
114	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN FRESADO Y CARPETA DE 10.0 CM, TR LIM. DGO./SIN-T VILLA UNION	16/04/2015	15/10/2015	45.46		18.20	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
115	CONSERVACION PERIODICA CONSISTENTE EN BACHEO Y CARPETA DE 10.0 CM., TRAMO LIM. NAY./SIN.-MAZATLAN,	29/04/2015	13/10/2015	31.18		13.30	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
116	CONSERVACION PERIODICA , TRAMO LIM. DGO./SIN. - T VILLA UNION,	12/05/2015	11/10/2015	26.18		10.80	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
117	EJIDO PLAN DE SAN LUIS-BACHOMOBAMPO 2	01/07/2015	15/11/2015	12.66		8.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
118	ACCESO AL QUELITE ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 AL POBLADO DEL QUELITE	01/09/2015	30/11/2015	12.49		5.10	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
119	PLAYA COLORADA-EL EBANO	01/09/2015	30/11/2015	9.50		2.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
120	GUASAVE-TAMAZULA	01/09/2015	30/11/2015	20.64		6.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
121	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	01/09/2015	30/11/2015	13.52		7.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
122	AGUARUTO-SAN MANUEL-AUTOPISTA (CULIACÁN-MAZATLÁN)	01/09/2015	30/11/2015	20.49		6.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
123	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CONSISTENTE EN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE GRANULOMETRÍA DENSA EN T.A. DEL KM 162+555 AL KM 179+000, TRAMO: LIM. EDOS. NAY./SIN.- MAZATLÁN, CON UNA META DE 1.59 KM	16/07/2015	31/07/2015	2.27		1.59	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
124	CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 5.0 CM COMPACTOS DEL KM 171+920 AL KM 175+380 Y DEL KM 177+075 AL KM. 177+346 CUERPO "A" DE LA CARRETERA CULIACÁN – LOS MOCHIS CON UNA META DE 5.73 KM,	01/09/2015	31/10/2015	12.15		5.73	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	--
125	ACCESO NORTE KM 4+460 AL 13+900	16/10/2010	30/11/2013	215.00		9.44	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	12096450020	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
126	TRABAJOS DE ATENCIÓN A DOS PUNTOS DE CONFLICTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES, PUENTE JUAN JOSÉ RÍOS Y PUENTE LEYVA SOLANO	16/11/2015	31/12/2015	7.40		2 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	--
127	E.C. INT. COMPUERTAS-E.C. L.M.-AHOME	16/02/2016	30/06/2016	12.48		1.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
128	MÉXICO 15-PENINSULA DE VILLAMOROS	16/04/2016	15/09/2016	9.50		3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
129	MÉXICO 15-EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	16/02/2016	30/06/2016	10.50		2.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
130	CULIACÁN-SANALONA	16/02/2016	30/06/2016	10.20		3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
131	FRESADO Y MICROCARPETA DE 3.0 CM.	23/03/2016	30/06/2016	7.51		8.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
132	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	26/06/2016	6.44		23.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
133	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	26/06/2016	6.54		21.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
134	MICROCARPETA DE 3.0 CM.	29/03/2016	11/06/2016	5.10		7.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
135	RIEGO DE SELLO	31/03/2016	14/07/2016	5.46		17.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
136	RIEGO DE SELLO	29/03/2016	11/06/2016	4.45		12.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
137	RIEGO DE SELLO	31/03/2016	29/05/2016	3.72		9.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
138	MOCORITO-SAN BENITO	01/03/2016	31/08/2016	9.60		14.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450005	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
139	CALLE 5,, TRAMO: E.C. INT. MÉXICO 15-CALLE 300	01/03/2016	31/08/2016	9.21		2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096450016	--
140	ALCOYONQUI-LAS FLECHAS	01/03/2016	14/09/2016	21.12		4.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096450003	--
141	Badiraguato-Santiago de los Caballeros	16/03/2016	29/09/2016	28.00		107.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096450004	--
142	ILAMA- HIGUERAS DE JACOBA, TRAMO LA ILAMA - LA PRESA.	01/03/2016	04/10/2016	20.00		4.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096450015	--
143	Angostura-Guamuchil	18/03/2016	03/10/2016	19.20		1.95	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450002	--
144	CALLE 800, VALLE DEL CARRIZO	01/03/2016	31/08/2016	7.68		2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096450012	--
145	CINCO DE MAYO-JUAN ALDAMA	01/03/2016	31/08/2016	9.60		3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096450017	--
146	TAMAZULA EL AMOLE	01/03/2016	31/08/2016	2.80		0.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096450014	--
147	ROSA MORADA-AGUA PEPITO	01/03/2016	31/08/2016	9.60		2.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096450002	--
148	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	15/02/2016	13/07/2016	7.38		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
149	SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/03/2016	28/07/2016	2.51		SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
150	BARRERA DE PROTECCIÓN	16/03/2016	28/07/2016	1.31		BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
151	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM	18/04/2016	17/08/2016	27.85		17.40	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
152	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE AMPLIACIÓN TRANSVERSAL	01/05/2016	15/08/2016	3.47		1 PUENTE	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	--
153	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUSTITUCIÓN DEL PRESFUERZO LONGITUDINAL EXTERNO	01/05/2016	30/07/2016	3.44		1 PUENTE	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SINALOA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
154	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	01/05/2016	14/08/2016	17.75		11.42	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
155	FRESADO Y CARPETA DE 5.0 CM.	01/05/2016	14/08/2016	16.22		7.60	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
156	CONSERVACIÓN RUTINARIA AHOME, FUERTE, CHOIX	16/02/2016	30/06/2016	4.50		270.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
157	FRESADO Y MICROCARPETA	16/06/2016	31/07/2016	2.50		1.20	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
158	FRESADO DE 5.0 CM Y CARPETA DE 5.0 CM	16/06/2016	30/08/2016	3.81		3.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
159	FRESADO DE 10.0 CM Y CARPETA DE 10.0 CM	16/06/2016	15/09/2016	10.82		9.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
160	RENIVELACIONES AISLADAS Y RIEGO DE SELLO	16/06/2016	14/09/2016	5.95		13.25	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
