



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
CAMPECHE**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**OCTUBRE 2016**


SCT CAMPECHE 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Obras MDP Km


A la fecha, la SCT invierte **41** **12,038.0** **3,332.0**

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

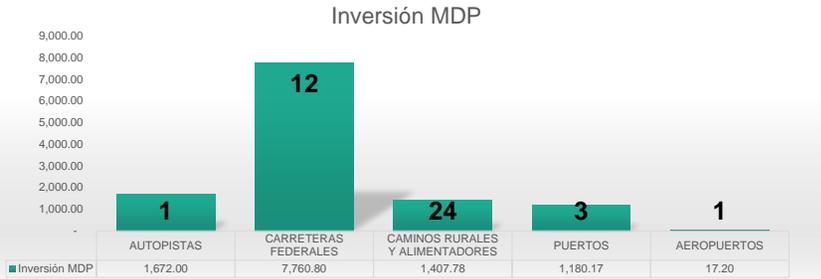

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

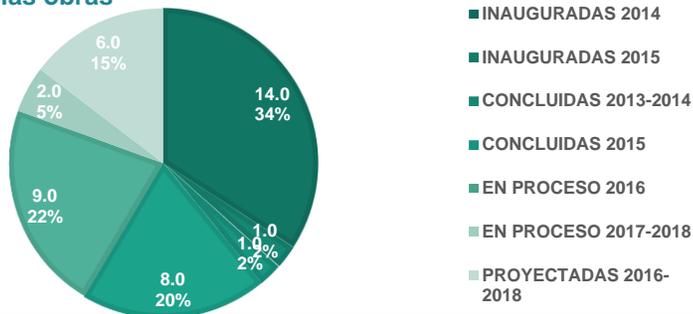

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>1</b>	<b>1,672.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0</b>
PROYECTADAS 2016-2018	1	1,672.00	12.00	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>12</b>	<b>7,760.80</b>	<b>1,404.40</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	3	752.90	5.40	0
INAUGURADAS 2015	1	1,650.00	26.30	1
CONCLUIDAS 2015	1	90.60	-	0
EN PROCESO 2016	2	412.30	1,313.50	0
PROYECTADAS 2016-2018	4	4,355.00	42.70	0
EN PROCESO 2017-2018	1	500.00	16.50	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>24</b>	<b>1,407.78</b>	<b>1,915.51</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2014	11	111.39	144.06	0
CONCLUIDAS 2015	6	588.79	950.25	0
EN PROCESO 2016	6	657.60	809.20	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	50.00	12.00	0
<b>PUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>1,180.17</b>	<b>0.12</b>	<b>2</b>
CONCLUIDAS 2013-2014	1	18.79	-	0
EN PROCESO 2016	1	183.11	-	1
EN PROCESO 2017-2018	1	978.27	0.12	1
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>17.20</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2015	1	17.20	-	0
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>12,037.95</b>	<b>3,332.03</b>	<b>3</b>

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



1 AUTOPISTAS



12 CARRETERAS



24 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



3 PUERTOS



1 AEROPUERTOS

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		78,905.0	78,905.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		78,905.0	78,905.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		44,146.0	44,146.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS ENTREGADOS		7.0	7.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS		10.0	10.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	32.41	33.14	27.80	93.35
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	11	11	11	11
JORNALES	363,535	345,622	288,599	997,756
BENEFICIARIOS	6,511	5,793	4,373	16,677
LONGITUD	823.71	772.00		1,595.71
CAMINOS				

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
<b>INVERSIÓN</b>				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	612			612
INMUEBLES ESCOLARES	442			442
CENTROS DE SALUD	90			90
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	56			56
OFICINAS DE GOBIERNO	14			14
ESPACIOS PÚBLICOS	7			7
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3			3

Fecha de recepción: Jueves, 8 de septiembre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.4.418.031 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el Martes, 30 de agosto de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-434/2016 enviado por la DGAPDCST

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFERICO DE CAMPECHE	01/08/2012	01/12/2013	393.40	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	10096240004; 12096240001	--
2	CONSTRUCCION DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES, CARRETERA CAMPECHE – MERIDA	01/04/2013	01/12/2013	254.00	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	08096240011	--
3	AV HEROE DE NACUZARI (RAMAL AEROPUERTO DE CAMPECHE)	01/07/2013	01/03/2014	105.50	INAUGURADA 31-OCT-14	5.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003 10096240004	--
4	MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)- DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL	01/04/2013	01/10/2013	15.98	INAUGURADA 31-OCT-14	5.42	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	--
5	CAMINO NUEVA VIDA - UNION 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM	01/04/2013	01/10/2013	14.32	INAUGURADA 31-OCT-14	22.70	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
6	CONSERVACION DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MUJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600	01/04/2013	01/10/2013	11.87	INAUGURADA 31-OCT-14	16.60	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
7	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580	01/04/2013	01/11/2013	11.44	INAUGURADA 31-OCT-14	9.58	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
8	ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	01/04/2013	01/11/2013	11.16	INAUGURADA 31-OCT-14	20.76	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
9	CONSERVACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	01/05/2013	01/10/2013	10.91	INAUGURADA 31-OCT-14	12.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
10	CONSERVACION DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNION - LA PAZ.	01/05/2013	01/10/2013	10.40	INAUGURADA 31-OCT-14	14.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
11	E.C- CHAMP. – CAMP. – EL ZAPOTE – SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.)	01/07/2013	01/11/2013	8.43	INAUGURADA 31-OCT-14	22.10	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
12	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	01/05/2013	01/10/2013	8.17	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
13	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HECTOR PEREZ MORALES	01/05/2013	01/10/2013	5.38	INAUGURADA 31-OCT-14	5.90	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
14	CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.)	01/07/2013	01/11/2013	3.33	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
15	CG-062 AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE	01/12/2012	25/09/2015	1,650.00	INAUGURADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015. ESTA OBRA SE FUSIONO CON EL ID OB_SCT_01206, PARA CONVERTIRSE EN EL CG-062, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM. CGPG/STG/108/2016 DE FECHA 4/JUL/2016	26.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096240001	PNI479
16	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO EN BOCA CHICA, CAMPECHE.	01/04/2014	01/10/2014	18.79	N/A	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		--
17	CONSERVACION DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/02/2015	30/12/2015	378.79	LA CONSERVACIÓN SE APLICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	902.15	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
18	CAMPECHE - MERIDA, DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE	01/03/2013	31/12/2015	90.60	N/A	1 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096240001	PNI340
19	XPUJIL - DZIBALCHEN (TR: X-CANHA - DZILBACHEN)	01/08/2015	30/12/2015	60.00	N/A	17.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240005	--
20	SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO - E.C (NUEVA COAHUILA - EL DESENGAÑO)	01/06/2015	31/12/2015	60.00	N/A	12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	--
21	NUEVO COAHUILA - EL DESENGAÑO	01/06/2015	30/12/2015	50.00	N/A	9.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	--
22	E.C. (VHSA-ESC)-DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	5.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	--
23	CERRO LAS AGUILAS - EL DESENGAÑO	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096240001	--
24	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 500 MIL LITROS EN CO DEL CARMEN	01/04/2014	30/11/2015	17.20		1 TANQUE	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
25	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 756.7 KMS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15/02/2016	30/11/2016	419.60		756.70	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
26	Programa de Conservación de Carreteras Federales 2016	05/02/2016	30/12/2016	327.30	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE CANDELARIA II, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS EN 51 KMS, REHABILITACION DE 1 OBRA DE DRENAJE, ATENCION DE 1 PUNTO DE CONFLICTO, 12 OBRAS DE CONSERV.RUT.	1,313.50	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	--
27	CG-066 MODERNIZAR EL PUERTO DE SEYBAPLAYA	01/04/2013	31/10/2016	183.11	N/A	MUELLE	EN PROCESO 2016	PUERTOS	11095100001	PNI177
28	DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKAN	01/03/2016	31/10/2016	85.00	EL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III, ORIGINALMENTE REGISTRADO EN ESTA ID, FUE REGISTRADO COMO OBRA INDIVIDUAL CON EL ID OB_SCT_02477	2 DIST VIAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PNI340
29	XPUJIL-DZIBALCHE, TR. XCANHA-DZIBALCHEN 78 AL 94	15/04/2016	14/11/2016	70.00		16.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240005	--
30	XPUJIL - DZIBALCHEN (TR: XPUJIL - X-CANHA)	15/04/2016	14/11/2016	60.00		12.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240003	--
31	NVO COAHUILA-CERRO LAS AGUILAS	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	--
32	SN MANUEL NVO CANUTILLO-EC(NVO COAHUILA-DESENGAÑO)	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	--
33	DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA, 0 AL 8	15/04/2016	14/11/2016	28.00		8.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	--
34	CG-063 MODERNIZAR EL PUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN.	28/11/2013	31/10/2017	978.27	"SE REQUIEREN 228.21 MDP PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN OCTUBRE 2017."	0.12	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	12095100003	PNI429
35	CHAMPOTON - VILLA MADERO	01/03/2016	01/12/2018	500.00	PARA EL EJERCICIO 2016, SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 12.26 KMS., CUERPO IZQUIERDO AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE, TRAMO CHAMPOTON - VILLAMADERO (TRAMO LIBRE), ENTRE LOS KMS. 148 AL 160.25	16.50	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
36	LIBRAMIENTO DE ATASTA	02/01/2017	01/12/2019	3,000.00	N/A	14.70	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
37	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CIUDAD DEL CARMEN PARA MEJORAR LAS VIALIDADES	01/03/2017	30/11/2018	1,672.00	SE CANCELA ESTA OBRA COMO COMPROMISO DE GOBIERNO CG-062, SEGÚN OFICIO CGPG/STG/108/2016. EL NUEVO COMPROMISO CG-062 ES LA OBRA CON EL ID OC_SCT_00258	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	No. Solicitud 48002	PNI575
38	LIBRAMIENTO DE CHAMPOTON	02/01/2017	01/12/2018	820.00	N/A	18.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43053	PE
39	LIBRAMIENTO DE ESCARCEGA	02/01/2017	31/12/2018	450.00	N/A	10.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43851	PE
40	DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III	01/03/2017	31/12/2017	85.00	ESTA OBRA FORMABA PARTE DEL ID OB_SCT_01589	1 DIST VIAL	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PE
41	LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE	02/01/2017	31/12/2017	50.00	EL REGISTRO DE CARTERA DE INVERSION ESTA EN TRAMITE. LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2015, FUERON RETIRADOS POR LA SHCP	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	41735	--
