



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
PUEBLA**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT


**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

NOVIEMBRE 2016

SCT PUEBLA 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

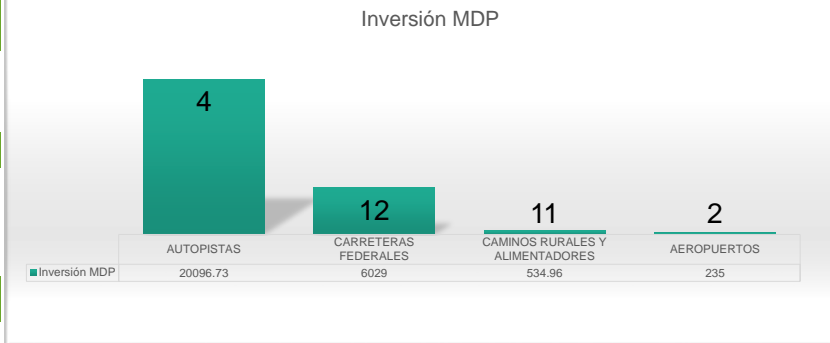

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

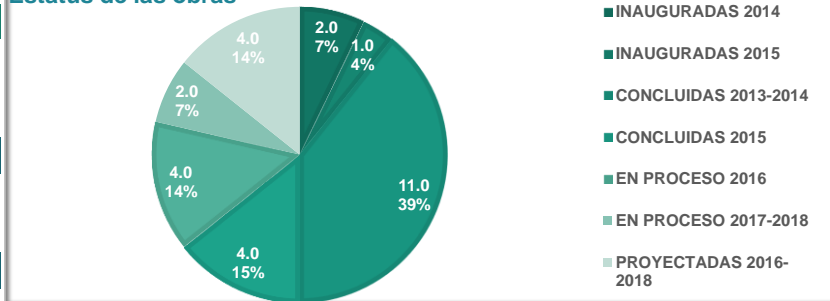

A la fecha, la SCT invierte **29** Obras, **26,895.7** MDP y **476.8** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOISTAS	4	20,097	66	2
INAUGURADAS 2014	1	8,939	37	0
INAUGURADAS 2016	1	10,500	13	1
CONCLUIDAS 2013-2014	1	8	1	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	650	16	1
CARRETERAS FEDERALES	12	6,029	252	3
INAUGURADAS 2014	1	690	28	0
INAUGURADAS 2015	1	884	-	0
CONCLUIDAS 2013-2014	2	180	1	0
CONCLUIDAS 2015	2	377	78	1
EN PROCESO 2016	3	899	105	1
EN PROCESO 2017-2018	2	2,400	1	1
PROYECTADAS 2016-2018	1	600	40	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11	535	158	0
CONCLUIDAS 2013-2014	8	55	10	0
CONCLUIDAS 2015	2	245	16	0
EN PROCESO 2016	1	235	132	0
AEROPUERTOS	2	235	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	235	-	0
Total general	29	26,896	477	5

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		685,011.0	685,011.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		251,188.0	251,188.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		616,858.0	616,858.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		190.0	190.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		214.0	214.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	86.56	82.99	83.80	253.35
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	124	140	217	140
JORNALES	1,023,778	896,948	826,777	2,747,503
BENEFICIARIOS	16,920	12,949	18,789	48,658
LONGITUD	3,207.06	2,444.00		5,651.06
CAMINOS			506	506

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	2,862			2,862
INMUEBLES ESCOLARES	1,910			1,910
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	466			466
CENTROS DE SALUD	442			442
OFICINAS DE GOBIERNO	40			40
ESPACIOS PÚBLICOS	3			3
CENTRO DE INVESTIGACIÓN	1			1

Fecha de recepción: Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante Oficio No.: C.SCT.6.20.413.309/16 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante el Oficio No.6.0.1-631/2016 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN (TRAMO: NUEVO NECAXA-AVILA CAMACHO)	01/06/2008	01/06/2014	8,939.05	LA INVERSIÓN EJERCIDA DURANTE EL SEXENIO FUE DE 2,730 MDP INAUGURADA 17-SEP-14	36.60	INAUGURADAS 2014	AUTOPISTAS	3096500030	PNI558
2	CARRETERA PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEON ATLIXCO – IZUCAR DE MATAMOROS, KM 27+300 AL KM 55+000.	01/05/2009	01/05/2013	690.00	DOCUMENTOS FUENTE YA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO INAUGURADA 13-NOV-14	27.70	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	6096410025	PE
3	DISTRIBUIDOR VIAL 9 PERIFERICO DE PUEBLA	01/02/2013	07/09/2015	883.90	LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. OBRA RECIENTEMENTE INAUGURADA POR EL PRESIDENTE.	DISTRIBUIDOR	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096410010	PNI368
4	CG-040 CONSTRUCCION DEL VIADUCTO ELEVADO SOBRE LA AUTOPISTA MEXICO VERACRUZ TRAMO PLANTA VW	19/08/2014	30/09/2016	10,500.00	OBRA A CARGO DE LA DIR. GRAL DE DESARROLLO CARRETERO DE LA SCT Y DEL GOB DEL EDO DE PUEBLA	13.00	INAUGURADAS 2016	AUTOPISTAS	SOLICITUD 42099	PNI659
5	PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, EN LA CARRETERA MEXICO – TUXPAN (MEX-130) EN EL KM 97+280	01/07/2012	01/04/2014	110.00	N/A	0.71	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096410021	0
6	ENTRONQUE LA CEIBA DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO -TUXPAN	01/11/2011	01/06/2014	70.00	CON PROBLEMA DE TERMINACIÓN EN EL FINQUITO	ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	3096500030	0
7	TEPANGO DE RODRIGUEZ TLAMANCA DE HERNANDEZ	26/05/2014	22/12/2014	10.50		0.82	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096410024	0
8	E.C.(TEHUACAN - HUAJUAPAN DE LEON) - LOS REYES METZONTLA.	30/10/2013	13/12/2013	9.99	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096410019	0
9	HUEHUETLAN EL CHICO - EL TECOCOYUCO.	10/02/2014	09/07/2014	9.47	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096410025	0
10	XONACATLAN -GUADALUPE VICTORIA - BUENA VISTA DE GUERRERO	10/02/2014	09/06/2014	7.99	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096410014	0
11	ACCESO A LA AUTOPISTA MÉXICO - TUXPAN RAMAL ÁVILA CAMACHO (PLAN DE AYALA - VILLA ÁVILA CAMACHO)	01/04/2014	28/08/2014	7.68	N/A	0.85	CONCLUIDAS 2013-2014	AUTOPISTAS	13096410001	0
12	EL CAPULIN - SAN JOSE PETLALCINGO - EJIDO SAN JOSE TIERRA COLORADA - TEXCALAPA	30/10/2013	13/12/2013	6.00	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096410004	0
13	SAN PEDRO CUAYUCA- PUENTE MARQUEZ.	30/10/2013	13/12/2013	4.00	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096410018	0
14	XOCHILOMA - GUADALUPE SABINAL - E.C. (CIUDAD SERDAN - EL SECO)	30/10/2013	13/12/2013	3.99	N/A	0.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096410031	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
15	SANTA CECILIA CLAVIJERO - COLONIA MIGUEL HIDALGO	30/10/2013	13/12/2013	3.50	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096410019	0
16	CG-139 TEPEACA - ZACATEPEC.	01/10/2013	29/01/2015	276.60	DE LA LONGITUD 7.69 KM SON DE MODERNIZACIÓN Y 47.3 DE CONSERVACIÓN.	78.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096410029	PNI211
17	AFRICAM – TECALI DE HERRERA	01/07/2014	01/02/2015	235.00	N/A	13.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096410010	0
18	CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CIUDAD SERDAN (ENTRONQUES Y ESTRUCTURAS)	01/03/2015	01/12/2015	100.00	N/A	3 ENTRONQUES Y 3 ESTRUCTURAS	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096410022	0
19	TEHUITZINGO-LOS HORNOS DE ZARAGOZA- SAN PEDRO CUAYUCA	30/10/2013	01/02/2015	9.98	N/A	2.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096410024	0
20	CG-140 TEPEACA - TEHUACAN.	01/11/2013	11/11/2016	650.90	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 98%, PARA TERMINAR LOS TRABAJOS SE REQUIEREN RECURSOS POR UN MONTO DE 50 MDP, UNA VEZ QUE SE RADIQUEN RECURSOS A ESTE CENTRO SCT PUEBLA, LA OBRA SE CONCLUIRA EN 2 SEMANAS	21.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	13096410022	PNI359
21	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	22/02/2016	30/11/2016	234.54	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES COMPRENDE DIFERENTES EMPRESAS EJECUTORAS CONFORME A LA UBICACION DE LA OBRA.	132.23	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
22	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHIGNAHUAPAN ZACATLAN	01/06/2015	01/12/2016	133.60	SE INICIÓ LA MODERNIZACIÓN DE 4 KM, DE UNA META TOTAL DE 11.0 KM	11.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	12096410043	0
23	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016	04/03/2016	12/12/2016	114.00	LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES TIENEN DIFERENTES EMPRESAS EJECUTORAS, CONFORME A LA UBICACION DE CADA OBRA.	73.40	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
24	CG-041 MODERNIZACION DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO Y CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA.	01/03/2014	01/11/2017	2,000.00	SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ENTRONQUE FORJADORES Y ENTRONQUE LA RECTA A CHOLULA, SE TRABAJA EN EL ENTRONQUE ATLIXCO CUOTA	6 ENTRONQUES	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096410042	PNI358
25	PUEBLA-ATLIXCO, TRAMO: PERIFÉRICO ECOLÓGICO-ATLIXCO	01/09/2012	01/12/2017	400.00	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS NO SE HA TENIDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA, LOS RECURSOS SON SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIRSE A LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO	0.50	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096410023	0
26	CG-138 CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LA GALARZA - AMATITLANES	30/11/2016	31/10/2017	650.00	PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN OBRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO (DGDC)	16.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	14096410014	PNI263
27	PUEBLA-TLAPA	09/12/2016	31/12/2018	600.00	EN ETAPA DE PLANEACIÓN; OBRA A CARGO DEL C.SCT GUERRERO	40.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES		0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
28	REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES Y ACCESO A RECINTO FISCALIZADO AEROPUERTO DE PUEBLA	09/12/2016	03/02/2017	160.00	N/A	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE
29	REHABILITACION DE AREAS OPERACIONALES EN TEHUACAN	01/01/2017	15/12/2017	75.00	N/A	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PE
