



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
SAN LUIS POTOSÍ**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**NOVIEMBRE 2016**



SCT SAN LUIS POTOSÍ 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



6 AUTOPISTAS



15 CARRETERAS



36 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO




0 PUERTOS




1 AEROPUERTO

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

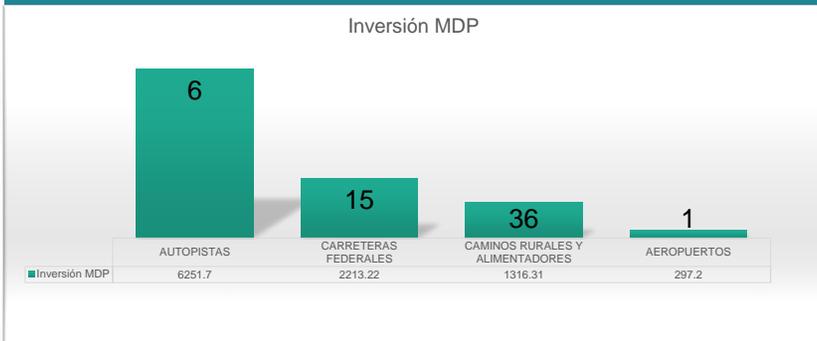

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

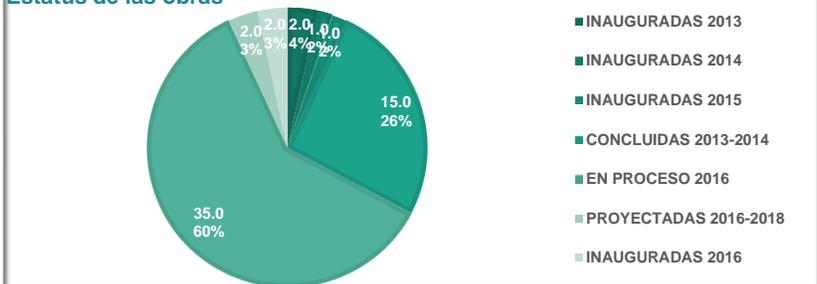

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		280,729.0	280,729.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		85,301.0	85,301.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL		283,184.0	283,184.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		58.0	58.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		58.0	58.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	58.33	57.88	58.20	174.41
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	52	53	58	53
JORNALES	739,439	630,849	573,497	1,943,785
BENEFICIARIOS	16,264	15,075	17,690	49,029
LONGITUD	1,543.72	1,255.00		2,798.72
CAMINOS			313	313

Fecha de recepción: Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante Oficio No.: 6.23.1.016/16 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante el Oficio No.6.0.1/640/2016 enviado por la DGAPDCST

Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte **58** **10,078.4** **6,933.6**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>6</b>	<b>6251.7</b>	<b>1103.4</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2013	2	739	959	0
INAUGURADAS 2014	1	1166	31.2	0
INAUGURADAS 2016	1	2230	49.1	0
EN PROCESO 2016	2	2116.7	64.1	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>15</b>	<b>2213.22</b>	<b>2303.24</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2015	1	1009.7	194	1
INAUGURADAS 2016	1	413.7	8.7	0
EN PROCESO 2016	12	426.32	2093.54	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	363.5	7	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>36</b>	<b>1316.31</b>	<b>3527.0009</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2014	15	616.04	3084.6389	0
EN PROCESO 2016	21	700.27	442.362	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>297.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROYECTADAS 2016-2018	1	297.2	0	0
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>10078.43</b>	<b>6933.6409</b>	<b>1</b>

AVANCE EN PROGRAMAS

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
<b>INVERSIÓN</b>				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,314			1,314
INMUEBLES ESCOLARES	932			932
CENTROS DE SALUD	217			217
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	128			128
OFICINAS DE GOBIERNO	33			33
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	4			4

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Balance Febrero	Revisión
1	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-TAMPICO	08/06/2011	12/09/2013	557.00	INAUGURADA 12-SEP-13	946.00	INAUGURADAS 2013	AUTOPISTAS		PNI454	00/01/1900	0
2	RIOVERDE-CIUDAD VALLES (PPS)	30/08/2008	15/09/2013	182.00	INAUGURADA 12-SEP-13	13.00	INAUGURADAS 2013	AUTOPISTAS	NA	PNI171	00/01/1900	0
3	LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE SAN LUIS POTOSI	01/06/2011	01/05/2014	1,166.00	LA INVERSION EJERCIDA DURANTE EL SEXENIO FUE DE 513.00 MDP INAUGURADA 21-JUL-14	31.20	INAUGURADAS 2014	AUTOPISTAS	NA	PNI305	00/01/1900	0
4	CG-049 ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EN SUS TRAMOS NORTE Y PONIENTE.	02/05/2013	28/02/2015	1,009.70	INAUGURADA 01-ABR-15	194.00	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096440010	PNI463	00/01/1900	0
5	AUTOPISTA CIUDAD VALLES - TAMUIN	01/08/2011	06/07/2016	2,230.00	ESTA OBRA ES CON RECURSOS FONADIN, INAGURADA POR EL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO	49.10	INAUGURADAS 2016	AUTOPISTAS	N/A	PNI535	00/01/1900	0
6	LIBRAMIENTO VILLA DE REYES	01/06/2010	07/07/2016	413.70	INAUGURADA POR EL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA EL DIA 08/SEP/2016	8.70	INAUGURADAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440008	0	24/07/1900	0
7	MATEHUALA - CIUDAD VICTORIA	01/02/2009	30/12/2012	276.87	LO CORRESPONDIENTE A SLP FUE UNA INVERSIÓN DE 54.3 MDP TERMINADO EN 2009	2,913.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096440010	PE	00/01/1900	0
8	SAN JOSE DEL GRITO- LAS CRUCES - YOLIAT - SAN FRANCISCO	01/05/2007	01/10/2013	126.30	N/A	93.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	6096440021	0	00/01/1900	0
9	VENADO - EL EPAZOTE	22/04/2013	18/08/2014	46.07	N/A	20.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440008	0	00/01/1900	0
10	SANTA ANITA -PALO DE ARCO-TANCHACHIN	01/05/2010	01/10/2013	45.45	N/A	15.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440001	0	00/01/1900	0
11	BOULEVARD EN LA CARRETERA VALLES 85	26/12/2011	30/12/2014	39.20	N/A	1.66	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440019	0	00/01/1900	0
12	TAPONA - POCITOS - PEYOTE	30/03/2012	18/12/2013	16.75	N/A	6.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440006	0	00/01/1900	0
13	LOS ANGELES - MARAVILLAS Y RAMAL A NORIA DE LOS CONOS.	01/03/2012	29/07/2013	15.74	N/A	5.10	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440013	0	00/01/1900	0
14	LAS CRUCES - LIMITES DE LOS ESTADOS SLP - ZAC.	26/07/2013	10/05/2014	10.88	N/A	4.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440008	0	16/07/1902	0
15	RAMAL A REAL DE CATORCE; TR: KM. 0+000 AL KM. 21+000.	15/04/2013	10/07/2014	10.40	N/A	21.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440018	0	14/07/1902	0
16	CONSTRUCCION DEL PUENTE TONATICO.	23/08/2013	20/11/2013	8.32	N/A	0.04	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440014	0	00/01/1900	0
17	CAÑAS-IGNACIO ALLENDE (PUENTE)	01/04/2013	28/08/2013	6.00	N/A	0.07	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096440006	0	00/01/1900	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Balance Febrero	Revisión
18	E. C.F. MEXICO NO. 57- EL JARALITO, TRAMO TEXAS-EL JARALITO.	10/03/2014	07/06/2014	5.82	N/A	1.56	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440026	0	18/07/1902	0
19	LA PROVIDENCIA - LLANO GRANDE	15/04/2013	29/07/2013	4.46	N/A	1.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440014	0	00/01/1900	0
20	PUENTE VEHICULAR PUENTE LA MAROMA	10/03/2014	07/07/2014	2.79	N/A	0.02	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440003	0	00/01/1900	0
21	PUENTE: VEHICULAR EN ARROYO XOCHITITLA	01/04/2014	28/09/2014	0.99	N/A	0.09	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440001	0	13/07/1902	0
22	LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI	01/08/2014	30/12/2016	1,531.00	N/A	24.10	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	NO APLICA	PE	00/01/1900	0
23	CIUDAD VALLES-TAMPICO, TR. TAMUIN-TAMPICO	01/02/2015	31/12/2016	585.70	FORMA PARTE DE LA OBRA OB_SCT_00459 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,142.7 MDP	40.00	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	10096440014	PNI454	19/04/1900	0
24	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS	16/02/2016	16/12/2016	312.64	EN PROCESO A LA FECHA CONTRATADOS 41 CAMINOS PARA UNA META DE 375.34 KM	375.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0	00/01/1900	0
25	EL CHILARES - LA MAROMA (SAN LUIS POTOSI APOYO A CONAGUA CG 052 PRESA LA MAROMA)	31/12/2014	15/12/2016	200.00	EN PROCESO, EL MONTO ASIGNADO PARA 2016 ES DE 14.59 MDP.	21.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440013	PE	07/06/1900	0
26	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (CPCC)	18/01/2016	31/12/2016	147.07	CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (CPCC) EN ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CON UNA META DE 754.54 KM	754.54	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	0	00/01/1900	0
27	CONSERVACION PERIODICA	15/02/2016	16/12/2016	98.35	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA DE 55 KMS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE LA RED BASICA Y RED SECUNDARIA. SE ADICIONAN 2 OBRAS MAS CON 14 KM DANDO UN TOTAL DE: 69 KM	55.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0	03/01/1900	0
28	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	16/02/2016	31/12/2016	57.94	PROGRAMA DE CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE 1280.80 KMS DE LA RED BASICA Y RED SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. DE S.L.P.	1,280.80	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0	00/01/1900	0
29	RECONSTRUCCION DE PUENTES	09/05/2016	20/12/2016	40.99	RECONSTRUCCION DE PUENTES "EL LIMONCITO" CARR. CD. VALLES - CD. VICTORIA KM. 15+753 Y PUENTE "SANTA ISABEL" CARR. CD. VALLES - PACHUCA KM. 339+750 EN EL ESTADO DE SLP (1PTE EN PROC. LICITACION)	PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0	03/01/1900	0
30	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/02/2016	16/12/2016	24.90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ZONA 1 Y ZONA 2	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0	00/01/1900	0
31	SAN FRANCISCO-CERRO GRANDE-XINICTLE	24/03/2016	15/12/2016	18.64	EN PROCESO	3.80	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440017	0	00/01/1900	0
32	BARRERA DE PROTECCION	01/02/2016	20/12/2016	15.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN PARA NIVEL DE CONTENCIÓN 4 O SUPERIOR, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ZONA 1	BARRERA DE PROTECCIÓN	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0	00/01/1900	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Balance Febrero	Revisión
33	BARRERA DE PROTECCION	01/02/2016	20/12/2016	15.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCIÓN PARA NIVEL DE CONTENCIÓN 4 O SUPERIOR, EN LA RED FEDERAL DE CARRETERAS LIBRES DE PEAJE, EN EL ESTADO DE SAN LUIS	BARRERA DE PROTECCIÓN	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0	00/01/1900	0
34	CONST. PUENTE E.C.(RIO VERDE-SLP) -LA MEDIA LUNA,TRAMO:E C 70	27/04/2016	16/12/2016	13.37	EN PROCESO	PUENTE	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440004	0	00/01/1900	0
35	MORELOS-JUAN SARABIA-EL BOZAL-LAVICTORIA-LA MERCED	24/03/2016	15/12/2016	12.93	EN PROCESO	4.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440010	0	00/01/1900	0
36	LOS CARRIZOS-COXCATLAN-AXTLA	24/03/2016	28/12/2016	12.70	EN PROCESO	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0	00/01/1900	0
37	SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/02/2016	20/12/2016	12.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ZONA 1	SEÑALAMIENTO VERTICAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0	00/01/1900	0
38	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN TAMUÍN-SANTA MARTHA	25/02/2016	14/12/2016	11.49	EN PROCESO	3.04	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440012	0	00/01/1900	0
39	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO WADLEY SAN JOSE DE CORONADOS	25/02/2016	20/12/2016	11.48	EN PROCESO	2.10	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0	00/01/1900	0
40	LA CUESTA-TANCANHUITZ	25/02/2016	16/12/2016	11.29	EN PROCESO	2.12	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440003	0	00/01/1900	0
41	AGUA ZARCA-PAPAGAYOS	25/02/2016	15/12/2016	11.05	EN PROCESO	3.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440021	0	00/01/1900	0
42	LA ESPERANZA-SANTA ELENA	25/02/2016	14/12/2016	10.61	EN PROCESO	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440015	0	00/01/1900	0
43	CAMINO TLAETLA-PILATENO,EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	25/02/2016	16/12/2016	9.98	EN PROCESO	2.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440004	0	00/01/1900	0
44	TANCANHUITZ-HUEHUETLAN	25/02/2016	20/12/2016	9.59	EN PROCESO	2.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440012	0	00/01/1900	0
45	EST. MOCTEZUMA-MATANZAS	25/02/2016	16/12/2016	9.56	EN PROCESO	3.01	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096440002	0	00/01/1900	0
46	RAMAL SAN SEBASTIÁN	25/02/2016	21/12/2016	9.49	EN PROCESO	3.42	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096440006	0	00/01/1900	0
47	AQUISMÓN-XOLMON-UNIÓN DE GUADALUPE	25/02/2016	15/12/2016	9.39	EN PROCESO	2.90	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440015	0	00/01/1900	0
48	TANLAJAS-SAN ANTONIO-EL PUENTE	27/04/2016	22/12/2016	7.59	OBRA EN PROCESO	3.10	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096440007	0	00/01/1900	0
49	SAN CIRO DE ACOSTA-VAQUEROS-E.C. 70 (RAMAL LA LUZ)	25/02/2016	15/12/2016	6.69	EN PROCESO	2.04	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096440001	0	00/01/1900	0
50	E.C. 57-SAN FRANCISCO	25/02/2016	15/12/2016	5.29	EN PROCESO	1.36	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096440013	0	00/01/1900	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO	Balance Febrero	Revisión
51	EL HERRERO-LA LUZ	25/02/2016	14/12/2016	5.09		1.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096440001	0	00/01/1900	0
52	MODERNIZACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CERRITOS-SAN JOSE DE TURRUBIARTES-LAS POZAS-RINCONADA	27/04/2016	16/12/2016	5.00	EN PROCESO	1.90	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096440020	0	00/01/1900	0
53	VALLE DE SAN JUAN-RINCÓN DEL REFUGIO	25/02/2016	14/12/2016	3.99	EN PROCESO	0.87	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096440004	0	00/01/1900	0
54	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	16/02/2016	31/12/2016	3.20	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2016, 137 PUENTES ZONA CENTRO Y 114 PUENTES ZONA HUASTECA EN RED BASICA Y RED SECUNDARIA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE S.L.P.	PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0	00/01/1900	0
55	CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES	09/05/2016	21/12/2016	2.00	CONSERVACION PERIODICA DE TRES PUENTES, PUENTE PALITLA CARR. PACHUCA-CD. VALLES,* PUENTE SAN LORENZO II CARR. LEÓN -SAN LUIS POTOSÍ Y PUENTE VILLA DE GUADALUPE CARR.	PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0	03/01/1900	0
56	SAN CIRO DEACOSTA-CORRAL QUEMADO	25/02/2016	16/12/2016	0.79	OBRA EN PROCESO	0.10	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	10096440011	0	00/01/1900	0
57	LIBRAMIENTO EBANO	01/02/2017	28/02/2017	363.50	OBRA FUERA DE PEF	7.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES		0	00/01/1900	0
58	MODERNIZACION AEROPUERTO SAN LUIS POTOSI	01/12/2016	31/12/2018	297.20	BARANDAL Y BARRAS DE APOYO PARA PERS. CON DISACAPACIDAD,CTO DE OPER. DE EMERG., CONSTR. AMPLIACION DEL CPO DE RESCATE Y EXTINCION DE INCENDIOS,OBRAS DE SEG.	TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS	297.2	PNI003	00/01/1900	0
