



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
MICHOCACÁN**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

DICIEMBRE 2016




SCT MICHOACAN 2013-2018




BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

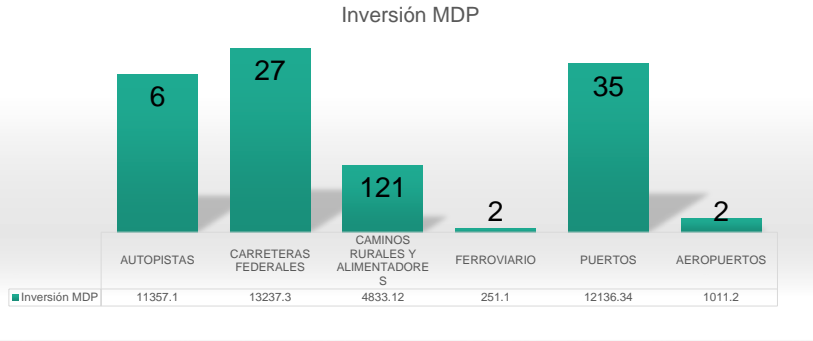

Estatus de las obras

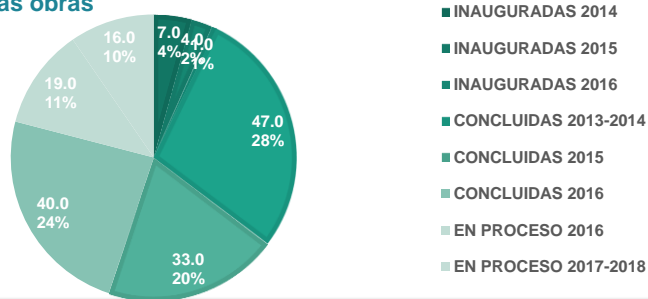

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
INVERSIÓN ACUMULADA	919.1	322.2	1,241.2
BENEFICIARIOS			
BENEFICIARIO IV ETAPA			
TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS	441,000.0	480,994.0	921,994.0
MUNICIPIOS BENEFICIADOS			

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN 2014	114.28	124.43	122.80	361.51
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	104	102	113	107
JORNALES	1,406,940	1,368,198	1,211,202	3,986,340
BENEFICIARIOS	29,264	28,776	36,077	94,117
LONGITUD	4,570.60	4,131.00		8,701.60
CAMINOS			520	520

Fecha de recepción: viernes, 09 de diciembre de 2016, mediante Oficio No.: 6.15.303.136/2016 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016, mediante el Oficio No.6.0.1-/666 /2016 enviado por la DGAPDCST



Obras MDP Km

A la fecha, la SCT invierte en **193** **42,826.2** **11,481.7**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	6	11357.1	183.4	2
CONCLUIDAS 2016	2	5754	97.2	0
EN PROCESO 2017-2018	2	2799.1	61	2
PROYECTADAS 2016-2018	2	2804	25.2	0
CARRETERAS FEDERALES	27	13237.3	9878.07	3
INAUGURADAS 2016	1	517.1	0	1
CONCLUIDAS 2013-2014	4	843.88	2900.8	0
CONCLUIDAS 2015	6	2032.52	2576.32	1
CONCLUIDAS 2016	7	883.46	191.4	0
EN PROCESO 2016	4	167.94	1635.45	0
EN PROCESO 2017-2018	4	6731.4	2471.4	1
PROYECTADAS 2016-2018	1	2061	102.7	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	121	4833.12	1416.921	0
INAUGURADAS 2015	4	36	10.3	0
CONCLUIDAS 2013-2014	25	732.21	138.465	0
CONCLUIDAS 2015	23	191.89	76.686	0
CONCLUIDAS 2016	30	616.13	754.18	0
EN PROCESO 2016	13	140.48	36.62	0
EN PROCESO 2017-2018	5	2935.41	355.2	0
PROYECTADAS 2016-2018	21	181	45.47	0
FERROVIARIO	2	251.1	3.353	0
INAUGURADAS 2014	1	203.2	0	0
EN PROCESO 2016	1	47.9	3.353	0
PUERTOS	35	12136.34	0	0
INAUGURADAS 2014	6	3739.8	0	0
CONCLUIDAS 2013-2014	18	281.67	0	0
CONCLUIDAS 2015	4	1171.15	0	0
CONCLUIDAS 2016	1	30.47	0	0
EN PROCESO 2016	1	60	0	0
EN PROCESO 2017-2018	4	6328.25	0	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	525	0	0
AEROPUERTOS	2	1011.2	0	0
EN PROCESO 2017-2018	1	11.2	0	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1000	0	0
Total general	193	42826.16	11481.744	5

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL	1,986			1,986
INMUEBLES ESCOLARES	1,277			1,277
CENTROS DE SALUD	384			384
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	171			171
OFICINAS DE GOBIERNO	82			82
ESPACIOS PÚBLICOS	72			72

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

Programas



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES I	01/01/2013	30/06/2014	2,557.00	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION INAUGURADA SEP-14	1 TERMINAL	INAUGURADAS 2014	PUERTOS		PNI382
2	DRAGADO DE DARSENA NORTE Y ORIENTE EN PUERTO DE LAZARO CARDENAS	01/01/2010	01/05/2013	940.30	INAUGURADA 22-JUL-14 POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.	DRAGADO 11 MILLONES M3	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	0909J3A0003	0
3	CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS PARA AMPLIACION DE PATIO FERROVIARIO EN ISLA DEL CAYACAL	01/08/2013	28/12/2013	203.20	INAUGURADA 22-JUL-14 POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.	VÍAS FERREAS	INAUGURADAS 2014	FERROVIARIO		0
4	OFICINAS ADMINISTRATIVAS API Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LA ISLA DEL CAYACAL	01/08/2012	01/10/2014	133.28	INAUGURADA 13-NOV-14	24,000 m2	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	0409J3A0004	0
5	RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES DEL CANAL NORTE Y ORIENTE	03/06/2013	31/10/2013	55.02	INAUGURADA 22-JUL-14 POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.	RETIRO DE MATERIALES	INAUGURADAS 2014	PUERTOS		0
6	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS.	01/05/2009	30/06/2014	48.31	INAUGURADA 22-JUL-14 POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.	2.5 HECTAREAS	INAUGURADAS 2014	PUERTOS	0309J3A0018	0
7	CONSTRUCCION DE AREAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	28/12/2013	30/04/2014	5.89	INAUGURADA 22-JUL-14 POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.	--	INAUGURADAS 2014	PUERTOS		0
8	MODERNIZACION DEL CAMINO TAFETAN-PLATANILLO	27/02/2014	26/07/2014	15.00	31 DE MARZO DE 2014	4.00	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360018	0
9	E. C. DR. MIGUEL SILVA - NUEVO URECHO. CAMINO A LA COMUNIDAD DE ARAPARICUARIO	09/05/2014	07/09/2014	10.00	01 DE ABRIL DE 2014	2.90	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360014	0
10	MODERNIZACION DEL CAMINO DE LAS LETRAS-CASA BLANCA	23/03/2014	18/10/2014	6.00	INAUGURADA 01-ABR-15	1.80	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360020	0
11	MODERNIZACION DEL CAMINO TECOMATAN - E.C. PAJACUARAN - LA LUZ	12/03/2014	19/07/2014	5.00	INAUGURADA 26-MAR-15	1.60	INAUGURADAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360003	0
12	CG-252 MODER. DEL LIBRAMIENTO NORTE DE MORELIA, EN EL TRAMO SALIDA A SALAMANCA - SALIDA A QUIROGA	16/05/2014	31/03/2015	517.10	CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTRUCTURAS: PSV "CENTRAL" PSV "PEDREGAL" PSV "LAGO" PSV "REALITO" PIV "MIL CUMBRES"	5 Estructuras	INAUGURADAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096360010	PNI300
13	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CONTRATO PLURIANUAL DE CONSERVACION DE CA	01/01/2014	31/12/2014	600.00	ES UN CONTRATO PLURIANUAL 2012 - 2018 SE REPORTA LA ASIGNACION ANUAL AUTORIZADA	647.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11092110001	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
14	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15/07/2014	01/09/2014	393.00	E Y P DE LOS CAMINOS: LIBRAMIENTO MARTI MERCADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 5+130. LA CAPILLA- LA LOBERA, TRAMO DEL KM. 5+700 AL KM. 8+200.Y E.C. HUETAMO-ZITÁCUARO, TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO -OCUARO	ESTUDIOS	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100001	0
15	OBRAS DE REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS	01/01/2014	31/12/2014	204.00	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
16	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	01/03/2014	30/11/2014	190.44	N/A	1,890.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13092110003	0
17	QUITZEO ZINAPARO TR: HUANDACAREO – PURUANDIRO (TRAMO DEL KM. 2+660 AL KM. 57+000)	01/03/2011	01/11/2013	147.50	N/A	77.72	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096360015	0
18	PROGRAMA DE RECONSTR., CONSER. RUTINARIA Y PERI. DE PUENTES 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	01/02/2014	31/12/2014	41.62	N/A	332.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13092110006	0
19	TUPATARO (MICHOACAN) - PIÑICUARO (GUANAJUATO) HUANDACAREO, MICH. - PIÑACUARO, GTO	01/06/2013	01/12/2013	29.20	N/A	12.12	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360025	0
20	EL PANDILLO-TICUITACO	31/08/2011	11/12/2013	16.90	N/A	6.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360027	0
21	MODERNIZACION DEL CAMINO LA HUACANA - POTURO.	27/02/2014	15/09/2014	15.03	N/A	5.32	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360020	0
22	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2014 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	30/05/2014	31/12/2014	11.82	N/A	31.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13092110004	0
23	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO – ATIJO	05/06/2014	27/11/2014	11.10	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360030	0
24	CHAMACUERO-TEJOCOTE DE LA CALERA	16/04/2012	01/07/2013	10.60	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360024	0
25	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA	19/07/2014	19/08/2014	10.00	N/A	2.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360044	0
26	MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO VILLALONGIN-EL DEVANADOR	12/03/2014	24/09/2014	10.00	N/A	1.84	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360003	0
27	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ALCALDE-ACATLAN	15/08/2014	30/11/2014	9.20	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360008	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
28	CONSTRUCCION DEL CAMINO PALOS MARIAS-SALITRE DE COPOLA. TR. PALOS MARIAS - EL DERRUMBADERO	21/06/2014	28/10/2014	7.60	N/A	0.94	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360020	0
29	RELLENO CON MATERIAL GRAVA ARENA EN AREAS COLINDANTES CON EL PUERTO	16/09/2013	30/10/2013	7.53	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
30	RENIVELACION DE PROTECCION PLAYERA EN LA ISLA DE ENMEDIO	17/06/2013	13/12/2013	7.36	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
31	AMPLIACION DEL ACCESO SUR DE JACONA.	25/03/2014	01/08/2014	7.35	N/A	0.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360047	0
32	COJUMATLAN-EL NOGAL	25/03/2014	01/08/2014	7.00	N/A	0.94	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360001	0
33	MODERNIZACION DEL E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - SAN JERONIMO CAÑADA DE BUENAVISTA	02/04/2014	26/09/2014	7.00	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360005	0
34	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.	15/04/2013	30/12/2013	6.71	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
35	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA DEL CANAL SUROESTE	13/11/2013	30/12/2013	6.11	N/A	VIALIDAD PERIFÉRICA	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
36	COLOCACION Y SUMINISTRO DE DEFENSAS EN TERMINALES DE USOS MULTIPLES.	14/10/2013	30/12/2013	6.04	N/A	TERMINAL	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
37	MODERNIZACION DEL E.C. HUETAMO-ZITACUARO TRAMO PUERTA DE CHIRIPIO-OCUARIO	01/09/2014	30/11/2014	6.00	N/A	2.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360011	0
38	APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DRAGADO EN ZONAS DE DESARROLLO ECOLOGICO"	16/09/2013	14/11/2013	5.95	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
39	CONST, SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACION DE SISTEMA DE ENERGIA SUSTENTABLE EN VIALIDAD NORTE 1 ETAPA	13/11/2013	30/12/2013	5.75	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
40	ALIMENTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, EN RED DE ALUMBRADO Y RED DE FIBRA OPTICA	22/03/2013	19/06/2013	5.35	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
41	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	12/03/2014	19/06/2014	5.00	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360024	0
42	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	12/03/2014	22/08/2014	5.00	N/A	0.03	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360028	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
43	MODERNIZACION DEL CAMINO LA ESPERANZA-EL TEPEHUAJE	26/03/2014	26/07/2014	5.00	N/A	1.62	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360033	0
44	MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	12/03/2014	22/08/2014	5.00	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360001	0
45	CONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - LA LOMA - SANTA MARIA	15/08/2014	30/11/2014	5.00	N/A	2.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360052	0
46	CD. HIDALGO- MARAVATIO	25/03/2014	21/08/2014	4.49	N/A	3.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096360020	0
47	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA CLARA - LA CALERA	12/03/2014	01/08/2014	4.24	N/A	1.90	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360026	0
48	REUBICACION DE ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE FIBRA OPTICA PARA EL CANAL SUROESTE	12/09/2013	25/11/2013	4.23	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
49	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PILAR - LAS JICAMAS	29/06/2014	26/09/2014	4.00	N/A	1.03	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360005	0
50	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZACAPU - ZIRAHUEN, TRAMO NARANJA DE TAPIA	24/09/2014	01/11/2014	4.00	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100001	0
51	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE RAYOS GAMMA A FULL SCAN	01/10/2012	28/02/2013	3.70	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
52	INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE PANELES SOLARESENERGIA DEL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS	16/09/2013	15/11/2013	3.64	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
53	CONSTRUCCION DE PROTECCION MARGINAL EN LA ISLA DEL CAYACAL	17/10/2013	15/12/2013	3.51	N/A	PROTECCIÓN MARGINAL	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
54	CONSTRUCCION DE RAMPA DE BOTADERO Y PATIO DE SERVICIOS PARA EMBARCACIONES MENORES	12/09/2013	30/11/2013	3.08	N/A	--	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
55	MANTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO	27/05/2013	22/12/2013	3.07	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
56	MODERNIZACION DEL CAMINO MARCOS CASTELLANOS - JIQUILPAN - E.C. CARRETERA A SAN MIGUEL	25/03/2014	06/08/2014	3.00	N/A	0.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360045	0
57	CONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQUETAS EN VIALI. DEL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO EN ISLA DEL CAYACAL	23/05/2013	20/08/2013	2.86	N/A	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
58	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE LAZARO CARDENAS	27/05/2013	14/08/2013	2.53	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
59	CERCADO EN EL RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO	24/04/2013	10/05/2013	0.25	N/A	CERCADO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
60	AMPLIACION DE CANALES Y DARSENAS	03/06/2013	31/12/2015	1,003.69	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	1209J3A0001	0
61	COSTERA COAHUYANA DE HIDALGO- LAZARO CARDENAS, TRAMO: EL HABILLAL- CALETA DE CAMPOS.	31/12/2009	31/08/2015	987.50	EL PROYECTO CONSISTE EN LA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 7 A 12 M. DE ANCHO DE CORONA, PARA ALOJAR 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN CON ACOTAMIENTOS LATERALES DE 2.5 M., EN UNA LONGITUD DE 40.5 KM.	0.22 Km de estr. Y 0.35 Km de accesos	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	09096360029	PNI191
62	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2015.	02/01/2015	31/12/2015	547.07	EL AVANCE CORRESPONDE A LA ASIGNACION 2015	647.80	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11092110001	0
63	CG-254 AMPLIACION DE LA CARRETERA PATZCUARO - TACAMBARO	01/11/2013	31/05/2015	254.10	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 7 MTS. A 21 MTS CON 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN Y ACOTAMIENTOS LATERALES DE 2.5 MTS. EN UNA LONGITUD DE 10.9 KMS.	109.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096360002	PNI220
64	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA Y RUTINARIA DE TRAMOS 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	01/03/2015	31/12/2015	195.54	SE MODIFICA Y REDUCE A 195.540 MDP POR ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE INVERSIÓN NO . 5SC.OMI.15.-049 DE FECHA 10 DICIEMBRE 2015	1,659.52	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
65	CONSTRUCCION DE VIALIDAD PERIFERICA NORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL.	01/01/2001	31/12/2015	77.46	N/A	PUERTO	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	0209J3A0001	0
66	REUBICACION DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA EN LA ISLA DEL CAYACAL	12/01/2011	31/12/2015	54.51	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	PUERTO	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	0509J3A0004	0
67	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES 2015 DE LA RED FED LIBRE DE PEAJE	13/04/2015	31/12/2015	36.65	N/A	156.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110004	0
68	CONSTRUCCION DE VIALIDADES SECUNDARIAS Y PATIOS DE USO COMUN	01/01/2009	31/12/2015	35.49	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	PUERTO	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	0809J3A0002	0
69	COMBURINDIO - ACCESO AL PUENTE ZIRANDARO	01/09/2014	30/05/2015	14.40	N/A	0.82	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360043	0
70	MODERNIZACION DEL CAMINO VILLAMAR EL PLATANAL	01/09/2014	30/05/2015	11.94	N/A	0.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096360026	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
71	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO 2015 DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	30/06/2015	31/12/2015	11.66	SE REALIZO TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEL PUNTO DE CONFLICTO T. ZINAPECUARO - ZINAPECUARO	4.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110006	0
72	MODERNIZACION DEL E.C HUETAMO-CHURUMUCO(TURITZIO- CHARACUARO)	01/10/2014	06/03/2015	11.00	N/A	4.04	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360012	0
73	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO MARTI MERCADO	01/09/2014	10/09/2015	10.50	N/A	2.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360046	0
74	MODERNIZACION DEL CAMINO EL ENCANTO-ZIHUATZIO-ACHEROS-PURUARAN	01/09/2014	20/05/2015	10.40	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360028	0
75	MODERNIZACION DEL CAMINO CHURUMUCO-POTURO	01/08/2014	16/12/2015	10.00	N/A	3.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360019	0
76	MODERNIZACION DEL CAMINO GUACAMAYAS-JUNTAS DE CHAPACARICUARO	01/09/2014	12/06/2015	10.00	N/A	2.24	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360016	0
77	MODERNIZACION DEL CAMINO TIERRAS BLANCAS-SANTA MARIA	01/09/2014	31/05/2015	10.00	N/A	2.84	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096360014	0
78	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	01/09/2014	03/08/2015	9.56	N/A	3.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360007	0
79	MODERNIZACION DEL CAMINO LA GUADALUPE - HOYO DEL AIRE	01/09/2014	15/05/2015	9.00	N/A	2.80	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360013	0
80	REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SENGUIO (CABECERA MUNICIPAL) - LOS REYES (ENTRONQUE TLALPUJAHUA)	15/07/2014	25/03/2015	8.98	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360047	0
81	CONSERVACION EN TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: TINGAMBATO-SAN ANGEL ZURUMUCAPIO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL	29/07/2014	25/03/2015	8.73	N/A	9.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360046	0
82	EL ALCALDE-ACATLAN	27/07/2015	21/12/2015	8.15	N/A	2.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360008	0
83	APATZINGAN-AGUILILLA, TRAMO (APATZINGAN-DIVISION DEL NORTE)	12/03/2015	15/08/2015	7.99	N/A	20.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110002	0
84	MODERNIZACION DEL ENTRONQUE SAN SEBASTIAN SALIDA PERIBAN (LIBRAMIENTO)	01/09/2014	25/03/2015	7.69	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360045	0
85	MODERNIZACION DEL CAMINO ZIRIMICUARO LA LAJA EMILIANO ZAPATA	01/09/2014	27/07/2015	6.24	N/A	1.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360015	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
86	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO	01/09/2014	25/03/2015	6.00	N/A	1.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360009	0
87	MODERNIZACION DEL CAMINO ZINAPARO - ANGAMACUTIRO	01/09/2014	27/07/2015	6.00	N/A	1.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096360016	0
88	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	27/07/2015	20/11/2015	5.76	N/A	1.52	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360044	0
89	MODERNIZACION DEL E.C. (ZITACUARO - TOLUCA) KM 89+000 LA CAÑADA - EL TIGRITO	01/09/2014	09/06/2015	5.49	N/A	0.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360005	0
90	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE CERRITO DE PESCADORES	01/09/2014	29/05/2015	5.00	N/A	1.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360039	0
91	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+374	01/09/2014	29/05/2015	4.80	N/A	1.37	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360038	0
92	FELIPE CARRILLO PUERTO-FELIPE ANGELES-PUNTA DE AGUA-DIVISION DEL NORTE	12/03/2015	01/06/2015	4.26	N/A	4.26	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
93	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA	30/09/2012	31/07/2016	3,656.00	LIB. PONIENTE DE MORELIA (AUT. CUITZEO-PÁTZCUARO) SE COMPONE DEL TRAMO CAPULA-PÁTZCUARO AL 99% (EN OPERACIÓN). TRAMO CAPULA-CUITZEO AL 99% (EN OPERACIÓN). EL AVANCE FÍSICO GENERAL 99%.	63.70	CONCLUIDAS 2016	AUTOPISTAS		PNI563
94	AUTOPISTA CUITZEO-PATZCUARO (TRAMO CAPULA-CUITZEO)	30/09/2012	31/07/2016	2,098.00	ESTE TRAMO PERTENECE AL LIBRAMIENTO PONIENTE DE MORELIA, AHORA AUTOPISTA CUITZEO-PÁTZCUARO. EL TRAMO INICIA EN EL ENT. COPANDARO Y CONCLUYE EN ENT. CAPULA. OBRA A CARGO DE LA D.G.D.C.	33.50	CONCLUIDAS 2016	AUTOPISTAS		PNI563
95	ANILLO PERIFERICO ORIENTE DE LA PIEDAD	01/02/2013	19/10/2016	548.10	SE ASIGNARON 25.9 MDP EN 2016, PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA	14.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	10096360032	PE
96	CONSERVACION DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE A TRAVES DEL CPCC DEL ESTADO DE MICHOACAN 2016	04/01/2016	30/09/2016	346.19	Contrato Plurianual concluye en 2018	647.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11092110001	0
97	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	01/03/2016	30/11/2016	282.54		172.80	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
98	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 2016	26/02/2016	15/11/2016	52.00		38.77	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100002	0
99	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	02/05/2016	19/11/2016	33.98		--	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
100	DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES EN EL RECINTO PORTUARIO	01/01/2009	30/11/2016	30.47	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	EDIFICIO	CONCLUIDAS 2016	PUERTOS	0809J3A0003	0
101	CHURUMUCO - ATIJO	12/08/2015	28/07/2016	18.03	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360030	0
102	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO 18 KM	27/07/2015	04/03/2016	17.02	N/A	5.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360001	0
103	URINGUITIRO - JUNTAS DE NANDIRO	22/03/2016	28/10/2016	10.00	EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 10.83	2.82	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360003	0
104	ZINAPARO ANGAMACUTIRO	16/05/2016	29/09/2016	10.00	EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 9.93 HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA	2.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096360016	0
105	ZINAPARO-ANGAMACUTIRO	16/05/2016	25/10/2016	9.90		2.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	11096360016	---
106	MODERNIZACION DEL CAMINO PASO DE NUÑEZ - JANINDIPO	01/09/2014	30/11/2016	9.80	N/A	3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360029	0
107	REHABILITACION DE CAMINO LA PIEDAD - ZARAGOZA 7 KM	26/08/2015	04/01/2016	9.78		5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
108	CARRETERA NARANJA DE TAPIA - ZIRAHUEN, TRAMO: MOJONERA - SAN ISIDRO	27/07/2015	22/02/2016	9.59		2.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360006	0
109	E.C. (HUETAMO - CHURUMUCO) - TURITZIO - CHARACUARO	27/07/2015	04/03/2016	9.58	N/A	3.46	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360012	0
110	CHAVINDA - ESTACION MORENO	26/08/2015	20/04/2016	9.28	N/A	2.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
111	COJUMATLAN-EL NOGAL	11/08/2015	13/04/2016	8.75	N/A	1.96	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360001	0
112	E.C. SAN JERONIMO - CAÑADA DE BUENAVISTA	27/07/2015	20/05/2016	8.59	N/A	2.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360005	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
113	PARACUARO - JUCUTACATO	14/05/2016	30/11/2016	8.00	EL MONTO DEL CONTRATO ES DE 7.66 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA	2.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360016	0
114	MODERNIZACION DEL CAMINO LA CAPILLA-LA LOBERA	01/09/2014	29/07/2016	7.97	N/A	2.30	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360040	0
115	TECOMATAN-E.C.(PAJACUARAN- LA LUZ)	27/07/2015	29/09/2016	7.68	ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA.	2.68	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360003	0
116	LOS REYES - LOS LIMONES	08/09/2015	17/02/2016	7.67		2.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360028	0
117	RANCHO NUEVO - EL CORTIJO.	27/07/2015	05/02/2016	7.67	N/A	2.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360010	0
118	E.C. MEXICO NO. 15 - EL CARACOL - SAN ANTONIO VILLALOGIN	11/08/2015	29/04/2016	7.64	N/A	1.85	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360001	0
119	PUEBLO NUEVO - LA ARPITA	27/07/2015	17/02/2016	7.41		2.14	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360017	0
120	MODERNIZACION DEL CAMINO TEPEHUAJE- AL ZANGARRO	01/09/2014	30/11/2016	6.00		1.08	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360006	0
121	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE (CARRETERA MARAVATIO - TLALPUJAHUA) A EL HUERFANO (MUNICIPIO DE SENGUIO).	20/05/2016	29/09/2016	6.00		0.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360009	0
122	TUZANTLA - CEIBAS DE TRUJILLO	06/05/2016	28/10/2016	6.00	EL MONTO CONTRATADO ES 6.67 MDP	2.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360001	0
123	SAN JOSE DE GRACIA - AGUA CALIENTE	26/08/2015	04/01/2016	5.75	N/A	2.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
124	SAN PEDRO-LOS BRASILES, MPIO. SAN LUCAS	27/07/2015	29/09/2016	5.74	POR CONCLUIR.	1.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360028	0
125	REHABILITACION DEL CAMINO MARAVILLAS - EL COLEXIO 3.5 KM	26/08/2015	04/01/2016	4.89	N/A	3.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
126	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	01/03/2016	26/10/2016	4.30		PUENTES	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0
127	ACCESO A CERRITO DE PESCADORES	27/07/2015	05/02/2016	3.18	TRAMO 2015 OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00628)	0.82	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360039	0
128	LOS REYES-LOS LIMONES	05/05/2016	19/10/2016	2.64		1.80	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	12096360028	---
129	ACCESO A FRANCISCO SARABIA	27/07/2015	28/07/2016	2.39	TRAMO 2015 OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00629)	0.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360038	0
130	TECOMATAN-E.C (PAJACUARAN-LA LUZ)	06/04/2016	18/10/2016	2.10		0.58	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360003	---
131	LOS REYES-LOS LIMONES	06/05/2016	15/10/2016	2.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 2.64 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA	0.80	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	12096360028	0
132	SAN JUANICO - CHUCANDIRAN	27/07/2015	29/01/2016	1.43	N/A	0.52	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360029	0
133	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	02/02/2016	31/12/2016	127.86		1,627.85	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
134	TERMINAL GRANELERA	01/08/2014	31/12/2016	60.00	N/A	1 TERMINAL	EN PROCESO 2016	PUERTOS	1109J3G0005	PNI076
135	DESARROLLO DEL PATIO FERROVIARIO INTERMODAL DE LAZARO CARDENAS	01/12/2014	30/12/2016	47.90	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	3.35	EN PROCESO 2016	FERROVIARIO		0
136	MODERNIZACION DEL CAMINO ATIJO ZARATE	01/09/2014	31/12/2016	20.00	SE JUNTO LA INVERSION Y FECHA DE TERMINO DE LOS TRAMOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015. UNA VEZ QUE SEA CONCLUIDO EL 2014, SE DARÁ DE ALTA EL 2015 POR SEPARADO.	5.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360031	0
137	TAFETAN-PLATANILLO	26/08/1916	30/12/2016	18.07		5.80	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	10096360018	---
138	MODERNIZACION DEL CAMINO CAPIRE DE BRAVO - ACUYO	01/09/2014	17/12/2016	18.00	SE JUNTO LA INVERSIÓN Y FECHA DE TERMINO DE LOS TRAMOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2015. UNA VEZ QUE SEA CONCLUIDO EL 2014, SE DARÁ DE ALTA EL 2015 POR SEPARADO.	2.80	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360017	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
139	SAN ANTONIO DE VIÑA-LOMA CEÑIDA	09/05/2016	31/12/2016	15.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 12.94 MDP Y HUBO PROGRAMA DIFERIDO	4.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360044	0
140	PROGRAMA DE ATENCION A PUNTOS DE CONFLICTO DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE	15/08/2016	23/12/2016	14.81		PUNTO DE CONFLICTO	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110006	0
141	E.C (EL COPETIRO- TANCITARO) - APUNDARO-PAREO	09/05/2016	31/12/2016	10.00	EL MONTO CONTRATADO ES 10.61 MDP HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA	2.90	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360024	0
142	LA GUADALUPE-HOYO DEL AIRE	20/05/2016	31/12/2016	10.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 9.57 MDP	3.18	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360013	0
143	E.C. (COTIJA - LA LAGUNILLA) - PLAN DEL CERRO	11/08/2015	30/12/2016	9.60	ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA.	1.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360021	0
144	LIBRAMIENTO ZINAPECUARO	22/07/2015	30/12/2016	9.53	ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA.	2.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360032	0
145	CUATE-BARRANQUILLAS	14/05/2016	31/12/2016	9.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 9.59 Y HUBO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA	2.80	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096360009	0
146	MODERNIZACION DEL CAMINO EL PITAYO-SAN JOSE DE CHILA	26/08/2015	30/12/2016	8.13	TRAMO 2015, OBRA DE CONTINUIDAD (OB_SCT_00637) ESTÁ EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA FECHA DE TERMINO NO APLICA HASTA CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN JURÍDICA.	2.96	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360007	0
147	JANAMBO - STA. ROSALIMA	13/05/2016	31/12/2016	8.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 7.64 MDP	2.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360013	0
148	EL ALCALDE-ACATLÁN	05/05/2016	31/12/2016	8.00	EL MONTO CONTRATADO ES 8.49 MDP	2.40	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360008	0
149	SANTA RITA - ROSA DE CASTILLA	27/07/2015	31/12/2016	7.67	N/A	1.34	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360002	0
150	LAS LETRAS-CASA BLANCA	17/05/2016	15/12/2016	7.55	HUBO DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA	2.34	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096360020	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
151	LA CAPILLA-LA LOBERA	26/08/2016	15/12/2016	7.20	SE CONCLUYO LA DEL EJERCICIO 2014 Y EN EL EJERCICIO 2016 SE ESTA MODERNIZANDO DEL KM. 4+200 AL KM. 6+000.	1.80	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	140963600	---
152	TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II. (ETAPA 1, FASE 1).	01/10/2012	30/04/2017	5,282.65	N/A	1 TERMINAL	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS		PNI617
153	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200	01/08/2009	30/06/2018	4,800.00	ESTA OBRA ESTA DIVIDIDA EN: TRAMO1: EL HABILLAL-CALETA DE CAMPOS (CONCLUIDOS 40.5 KM). TRAMO2: CALETA DE CAMPOS-MARUATA, (NO INICIADO) Y TRAMO3: MARUATA-LIM EDOS. MICH/COL. (EJECUTADOS 11.8 KM).	2,262.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096360003	0
154	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COALCOMAN - ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS	24/09/2014	21/02/2018	2,300.00	LONGITUD TOTAL ES DE 150 KM. EN EL EJERCICIO 2014 SE CONTRATÓ Y CONCLUYÓ EL TRAMO D E 3.02 KM. CON UNA INVERSIÓN DE 22.7 MDP.	150.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096360012	PE
155	CG-152 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JIQUILPAN - SAHUAYO	08/10/2014	31/03/2017	1,815.00	RAMAL A JIQUILPAN, PRIMERA ETAPA (33.4 KMS.), FUE CONCLUIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2016. ACTUALMENTE SE ESTA VIENDO LA POSIBILIDAD DE INICIAR LA SEGUNDA ETAPA DE 12.6 KMS.	46.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS		PNI515
156	LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA.	01/08/2014	01/12/2018	1,246.40	OBRA EN PROCESO. SE TRABAJA EN EL RAMAL CAMELINAS: TERRACERIAS, VIADUCTO, TÚNEL 1 Y TÚNEL 2.	171.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096360009	0
157	CG-156 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ZITACUARO - VALLE DE BRAVO	30/11/2015	30/06/2017	984.10	LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA RETRASADA, PRIMERO POR LA FALTA DE APORTACIONES PENDIENTES QUE ADEUDABA EL GOB. DEL EDO. MEX. Y AHORA PORQUE SE HAN PRESENTADO CONFLICTOS CON LOS FLETEROS DE LA ZONA.	15.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	NO REQUIERE	PNI428
158	CG-148 MODERNIZACION DE LA CARRETERA URUAPAN - ZAMORA	01/04/2013	31/12/2018	680.00	A PARTIR DEL 2013 ESTA OBRA SE CAMBIÓ A COMPROMISO PRESIDENCIAL CG-148, ENCONTRÁNDOSE CON UN FALTANTE DE LONGITUD DE 38.0 KMS Y UN COSTO DE \$680.0 MDP. AVANCE FÍSICO 44.1%, EQUIVALENTE A 16.77 KMS.	38.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096360010	PNI347
159	PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y CONSERVACION EN 200 KM DE CAMINOS RURALES ZONAS INDIGENAS	20/08/2014	30/11/2017	620.00	LOS 200 KM. EN LAS ZONAS INDÍGENAS CONSTA DE 33 CAMINOS DE LOS CUALES: SE CONCLUYO 1 EN EL EJERCICIO 2014 DE 3 KM, CON UNA INVERSIÓN DE 9.9 MDP.	200.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360024	0
160	TERMINAL DE USOS MULTIPLES III.	11/01/2013	31/12/2017	577.60	N/A	1 TERMINAL	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS		PNI323
161	PROTECCION DE MARGENES PLAYERAS Y EN CANALES DE NAVEGACION.	01/01/2001	15/12/2017	342.00	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PUERTOS Y MARINA MERCANTE, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	PUERTO	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	0309J3A0002	0
162	CLUSTER LOGISTICO EN ISLA DE LA PALMA	01/08/2014	30/12/2018	126.00	N/A	CLUSTER LOGÍSTICO	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS		PNI473

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
163	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL AEROPUERTO DE MORELIA	01/10/2013	01/10/2018	11.20	LOS AVANCES QUE SE TIENEN HA SIDO LA ULTIMA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL AEROPUERTOS, Y SE ESTÁN VIENDO LOS MECANISMOS PARA AGILIZAR LA COMUNICACIÓN.	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PE
164	SANTA CRUZ - E.C. (PUERTA DE COENEMBO - TZIRANDANGATZIO)	26/08/2015	28/02/2017	6.69	EN PROCESO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN EL EJERCICIO 2016.	2.50	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360031	0
165	E.C. (TOMENDAN-IXTARO) TIPITARILLO	27/07/2015	31/01/2017	5.72		1.60	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360038	0
166	E.C HUETAMO-CHURUMUCO-(TURITZIO- CHARACUARO)	20/05/2016	31/01/2017	5.00	EL MONTO CONTRATADO ES DE 4.50	0.40	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096360012	0
167	(E.C. ARIO - SANTA CLARA) - LA PALMA	06/05/2016	28/02/2017	3.00	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE LA ASIGNACIÓN 2016.	1.10	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096360044	0
168	MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 200. TR CALETA DE CAMPOS-MARUATA	01/03/2017	30/06/2018	2,061.00	ESTE TRAMO ES PARTE DEL OB_SCT_00381. OBRA NO INICIADA, LONGITUD DE 102.7 KMS., NO SE CUENTA CON PROYECTO DEBIDO LA PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LA COMUNIDAD DE PÓMARO, DEL MUNICIPIO DE AQUILA.	102.70	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096360008	0
169	AMPLIACION DE LA AUTOPISTA PATZCUARO – URUAPAN	01/02/2017	30/12/2017	1,504.00	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO. EN REPETIDAS OCASIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO SE HA PEDIDO INFORMACIÓN SIN TENER RESPUESTA	5 ENTRONQUE S	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS		PNI494
170	LIBRAMIENTO DE URUAPAN	01/03/2017	01/12/2018	1,300.00	OBRA A CARGO DE LA DGDC. ACTUALMENTE NO SE HA INICIADO LA OBRA, DEBIDO A QUE EL TRAZO ORIGINAL PASABA POR UNA ZONA DE MANANTIALES, OBLIGANDO LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. EN ESPERA DE SU RESOLUCIÓN.	25.20	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS		PNI470
171	AEROPUERTO DE LAZARO CARDENAS	01/04/2017	01/12/2018	1,000.00	POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE REHABILITARA EL EDIFICIO TERMINAL Y ÁREA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS CON UNA INVERSIÓN DE 10 MDP EN CUATRO MESES DEL 1/08/16 AL 28/11/16.	--	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		PNI433
172	TERMINAL ESPECIALIZADA DE AUTOS	01/03/2017	31/12/2017	525.00	SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE SE RESUELVA UNA INCONFORMIDAD	1 TERMINAL	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		PNI309
173	CARRETERA SAN MARCOS - RANCHO SECO, RANCHO SECO - EL SABINO, RANCHO SECO - TAHUEJO	01/03/2017	31/05/2017	15.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016, ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	4.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	45270	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
174	CAYACO-HACIENDA VIEJA	01/03/2017	31/05/2017	15.00	ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL 2017	4.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360021	0
175	LIBRAMIENTO DE PERIBAN	01/03/2017	31/05/2017	14.10	ESTA PROPUESTA PARA LICITAR EN EL 2017	2.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096360024	0
176	EL SALITRE-EL PLATANAL	01/03/2017	31/05/2017	12.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	3.32	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46065	0
177	PURUARÁN - HACHEROS - EL ENCANTO	01/03/2017	31/05/2017	12.00	ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL 2017	3.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360028	0
178	SAN ANTONIO VILLALOGIN EL DEVANADOR	01/03/2017	31/05/2017	10.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	1.80	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096360003	0
179	JACONA - LOURDES	01/03/2017	31/05/2017	10.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.85	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46029	0
180	EL LIMON DE PAPTZINDAN - PURUNGUEO, TRAMO LA VIRGENCITA -PURUNGUEO	01/03/2017	31/05/2017	10.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.70	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360004	0
181	CONTINUACION AV. CEDRON TRAMO: CASETA CERRO VERDE / PANTEON LA JOYA 3 KM	01/03/2017	31/05/2017	9.70	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	3.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46052	0
182	MONTE GRANDE - IXTARO TRAMO CANTERA - IXTARO TOMENDAN	01/03/2017	31/05/2017	8.00	LA OBRA NO SE LICITO POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360002	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
183	ARROYO SECO - MONTECILLOS	01/03/2017	31/05/2017	8.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360003	0
184	SAN RAFAEL TECARIO - SAN RAFAEL CUTZARONDIRO	01/03/2017	31/05/2017	8.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46033	0
185	ENTRONQUE PROCESIONAL EL BARRIO - EL FLECHERO	01/03/2017	31/05/2017	7.00	ESTA PROPUESTO PARA LICITAR EN EL EJERCICIO 2017	1.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096360019	0
186	SAN ANTONIO - LAS HUERTAS - LAS PILAS	16/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	1.10	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46044	0
187	LA PALMA - SAN JUAN BENITO JUAREZ	16/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	1.30	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		0
188	CONCLUSION DE LA CARRETERA SANTA CATARINA - TICUITACO 4 KM	01/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO	1.40	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46054	0
189	E.C. ACUITZIO DEL CANJE-VILLA MADERO A ZIPARAPIO EL ALTO	16/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTA CONSIDERADA EN EL MECANISMO DE PLANEACIÓN 2017.	2.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096360005	0
190	TACUPA - CHARACHARANDO 7 KM	01/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO	1.90	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46050	0
191	LA PALMA - LA ANGOSTURA	01/03/2017	31/05/2017	6.00	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL. NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO	1.80	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46057	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
192	CONST. PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN TRAMO CARRETERO PATAMBO - AGUA AGRIA	01/03/2017	31/05/2017	3.50	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO	PUENTE	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46041	0
193	LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO (EL ORO) - TEPETONGO (NOPALERA - TEPETONGO)	01/03/2017	31/05/2017	2.70	LA OBRA NO SE LICITÓ POR FALTA DE ELEMENTOS, Y POR EL RECORTE PRESUPUESTAL NO ESTÁ CONSIDERADA PARA EL EJERCICIO 2016. POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SE SEGUIRÁ RECORRIENDO	0.80	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	46053	0
