



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS 2013-2018 BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

DICIEMBRE 2016

SCT BAJA CALIFORNIA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016


ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Inversión MDP



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Cuenta de Denominación

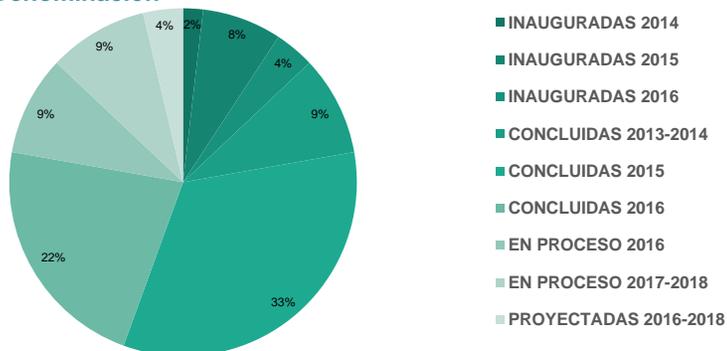

Obras **54** MDP **10,922.2** Km **1,576.3**

A la fecha, la SCT invierte

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
Cuenta de Denominación				
AUTOISTAS	2	1369.55	4.75	0
CONCLUIDAS 2015	1	19.55	1	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	1350	3.75	0
CARRETERAS FEDERALES	29	4819.07	6661.378	1
INAUGURADAS 2015	1	203.04	0.228	0
INAUGURADAS 2016	1	670.5	100	1
CONCLUIDAS 2013-2014	3	351.2	13.5	0
CONCLUIDAS 2015	12	799.15	4574.15	0
CONCLUIDAS 2016	6	240.24	1861.1	0
EN PROCESO 2016	5	1444.44	44.4	0
EN PROCESO 2017-2018	1	1110.5	68	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11	89.45	885.017	0
INAUGURADAS 2014	1	19.96	2	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	17.59	4.12	0
CONCLUIDAS 2015	3	22.53	311.397	0
CONCLUIDAS 2016	6	29.37	567.5	0
FERROVIARIO	1	2859.44	25	1
EN PROCESO 2017-2018	1	2859.44	25	1
PUERTOS	8	1127.73	0	0
INAUGURADAS 2015	3	42.89	0	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	19.5	0	0
CONCLUIDAS 2015	2	70.6	0	0
EN PROCESO 2017-2018	1	537.14	0	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	457.6	0	0
AEROPUERTOS	3	657	0.18	0
INAUGURADAS 2016	1	185	0	0
EN PROCESO 2017-2018	2	472	0.18	0
Total general	54	10922.24	7576.325	2

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		66,484.0	66,484.0
TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA.		63,862.0	63,862.0
MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		3.0	3.0
MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		3.0	3.0

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	29.93	32.55	28.3	90.78
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	4	5	5	5
JORNALES	340,523	340,181	278,789	959,493.00
BENEFICIARIOS	4,456	5,072	4,224	13,752
LONGITUD	813.34	158.00		971.34
CAMINOS			120	120

Fecha de recepción: lunes, 05 de diciembre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.2.DG.0343/2016 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1- / 653 /2016 enviado por la DGAPDCST

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	1,229	23		1,252
INMUEBLES ESCOLARES	1,059			
CENTROS DE SALUD	67			
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	47			
OFICINAS DE GOBIERNO	38			
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	10			
ESPACIOS PÚBLICOS	8			



2 AUTOISTAS



29 CARRETERAS



11 CAMINOS RURALES



1 FERROVIARIO



8 PUERTOS



3 AEROPUERTOS



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión MDP	Observaciones	Meta (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	ECF 3 - CARMEN SERDAN	16/02/2014	15/09/2014	19.96	TRAMO INAUGURADO 0+000 AL 2+000 EL 22-NOV-14	2.00	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096220023	0
2	SEGUNDO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA	01/01/2013	01/04/2015	203.04	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO INAUGURADO EL 26-11-2015 INAUGURADA 20-MAR-15.	0.23	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	7096220001	PE
3	MODERNIZACION MALECON	12/10/2014	10/04/2015	20.66		MALECON	INAUGURADAS 2015	PUERTOS	1209J2R0002	0
4	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2	25/11/2013	31/12/2014	12.10	INAUGURADA 20-MAR-15	9500m2	INAUGURADAS 2015	PUERTOS	1109J2R0009	0
5	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2 DEL PUERTO ENSENADA	05/11/2012	12/09/2013	10.13	INAUGURADA 20-MAR-15	10,000m2	INAUGURADAS 2015	PUERTOS	1109J2R0009	0
6	CG-124 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TIJUANA - ROSARITO - TECATE.	30/06/2014	31/03/2016	670.50	REG.CARTERA INV. 15092110007 14092110003 13092110003. INAGURADO EL DIA 09 DE MAYO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA	100.00	INAUGURADAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	7 14092110003 1	PNI328
7	PUERTA DE LAS CALIFORNIAS. CRUCE FRONTERIZO EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA	01/07/2013	15/11/2015	185.00	1.DURANTE LOS MESES DE OCT Y NOV. SE ESTARÁ REALIZANDO LA RECEPCIÓN Y PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ESTADOUNIDENSES, Y LA PUESTA EN OPERACIÓN. INAUGURADA 7-04-2016	CRUCE FRONTERIZO	INAUGURADAS 2016	AEROPUERTOS		0
8	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS DEL KM 31+900 AL KM 36+500 INCLUYE: UN (1) PUENTE KM 32+340 UN (1) ENTROQNUE	15/02/2014	31/05/2014	140.40	FORMA PARTE DEL PROYECTO "TECATE - EL SAUZAL"	4.6 1 PUENTE Y 1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	9096220001	0
9	MEXICALI – SAN FELIPE, TRAMO: EL FARO – SAN FELIPE, DEL KM 106+000 AL KM 111+000, INCLUYENDO 06 ESTRUCTURAS	01/06/2013	01/12/2013	108.50	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	6096220004	PNI202
10	CARRETERA ENSENADA - LAZARO CARDENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNTA COLNETT DEL KM. 78+700 AL 87+258, INCLUYE PUENTE BUENOS AIRES EN EL KM 84+784.	15/02/2014	31/12/2014	102.30	N/A	8.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	8096220002	0
11	AMPLIACION MUELLE DE CABOTAJE EN EL PUERTO DE ENSENADA	01/12/2011	01/03/2013	19.50	N/A	1,000 m ² (Area)	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS	1009J2R0002	0
12	EL CONDOR - JOSE MA. PINO SUAREZ	01/03/2014	30/11/2014	17.59	N/A	4.12	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096220020	0
13	MEXICALI-LAGUNA CHAPALA TRAMO PUERTECITOS - LAGUNA CHAPALA SUBTRAMO DEL KM. 146+000 AL KM. 170+500. PUENTE KM. 158+055	16/10/2013	18/03/2015	236.60	CORRESPONDE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FELIPE LAGUNA CHAPALA TRAMO PUERTECITOS LAGUNA CHAPALA. FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO.	24.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	6096220004	0
14	LIBRAMIENTO DE ENSENADA (PRIMERA ETAPA (TERRACERIA)	15/02/2014	28/02/2015	139.40	NO ES FACTIBLE INAUGURAR TODA VEZ QUE LOS TRABAJOS ESTAN A NIVEL DE TERRACERIAS. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA A NIVEL TERRACERIA N/A FICHA TECNICA.	2.10	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	7096220005	PE
15	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	01/09/2015	15/12/2015	105.06	N/A	55.80	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	0
16	CONSTRUCCION ENTRONQUE EL FARO KM38+600 CARRET. MEXICALI-SAN FELIPE	16/10/2014	08/05/2015	75.70	CON ESTA OBRA SE CONCLUYE EJE CARRETERO MEXICALI - SAN FELIPE, SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES DE INAUGURAR CON LA OBRA OB SCT 00005	0.71	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	8096220003	0
17	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	23/03/2015	14/12/2015	65.61	EN ESTE SUBPROGRAMA CONSIDERAN 17 CONTRATOS PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA RED SE EJERCIO 40.6 MDP.	1,842.10	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
18	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL ENTRONQUE NODO PEMEX	24/04/2015	31/12/2015	51.40	LA PRIMERA ETAPA SE ENCUENTRA CONCLUIDA N/A FICHA TECNICA, EN EL 2016 SE ESTA CONSTRUYENDO LA SEGUNDA ETAPA. NO APLICA FICHA TECNICA	1 ENTRONQUE	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096220002	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión MDP	Observaciones	Meta (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
19	TECATE-EL SAUZAL, TRAMO: TECATE- SAN ANTONIO DE LAS MINAS.	01/08/2014	30/09/2015	47.60	FORMA PARTE DEL PROYECTO "TECATE EL SAUZAL". EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.	TRES (3) PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	9096220001	0
20	MODERNIZACION DE LA CARRETERA: ENSENADA - LAZARO CARADENAS, TRAMO: MANEADERO - PUNT COLONET	24/04/2015	14/11/2015	44.16	EN PROCESOS DE CIERRE ADMINISTRATIVO	3.14	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	8096220002	0
21	ADECUACION Y MODERNIZACION DE ACCESOS 1 Y 2	08/12/2014	15/12/2015	39.71	N/A	9500m2	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	1109J2R0009	0
22	MODERNIZACION DEL MALECON	01/11/2015	31/12/2015	30.89	NO HAY RESPUESTA DE CONTACTO 23-NOV-2016.	MALECON	CONCLUIDAS 2015	PUERTOS	1209J2R0002	0
23	AMPLIACION CRUCE INTERNACIONAL PUERTA MEXICO/SAN ISIDRO EL CHAPARRAL	01/12/2014	01/04/2015	19.55	SE TRATA DE UNA OBRA ESTATAL, EL CENTRO SCT UNICAMENTE LLEVO ACABO LA DEMOLICION DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "LAS CONCHAS", POR LO QUE NO ES SUCEPTIBLE DE INAUGURAR EN ESTE PROGRAMA CONSIDERAN 2 CONTRATOS PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA RED.	1.00	CONCLUIDAS 2015	AUTOPISTAS	10096220001	PNI141
24	BARRERA DE PROTECCION	02/05/2015	28/10/2015	14.87	EN ESTE PROGRAMA CONSIDERAN 2 CONTRATOS PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA RED.	8.80	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
25	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	01/08/2015	14/12/2015	14.59	EN ESTE PROGRAMA CONSIDERAN 2 CONTRATOS PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE LA RED.	819.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
26	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/06/2015	30/11/2015	8.08	N/A	150.85	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
27	PAQUETE DE DOS (2) OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	01/05/2015	31/10/2015	7.95	PAGO DE ADEUDOS (12-FEB-2016), POR 0.382 MDP. EL CONTRATISTA SIGUIO TRBAJANDO POR SU CUENTA. ANEXAR FINIQUITO.	46.18	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
28	PAQUETE DE DIEZ (10) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/05/2015	31/10/2015	6.50	CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA HASTA SU CONCLUSIÓN, PAGO COMO ADEUDOS (12-FEB-2016), POR 0.291 MDP.	114.37	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
29	SEÑALAMIENTO VERTICAL	01/08/2015	14/12/2015	3.17	N/A	1,818.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001	0
30	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	01/08/2015	14/12/2015	0.99	N/A	98 PUENTES	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110005	0
31	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	01/04/2016	05/12/2016	83.09	EN PROCESO DE LICITACION Y PAGO DE ADEUDOS 2015 POR 10.56 MDP.	1,842.10	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
32	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	04/04/2016	05/08/2016	75.53	N/A	19.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
33	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	09/03/2016	01/09/2016	36.76	N/A	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
34	SEÑALAMIENTO VERTICAL	23/03/2016	01/09/2016	27.18	EN PROCESO DE LICITACION Y PAGO DE ADEUDOS 2015 POR 1.73 MDP.	SEÑALAMIENTO VERTICAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
35	BARRERA DE PROTECCION	09/03/2016	01/09/2016	15.08	SE EJECUTARA EN LOS 5 MUNICIPIOS. EN PROCESO DE LICITACION.	BARRERA DE PROTECCIÓN	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
36	PAQUETE III OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	16/02/2016	05/08/2016	7.12	N/A	238.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
37	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/05/2015	31/03/2016	7.00	N/A	154.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
38	PAQUETE DE SEIS (6) OBRAS DE CONSERVACION DE C	01/05/2015	13/03/2016	5.68	N/A	86	CONCLUIDAS 2016	OS RURALES Y ALIMENTA	14092100002	0
39	PAQUETE 1 (UNO) OBRA DE CONSERVACION DE CARRETERA ALIMENTADORA	16/09/2015	31/03/2016	3.49	PAGO DE ADEUDOS (EN TRAMITE), POR 1.245 MDP	1.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
40	PAQUETE II OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	16/02/2016	31/08/2016	3.07	N/A	42.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
41	PAQUETE I OBRA DE CONSERVACION DE CARRET. ALIMENTADORAS	16/02/2016	31/08/2016	3.01	N/A	44.80	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
42	RUTINARIA DE PUENTES	01/04/2016	01/10/2016	2.60	N/A	208 PUENTES	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0
43	TECATE - EL SAUZAL	01/01/2013	31/12/2016	715.60	EN EL AÑO 2016 SE EJECUTARA 7.5 KM Y LOS PUENTES FALTANTES. EN EL AÑO 2016 SE MODERNIZAN 7.5 KM Y TRES PUENTES.	13.70	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	9096220001	PE

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión MDP	Observaciones	Meta (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
44	CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES Y UN ENTRONQUE Y PAVIMETACION DEL KM 170+500 AL KM 201+238	16/02/2016	31/12/2016	290.00	EN EL 2016 SE TIENE EN PROCESO LICITACION LA PAVIMENTACION DEL KM 170+500 AL KM 201+392 Y 5 PUENTES.	5 PUENTES 30.73 KM	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	6096220004	PE
45	CONSTRUCCION DE 4 PUENTES: LAS ARRASTRAS II Y LAS ARRASTRAS III, CARR: MEXICALI - LAGUNA CHAPAL	30/04/2015	22/12/2016	201.74	SE REVALIDO CON FECHA 16 DE ENERO DE 2016. EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS.	30.70	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	6096220004	0
46	LIBRAMIENTO ENSENADA (SUPRESION POR VIADUCTO DE 170 M) INCLUYE: ENTR CALAFIA CON 1 PIV Y VIADUCTO KM 19+300	24/04/2015	31/12/2016	167.10	LA CARTERA DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, EL NUMERO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO ES LIBRAMIENTO DE ENSENADA NUMERO 16533.	2.1 1 VIADUCTO	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	7096220005	0
47	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA NODO PEMEX	16/02/2016	31/12/2016	70.00	OBRA SUSPENDIDA SE ANEXA OFICIO. SE TERMINO PRIMERA ETAPA ID OB_SCT_01567, SE INICIA SEGUNDA ETAPA. MONTO EJERCIDO AL 04-MAYO-2016 14.20 MDP	--	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096220002	0
48	CG-123 ESTABLECER, JUNTO CON EL GOBIERNO ESTATAL, UN SISTEMA DE TRANSPORTE ARTICULADO BRT	23/08/2013	28/04/2017	2,859.44	APORTACIONES: - FONADIN 17.81% - MUNICIPAL 19.71% - PRIVADO 62.48	25.00	EN PROCESO 2017-2018	FERROVIARIO	12093110007	PNI527
49	ENSENADA - PUNTA COLONET	01/01/2013	01/12/2018	1,110.50	DEL 2013 AL 2015 SE HA MODERNIZADO 20.7 KM DE 73 KM FALTANTES. EN EL AÑO 2016 SE MODERNIZAN 14.5 KM.	68.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	8096220002	PE
50	ESTRUCTURAS DE PROTECCION	21/12/2015	31/12/2017	537.14	NO SE TIENE RESPUESTA DE CONTACTO 23-NOV-2016.	PUERTO	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	0809J2R0003	0
51	AMPLIACION DEL AEROPUERTO TIJUANA	01/01/2015	31/12/2018	426.00	N/A	0.18	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI094
52	AMPLIACION DE EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO DE MEXICALI	01/01/2016	01/01/2017	46.00	N/A	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		0
53	CRUCE INTERNACIONAL OTAY II/OTAY EAST	01/03/2017	30/04/2018	1,350.00	NO HAY CONTACTO SE VERIFICO REGISTRO DE CARTERA DE INVERSIÓN Y NO EXISTE.	3.75	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	10096220005	PNI478
54	AMPLIACIÓN DE LA DÁRSENA DE CIABOGA Y CANALES DE NAVEGACIÓN	30/04/2017	30/11/2017	457.60	NO HAY RESPUESTA DE CONTACTO 23-NOV-2016.	DÁRSENA	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS	1409J2R0001	0
