



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
BAJA CALIFORNIA SUR**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

DICIEMBRE 2016

SCT BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

| | |
|--|-------------------|
| | 1 AUTOPISTAS |
| | 11 CARRETERAS |
| | 1 CAMINOS RURALES |
| | 0 FERROVIARIO |
| | 0 PUERTOS |
| | 3 AEROPUERTOS |


ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

Suma de Inversión Total



ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

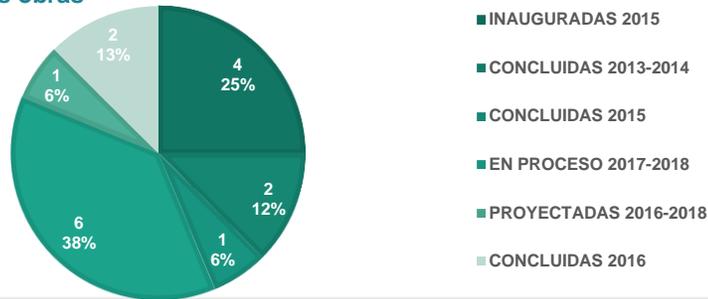

AVANCE EN PROGRAMAS

| TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) | 2014 | 2015 | TOTAL |
|---|------|----------|----------|
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES | | 66,484.0 | 66,484.0 |
| TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PF | | 63,862.0 | 63,862.0 |
| MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROG | 3.0 | | 3.0 |
| MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS | | 3.0 | 3.0 |



| PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| INVERSION | 29.93 | 27.31 | 29.3 | 86.54 |
| MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT | 4 | 5 | 5 | 5 |
| JORNALES | 340,523 | 277,399 | 289,235 | 907,157 |
| BENEFICIARIOS | 4,456 | 5,772 | 5,382 | 15,610 |
| LONGITUD | 813.34 | 158.00 | | 971.34 |
| CAMINOS | | | 204 | |

Fecha de recepción: viernes, 09 de diciembre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.3.303.1338/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/ 654 /2016 enviado por la DGAPDCST

A la fecha, la SCT invierte

Obras: **16**
MDP: **10,947.6**
Km: **13,419.4**

| Concepto | No. Obras | Inversión total MDP | Longitud (KM) | CG |
|--|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| AUTOPISTAS | 1 | 2500 | 40 | 0 |
| INAUGURADAS 2015 | 1 | 2500 | 40 | 0 |
| CARRETERAS FEDERALES | 11 | 7680.68 | 13223.71 | 0 |
| INAUGURADAS 2015 | 3 | 478.7 | 147.04 | 0 |
| CONCLUIDAS 2013-2014 | 2 | 115.7 | 36 | 0 |
| CONCLUIDAS 2015 | 1 | 177.99 | 1376.5 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 4 | 6689.59 | 10287.74 | 0 |
| CONCLUIDAS 2016 | 1 | 218.7 | 1376.43 | 0 |
| CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 1 | 108.03 | 155.72 | 0 |
| CONCLUIDAS 2016 | 1 | 108.03 | 155.72 | 0 |
| AEROPUERTOS | 3 | 658.88 | 0 | 0 |
| EN PROCESO 2017-2018 | 2 | 430.3 | 0 | 0 |
| PROYECTADAS 2016-2018 | 1 | 228.58 | 0 | 0 |
| Total general | 16 | 10947.59 | 13419.43 | 0 |



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

| No. | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Termino | Inversión Total | Observaciones | Longitud (KM) | Situación actual | SECTOR | Registro de Cartera | PNI PUB |
|-----|---|--------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------|
| 1 | LIBRAMIENTO SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS | 01/12/2011 | 31/08/2015 | 2,500.00 | OBRA A INAUGURAR EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE MODIFICA LA INVERSION A 2,500.00 INCLUYENDO EL PAGO DE DERECHO DE VIA. | 40.00 | INAUGURADAS 2015 | AUTOPISTAS | 07096230004 | PNI511 |
| 2 | LIBRAMIENTO TODOS SANTOS | 01/11/2011 | 01/10/2013 | 342.00 | INAUGURADA 06-FEB-15 | 8.24 | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 07096230004 | PNI224 |
| 3 | STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000) | 02/02/2012 | 01/12/2013 | 70.70 | INAUGURADA 06-FEB-15 | 23.00 | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 1109630004 | 0 |
| 4 | PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS | 01/10/2014 | 01/12/2014 | 66.00 | INAUGURADA 06-FEB-15, LOS RECURSOS PROVIENEN FONDO DE DESASTRES NATURALES, ACUERDO SE.172.03 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014. | 115.80 | INAUGURADAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | | 0 |
| 5 | RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000) | 02/02/2012 | 01/12/2013 | 83.80 | OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA SU AFECTACION | 26.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 11096230005 | 0 |
| 6 | E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000 | 01/02/2012 | 01/09/2013 | 31.90 | OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE RADICARON RECURSOS PARA SU AFECTACION. | 10.00 | CONCLUIDAS 2013-2014 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230001 | 0 |
| 7 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS) | 01/01/2015 | 30/11/2015 | 177.99 | NOTA: DERIVADO DE LA REDUCCION DE RECURSOS POR PARTE DE LA SHCP, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA RGCC TIENE UN ADEUDO DE OBRA EJECUTADA Y AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$ 6'837,851.11 | 1,376.50 | CONCLUIDAS 2015 | CARRETERAS FEDERALES | 14092110003 | 0 |
| 8 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS) | 01/02/2016 | 30/11/2016 | 218.70 | AVANCE FINANCIERO DEL 99.2%. SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS | 1,376.43 | CONCLUIDAS 2016 | CARRETERAS FEDERALES | 15092110007 | 0 |
| 9 | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016 | 15/03/2016 | 16/10/2016 | 108.03 | SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%. SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA -RECEPCION DE LAS OBRAS | 155.72 | CONCLUIDAS 2016 | CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES | 15092100001 | 0 |
| 10 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES | 01/03/2014 | 31/12/2020 | 2,889.69 | | 30.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230004 | 0 |
| 11 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO | 01/03/2014 | 31/12/2018 | 2,600.00 | | 35.74 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 11096230002 | 0 |
| 12 | PUERTO ESCONDIDO - LORETO | 01/01/2013 | 31/12/2018 | 680.00 | | 22.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 12096230005 | PE |
| 13 | PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM. 173+000) | 01/02/2006 | 31/12/2018 | 519.90 | FALTA POR PAVIMENTAR 18.5 KMS., SE CUENTA CON ESTUDIOS Y PROYECTOS., EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 NO SE CONTO CON RECURSOS | 10,200.00 | EN PROCESO 2017-2018 | CARRETERAS FEDERALES | 06096230003 | 0 |
| 14 | MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO | 01/01/2015 | 07/12/2018 | 404.80 | INFORMACION MODIFICADA DE ACUERDO A INFORMACION ENVIADA | AEROPUERTO | EN PROCESO 2017-2018 | AEROPUERTOS | | PNI002 |
| 15 | MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ | 01/01/2015 | 01/01/2018 | 25.50 | MODIFICADO DE ACUERDO A INFORMACION ENVIADA | AEROPUERTO | EN PROCESO 2017-2018 | AEROPUERTOS | | PE |
| 16 | CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO. | 03/07/2017 | 06/12/2020 | 228.58 | SE TIENE SOLICITUD DE REGISTRO EN CARTERA NUM. 46457, ANTE LA SHCP PARA SU AUTORIZACION O EN SU CASO DE OBSERVACIONES PARA SER ATENDIDAS. | AEROPUERTO | PROYECTADAS 2016-2018 | AEROPUERTOS | | PE |
