



**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
CAMPECHE**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**DICIEMBRE 2016**


SCT CAMPECHE 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CONSTRUCCIÓN DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFÉRICO DE CAMPECHE

Obras MDP Km


A la fecha, la SCT invierte **41** **12,038.0** **3,332.0**

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

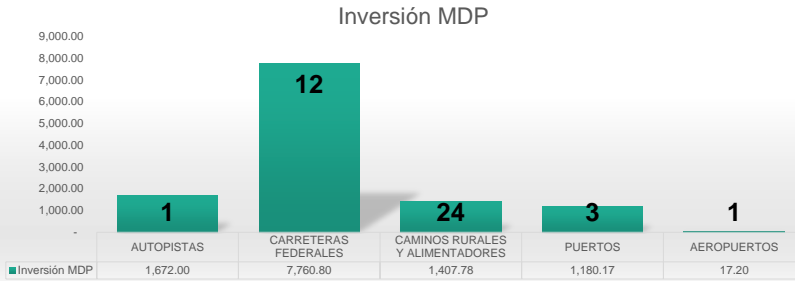

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

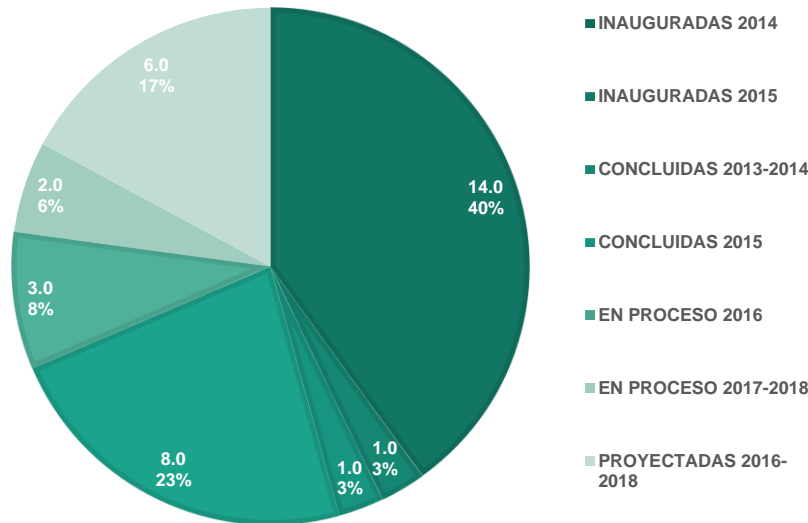

RIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOPISTAS</b>	<b>1</b>	<b>1672</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
PROYECTADAS 2016-2018	1	1672	12	0
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>12</b>	<b>7760.8</b>	<b>1404.4</b>	<b>1</b>
INAUGURADAS 2014	3	752.9	5.4	0
INAUGURADAS 2015	1	1650	26.3	1
CONCLUIDAS 2015	1	90.6	0	0
EN PROCESO 2016	2	412.3	1313.5	0
EN PROCESO 2017-2018	1	500	16.5	0
PROYECTADAS 2016-2018	4	4355	42.7	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>24</b>	<b>1407.78</b>	<b>1915.51</b>	<b>0</b>
INAUGURADAS 2014	11	111.39	144.06	0
CONCLUIDAS 2015	6	588.79	950.25	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	50	12	0
CONCLUIDAS 2016	6	657.6	809.2	0
<b>PUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>1180.17</b>	<b>0.116</b>	<b>2</b>
CONCLUIDAS 2013-2014	1	18.79	0	0
EN PROCESO 2016	1	183.11	0	1
EN PROCESO 2017-2018	1	978.27	0.116	1
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>1</b>	<b>17.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2015	1	17.2	0	0
<b>Total general</b>	<b>41</b>	<b>12037.95</b>	<b>3332.026</b>	<b>3</b>

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		78,905.0	78,905.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		78,905.0	78,905.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		44,146.0	44,146.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS ENTREGADOS		7.0	7.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS		10.0	10.0



MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
<b>INVERSIÓN</b>				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	612			612
INMUEBLES ESCOLARES	442			442
CENTROS DE SALUD	90			90
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	56			56
OFICINAS DE GOBIERNO	14			14
ESPACIOS PÚBLICOS	7			7

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL



1 AUTOPISTAS



12 CARRETERAS



24 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



3 PUERTOS



1 AEROPUERTOS



P.



INVERSION	32.41	33.14	40.60	<b>106.15</b>
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	11	11	11	<b>11</b>
JORNALES	363,535	345,622	400,505	<b>1,109,662</b>
BENEFICIARIOS	6,511	5,793	7,068	<b>19,372</b>
LONGITUD	823.71	772.00		<b>1,595.71</b>
CAMINOS			201	

Fecha de recepción: viernes, 09 de diciembre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.4.418.039 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/ 655 /2016 enviado por la DGAPDCST

CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3			3
--------------------------	---	--	--	---

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
1	CONSTRUCCIÓN DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES EN EL PERIFÉRICO DE CAMPECHE	01/08/2012	01/12/2013	393.40	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	10096240004; 12096240001	0
2	CONSTRUCCIÓN DE 3 DISTRIBUIDORES VIALES, CARRETERA CAMPECHE – MÉRIDA	01/04/2013	01/12/2013	254.00	INAUGURADA 31-OCT-14	3 Dist	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	08096240011	0
3	AV HÉROES DE NACUZARI (RAMAL AEROPUERTO DE CAMPECHE)	01/07/2013	01/03/2014	105.50	INAUGURADA 31-OCT-14	5.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003 10096240004	0
4	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (VHSA-ESC)- DIVISIÓN DEL NORTE-CANDELARIA, TRAMO HARO - DON SAMUEL	01/04/2013	01/10/2013	15.98	INAUGURADA 31-OCT-14	5.42	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	0
5	CAMINO NUEVA VIDA - UNIÓN 20 DE JUNIO - RICARDO FLORES MAGON, DEL KM 0+000 AL 22+700 KM	01/04/2013	01/10/2013	14.32	INAUGURADA 31-OCT-14	22.70	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
6	CONSERVACIÓN DEL CAMINO DZIBALCHEN - FRANCISCO J. MÚJICA, DEL KM 0+000 AL KM 16+600	01/04/2013	01/10/2013	11.87	INAUGURADA 31-OCT-14	16.60	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
7	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHAMP-ESC) - MIGUEL COLORADO, DEL KM 0+000 AL KM 9+580	01/04/2013	01/11/2013	11.44	INAUGURADA 31-OCT-14	9.58	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
8	ULUMAL-VILLA DE GUADALUPE-SAN MIGUEL, DEL KM 2+440 AL KM 23+200 (TRAMOS AISLADOS)	01/04/2013	01/11/2013	11.16	INAUGURADA 31-OCT-14	20.76	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
9	CONSERVACIÓN DEL CAMINO EL DESENGAÑO - ALIANZA PRODUCTORA.	01/05/2013	01/10/2013	10.91	INAUGURADA 31-OCT-14	12.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
10	CONSERVACIÓN DEL CAMINO ALIANZA PRODUCTORA - LA UNIÓN - LA PAZ.	01/05/2013	01/10/2013	10.40	INAUGURADA 31-OCT-14	14.30	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
11	E.C- CHAMP. – CAMP. – EL ZAPOTE) – SAN JOSE CARPIZO 2, DEL KM 0+000 AL KM 22+100 (T.A.)	01/07/2013	01/11/2013	8.43	INAUGURADA 31-OCT-14	22.10	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
12	CONSERVACIÓN DEL CAMINO PEDREGAL - CAMPO LA OLLA.	01/05/2013	01/10/2013	8.17	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
13	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (MONCLOVA-SAN JUAN)-HÉCTOR PÉREZ MORALES	01/05/2013	01/10/2013	5.38	INAUGURADA 31-OCT-14	5.90	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
14	CONSERVACIÓN DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - CAÑAVERAL, DEL KM 0+000 AL 7+200 (T.A.)	01/07/2013	01/11/2013	3.33	INAUGURADA 31-OCT-14	7.20	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	0
15	CG-062 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE	01/12/2012	25/09/2015	1,650.00	INAUGURADO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015. ESTA OBRA SE FUSIONO CON EL ID OB_SCT_01206, PARA CONVERTIRSE EN EL CG-062, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM. CGPG/STG/108/2016 DE FECHA 4/JUL/2016	26.30	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096240001	PNI479
16	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION DE ACCESO EN BOCA CHICA, CAMPECHE.	01/04/2014	01/10/2014	18.79	N/A	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		0
17	CONSERVACIÓN DE 902.15 KM DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/02/2015	30/12/2015	378.79	LA CONSERVACIÓN SE APLICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	902.15	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
18	CAMPECHE - MÉRIDA, DISTRIBUIDOR VIAL DZITBALCHE	01/03/2013	31/12/2015	90.60	N/A	1 DIST VIAL	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14096240001	PNI340
19	XPUJIL - DZIBALCHEN (TR: X-CANHA - DZILBACHEN)	01/08/2015	30/12/2015	60.00	N/A	17.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240005	0
20	SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO - E.C (NUEVA COAHUILA - EL DESENGAÑO)	01/06/2015	31/12/2015	60.00	N/A	12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	0
21	NUEVO COAHUILA - EL DESENGAÑO	01/06/2015	30/12/2015	50.00	N/A	9.50	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	0
22	E.C. (VHSA-ESC)-DIVISIÓN DEL NORTE-CANDELARIA	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	5.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	0
23	CERRO LAS ÁGUILAS - EL DESENGAÑO	01/08/2015	30/12/2015	20.00	N/A	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096240001	0
24	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 500 MIL LITROS EN CD DEL CARMEN	01/04/2014	30/11/2015	17.20	FORMA PARTE DEL PNI AMPLIADO	1 TANQUE	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
25	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 756.7 KMS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15/02/2016	30/11/2016	419.60	EL PROGRAMA SE LLEVA A CABO EN 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO	756.70	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
26	XPUJIL-DZIBALCHE, TR. XCANHA-DZIBALCHEN 78 AL 94	15/04/2016	14/11/2016	70.00		16.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240005	0
27	XPUJIL - DZIBALCHEN (TR: XPUJIL - X-CANHA)	15/04/2016	14/11/2016	60.00		12.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240003	0
28	NVO COAHUILA-CERRO LAS ÁGUILAS	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096240001	0
29	SN MANUEL NVO CANUTILLO-EC(NVO COAHUILA-DESENGAÑO)	15/04/2016	14/11/2016	40.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096240006	0
30	DIVISIÓN DEL NORTE-CANDELARIA, 0 AL 8	15/04/2016	14/11/2016	28.00		8.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096240002	0
31	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 2016	05/02/2016	30/12/2016	327.30	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE CANDELARIA II, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS EN 51 KMS, REHABILITACION DE 1 OBRA DE DRENAJE, ATENCION DE 1 PUNTO DE CONFLICTO, 12 OBRAS DE CONSERV.RUT.	1,313.50	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110005	0
32	CG-066 MODERNIZAR EL PUERTO DE SEYBAPLAYA	01/04/2013	31/12/2016	183.11	SE DIFIERE EL TERMINO DE LA OBRA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LO COMUNICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS	MUELLE	EN PROCESO 2016	PUERTOS	11095100001	PNI177

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUB
33	DISTRIBUIDOR VIAL HECELCHAKAN	01/03/2016	27/12/2016	85.00	EL DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III, ORIGINALMENTE REGISTRADO EN ESTA ID, FUE REGISTRADO COMO OBRA INDIVIDUAL CON EL ID OB_SCT_02477. SE MODIFICA FECHA CONCLUSION DE OBRA POR MODIFICACIONES AL PROYECTO	2 DIST VIAL	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PNI340
34	CG-063 MODERNIZAR EL PUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN	28/11/2013	31/10/2017	978.27	"SE REQUIEREN 228.21 MDP PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN OCTUBRE 2017."	0.12	EN PROCESO 2017-2018	PUERTOS	12095100003	PNI429
35	CHAMPOTÓN - VILLA MADERO	01/03/2016	01/12/2018	500.00	PARA EL EJERCICIO 2016, SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 12.26 KMS., CUERPO IZQUIERDO AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE, TRAMO CHAMPOTON - VILLAMADERO (TRAMO LIBRE), ENTRE LOS KMS. 148 AL 160.25	16.50	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
36	LIBRAMIENTO DE ATASTA	02/01/2017	01/12/2019	3,000.00	N/A	14.70	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096240002	PE
37	CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DEL LIBRAMIENTO CARRETERO CIUDAD DEL CARMEN PARA MEJORAR LAS VIALIDADES	01/03/2017	30/11/2018	1,672.00	SE CANCELA ESTA OBRA COMO COMPROMISO DE GOBIERNO CG-062, SEGÚN OFICIO CGPG/STG/108/2016. EL NUEVO COMPROMISO CG-062 ES LA OBRA CON EL ID OC_SCT_00258	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	AUTOPISTAS	No. Solicitud 48002	PNI575
38	LIBRAMIENTO DE CHAMPOTÓN	02/01/2017	01/12/2018	820.00	N/A	18.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43053	PE
39	LIBRAMIENTO DE ESCÁRCEGA	02/01/2017	31/12/2018	450.00	N/A	10.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	43851	PE
40	DISTRIBUIDOR VIAL TENABO III	01/03/2017	31/12/2017	85.00	ESTA OBRA FORMABA PARTE DEL ID OB_SCT_01589	1 DIST VIAL	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096240002	PE
41	LUBNA – KIKAB – LAGUNA GRANDE	02/01/2017	31/12/2017	50.00	EL REGISTRO DE CARTERA DE INVERSION ESTA EN TRAMITE. LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2015, FUERON RETIRADOS POR LA SHCP	12.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	41735	0
