



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

BALANCE DE OBRAS DEL CENTRO SCT CHIAPAS CIERRE DE DICIEMBRE 2018

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**


ENERO 2019




SCT CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, ENERO 2019

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

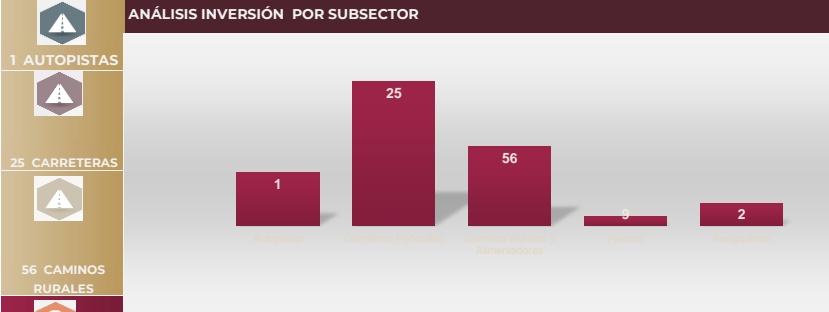

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

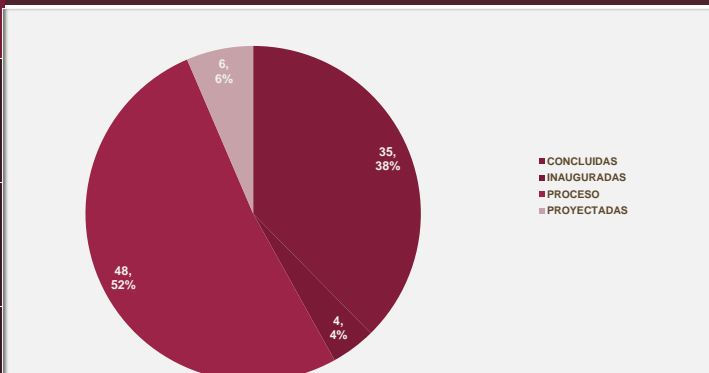

A la fecha, la SCT invierte en la Entidad: **93** Obras, **17,808.7** MDP, **29,127.6** Km

Concepto	No. Obras	INVERSIÓN total (MDP)	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	3,094.50	178	0
PROCESO 2018-2027	1	3,094.50	178	0
CARRETERAS FEDERALES	20	6,294.77	865.531	4
PROCESO 2018-2027	9	4,024.47	525.26	2
PROYECTADAS 2019-2024	4	954.00	95	0
CONCLUIDAS 2013-2017	6	826.10	73.271	1
INAUGURADAS 2013-2017	1	490.20	172	1
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES	4	1,557.34	4918.76	2
PROCESO 2018-2027	1	490.00	74	1
CONCLUIDAS 2013-2017	2	812.69	4758.36	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	254.65	86.4	1
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	2	510.95	4745.83	0
CONCLUIDAS 2018	1	255.00	2368.65	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	255.95	2377.18	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	50	3,426.16	16454.68	0
PROCESO 2018-2027	36	2,951.86	15335.88	0
CONCLUIDAS 2013-2017	14	474.30	1118.8	0
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5	1,137.05	1962.1	1
CONCLUIDAS 2018	1	152.00	258.2	0
CONCLUIDAS 2013-2017	3	593.65	1633.9	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	391.40	70	1
PUERTOS	9	512.94	0.16	0
PROCESO 2018	1	40.00	0	0
PROYECTADAS 2019-2024	2	45.24	0	0
CONCLUIDAS 2013-2017	6	427.70	0.16	0
AEROPUERTOS	2	1,275.02	2.5	0
CONCLUIDAS 2013-2017	1	6.02	0	0
INAUGURADAS 2013-2017	1	1269.00	2.5	0
Total general	93	17,808.73	29,127.56	7

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2015	Continuidad 2016	Total
INVERSIÓN TDT	1,917.95	11.85	1,929.80
TELEVISIONES ENTREGADAS	696,715	3,972	696,715
MUNICIPIOS ENTREGADOS TDT	116		116
BENEFICIARIOS TDT	730,299		730,299
Total general	1,917.95	1,966.83	3,884.78



MÉXICO CONECTADO	2014-2017
INVERSIÓN MEXICO CONECTADO	448.39
INVERSIÓN PUNTOS MEXICO CONECTADO	49.30
MONTO DE LOS CONTRATOS DE MEXICO CONECTADO	399.09
SITIOS CONTRATADOS	4,333
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL SITIOS DE INTERNET	4.3%
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ESTATAL INVERSIÓN	5.0%
Total general	1,229.07

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL						
INVERSIÓN EJERCIDA PET	101.42	53.98	97.50	58.69	49.80	361.39
BENEFICIARIOS PET	21,385	20,805	21,837	13,374	12,448	201,849
CAMINOS PET	0	0	397	267	267	397
JORNALES PAGADOS PET	1,147,950	1,044,069	960,774	457,691	457,691	4,068,175
MUNICIPIOS ATENDIDOS PET	86	0	118	70	70	118
LONGITUD PET	2,600	1,912	0	1,146	0	5,658
Total general	1,172,117.99	1,098,838.98	961,174.50	472,806.86	587,213.80	4,276,358.13

Fecha de recepción: Lunes 14 de enero del 2019, mediante Oficio No.: SCT.11.005/2019 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2018, mediante el Oficio No.6.0.1/ 702 /2018 enviado por la DGAPDCST.

DATOS DE COMUNICACIONES	2016	Var %
HOGARES CON SEÑAL DE TV DIGITAL	1,024,472	161%
HOGARES CON INTERNET	173,486	13%
USUARIOS CON TELEFONÍA MÓVIL	2,115,336	21%
USUARIOS DE INTERNET	1,540,909	45%
Total general	5,254,103	

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	1,929.80
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	361.39
MÉXICO CONECTADO	448.39

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



Programas



COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT

ENERO 2019

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS
CHIAPAS CON CIERRE A DICIEMBRE DE 2018

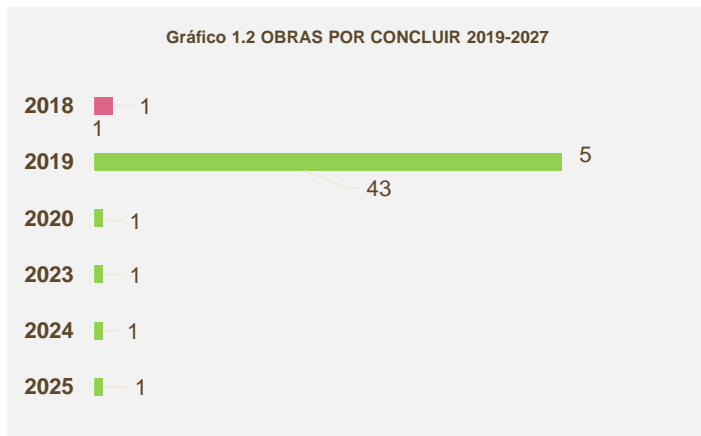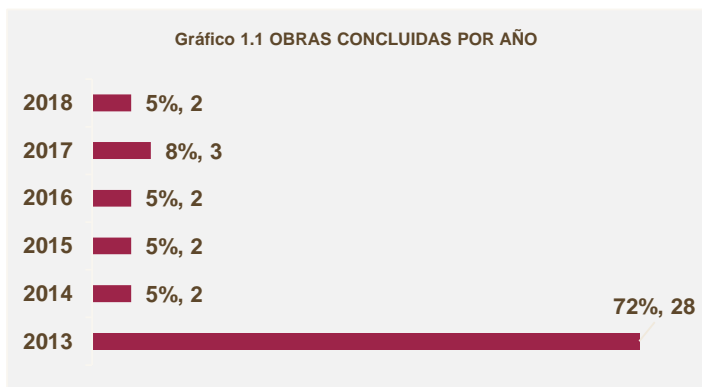

Cuadro 1.3 OBRAS CONCLUIDAS POR SECTOR

SECTOR	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
Caminos Rurales y Alimentadores	20	1,636.20
Carreteras Federales	11	2,869.74
Puertos	6	427.70
Aeropuertos	2	1,275.02
Total general	39	6,208.66

Cuadro 1.1 OBRAS CONCLUIDAS INAUGURADAS

FUNCIONARIO	NO. DE OBRAS	INVERSIÓN MDP
PRESIDENTE	1	1,269.00
SECRETARIO	1	490.20
COORDINADOR GENERAL	2	646.05
Total general	4	2,405.25

Cuadro 1.2 PORCENTAJE DE OBRAS Y AVANCE EN INVERSIÓN

TIPO DE OBRA	OBRAS	INVERSIÓN %
PROCESO	51.61%	59.53%
PROYECTADAS	6.45%	5.61%
CONCLUIDAS	37.63%	21.36%
INAUGURADAS	4.30%	13.51%
Total general	100.00%	100.00%

Se registra un total de 93 Obras con una inversión de 17808.73 mdp

Fecha de recepción: Lunes 14 de enero del 2019 , mediante Oficio No.: SCT.1.11.005/2019 enviado por el CSCT.

Solicitado para el: Lunes 14 de enero del 2019, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 702 /2018 enviado por la DGAPDCST.

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
1	MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (PRIMERA ETAPA)	abr-16	ene-19	3,094.50	178.00	PROCESO 2018-2027	15096270004	PNI656	AUTOPISTAS
2	LA TRINITARIA - PAV. DEL CAMINO JOSE MARIA MORELOS	ago-10	nov-13	27.07	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270010	---	CARRETERAS FEDERALES
3	PUENTE VEHICULAR, EJIDO LEON BRINDIS, MAPASTEPEC.	oct-13	mar-14	10.11	0.05	CONCLUIDAS 2013-2017	13096270006	---	CARRETERAS FEDERALES
4	COAPA - CENICEROS, MUNICIPIO PIJIJAPAN	oct-09	jun-14	34.72	11.00	CONCLUIDAS 2013-2017	09096270011	---	CARRETERAS FEDERALES
5	PUENTE VEHICULAR CAMINO SANTA MARTHA	mar-14	dic-14	9.35	0.02	CONCLUIDAS 2013-2017	14096270035	---	CARRETERAS FEDERALES
6	CG-233 MODERNIZAR LA CARRETERA RANCHO NUEVO - COMITÁN, TRAMO: TEOPISCA - COMITÁN	ene-12	ene-17	720.00	45.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270019	---	CARRETERAS FEDERALES
7	CG-234 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, PRIMERA ETAPA	ene-12	ene-19	1,500.00	35.50	PROCESO 2018-2027	06096270013	---	CARRETERAS FEDERALES
8	RIZO DE ORO-LA CONCORDIA 2 PUENTES	nov-14	ene-19	669.91	2 PUENTES	PROCESO 2018-2027	11096270038	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
9	CG-008 MODERNIZACION CARRETERA A LA FRONTERA DESDE COMITAN	oct-13	ene-19	482.00	400.00	PROCESO 2018-2027	13096270008	PNI339	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
10	PALENQUE-CATAZAJA.	abr-15	ene-19	450.00	26.80	PROCESO 2018-2027	14096270033	---	CARRETERAS FEDERALES
11	CRUCERO TONINA-CRUCERO MONTELIBANO	feb-13	ene-19	347.55	58.00	PROCESO 2018-2027	07096270003	---	CARRETERAS FEDERALES
12	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR: SAN QUINTÍN - SANTA MARTHA COROZAL	may-17	ene-19	188.51	1.00	PROCESO 2018-2027	11096270037	---	CARRETERAS FEDERALES
13	SABANILLA - MOYOS	ene-12	dic-19	114.34	0.70	PROCESO 2018-2027	07096270002	---	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
14	SAN QUINTÍN - RÓMULO CALZADA, TR SANTA MARTHA COROZAL - RÓMULO CALZADA	may-17	dic-23	142.99	0.96	PROCESO 2018-2027	11096270045	---	CARRETERAS FEDERALES
15	MONTE LIBANO - SAN JOSE	ene-12	dic-24	129.17	2.30	PROCESO 2018-2027	09096270016	---	CARRETERAS FEDERALES
16	MODERNIZAR LA CARRETERA QUE VA DE COATZACOALCOS A TUXTLA GUTIERREZ	dic-18	dic-18	450.00	11.00	PROYECTADAS 2019-2024	06096470005	PNI259PNI330	CARRETERAS FEDERALES
17	POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA	ene-19	dic-19	174.00	29.00	PROYECTADAS 2019-2024	11096270051	---	CARRETERAS FEDERALES
18	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: NUEVO HUIXTÁN - BÉLGICA	ene-19	dic-19	186.00	31.00	PROYECTADAS 2019-2024	11096270043	---	CARRETERAS FEDERALES
19	NUEVO HUIXTÁN - NUEVO MOMÓN, TR: BÉLGICA - NUEVO MOMÓN	ene-19	dic-19	144.00	24.00	PROYECTADAS 2019-2024	11096270040	---	CARRETERAS FEDERALES
20	CG-113 MODERNIZAR LOS LIBRAMIENTOS NORTE Y SUR DE TUXTLA GUTIERREZ	nov-13	feb-15	490.20	172.00	INAUGURADAS 2013-2017	13096270009	PNI274	CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
21	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES (40 OBRAS)	mar-15	dic-15	352.81	2,381.18	CONCLUIDAS 2013-2017	14092110001; 14092110003; 14092110004; 14092110005; 14092110006	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
22	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES	feb-16	dic-16	459.88	2,377.18	CONCLUIDAS 2013-2017	15092110004; 15092110005; 15092110006; 15092110007; 15092110008	---	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
23	CG-111 MODERNIZAR LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - VILLAFLORES, PRIMERA ETAPA.	ene-17	ene-19	490.00	74.00	PROCESO 2018-2027	44359	PNI394	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
24	CG-237, REHABILITAR LA CARRETERA MOTOZINTLA - TAPACHULA	ago-13	dic-13	254.65	86.40	INAUGURADAS 2013-2017	12092110016	PNI192	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES
25	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2018	feb-18	dic-18	255.00	2,368.65	CONCLUIDAS 2018	17092110001	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
26	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2017	feb-17	dic-17	255.95	2,377.18	CONCLUIDAS 2013-2017	16092110003	---	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES
27	GALILEA DOS LAGUNAS, RAMAL A YASHLUMILJA	ene-12	dic-14	24.85	11.70	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270023	---	CARRETERAS FEDERALES
28	E.C. ARRIAGA - TONALA - EL TERRERO - OTOTAL	jun-07	dic-08	17.51	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
29	E.C. (LARRAINZAR MITONTIC) ICALUMTIC	ene-12	nov-13	26.77	5.58	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270017	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
30	NUEVO PUENTE - IXTAPILLA - NUEVO TEPEYAC	jun-12	nov-13	27.08	7.42	CONCLUIDAS 2013-2017	12096270010	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
31	EMILIANO ZAPATA CINTALAPA.	abr-12	nov-13	19.22	7.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270039	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
32	E.C. HUITIUPAN-SIMOJOVEL-EL OCOTAL.	jun-12	nov-13	14.35	5.50	CONCLUIDAS 2013-2017	08096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
33	E.C. ARRIAGA - TONALA - OTOTAL (RAMAL GALEANA CALENTURA)	abr-12	jun-14	21.65	10.00	CONCLUIDAS 2013-2017	07096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
34	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	ene-12	jul-14	74.49	13.50	CONCLUIDAS 2013-2017	06096270008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
35	HERMENEGILDO GALEANA LAS DELICIAS	sep-10	sep-14	83.60	26.50	CONCLUIDAS 2013-2017	10096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
36	E.C.E. CHIAPAS NO. 230 CUAUHEMOC	ene-12	sep-14	35.14	9.21	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
37	E.C. (VILLAFLORES -OCOZOCAUTLA) - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	jun-12	sep-14	17.05	4.60	CONCLUIDAS 2013-2017	12096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
38	BOCHIL LUIS ESPINOZA.	ene-12	sep-14	50.08	20.25	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
39	TRES PUENTES BAYALEMO DOS.	ene-12	sep-14	23.74	3.20	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
40	PASO DEL SOLDADO - OJO DE AGUA.	jun-12	sep-14	21.33	6.04	CONCLUIDAS 2013-2017	13096270005	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
41	EL PINAR - E.C. TENEJAPA, TR: KM. 0 + 000 AL 9 + 897.9	ene-12	dic-14	42.29	990.00	CONCLUIDAS 2013-2017	11096270016	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
42	PUEBLO VIEJO - RAFAEL CAL Y MAYOR (LIM. DE EDOS. CHS Y OAX.).	feb-12	ene-19	315.00	22.50	PROCESO 2018-2027	10096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
43	ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC	ene-12	ene-19	287.33	46.00	PROCESO 2018-2027	05096270015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
44	MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA	ene-12	ene-19	162.10	30.00	PROCESO 2018-2027	07096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
45	VALDIVIA - PALMARCITO.	ene-12	ene-19	160.29	430.00	PROCESO 2018-2027	05096270006	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
46	PIJIJIAPAN AEROPUERTO. TRAMO: AEROPUERTO (MARIANO MATAMOROS) ZACULAPA.	ene-12	ene-19	118.08	23.00	PROCESO 2018-2027	09096270019	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
47	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CHAPAYAL	ene-12	ene-19	107.16	334.00	PROCESO 2018-2027	05096270002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
48	SESECAPA-LAS SALINAS	ene-12	ene-19	98.84	2,050.00	PROCESO 2018-2027	11096270023	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
49	MOTOZINTLA BELISARIO DOMINGUEZ VILLAHERMOSA - EJIDO BERRIOSABAL	ene-12	ene-19	95.42	20.00	PROCESO 2018-2027	11096270034	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
50	BELISARIO DOMINGUEZ - LAS CABAÑAS.	ene-12	ene-19	82.41	25.00	PROCESO 2018-2027	05096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
51	CAMINO: E.C. CIUDAD CUAUHTEMOC- CHIHUAHUA-ANGEL ALBINO CORZO.	ene-12	ene-19	75.54	18.00	PROCESO 2018-2027	08096270009	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
52	SAN ISIDRO – ISLA SAN JOSE	mar-12	ene-19	74.56	15.00	PROCESO 2018-2027	11096270057	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
53	E.C. (NUEVO MEXICO - SAN JUAN CARRIZAL)	ene-12	ene-19	73.71	17.20	PROCESO 2018-2027	11096270035	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
54	SANTA CATARINA - LOS NARANJOS	ene-12	ene-19	69.79	189.00	PROCESO 2018-2027	07096270012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
55	OXCHUC - PLAZA YOCHIB	ene-12	ene-19	61.76	2,255.00	PROCESO 2018-2027	07096270008	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
56	ACAPETAGUA-EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA	ene-12	ene-19	57.10	17.70	PROCESO 2018-2027	07096270015	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
57	EL PARAISO - EL NOPAL	ene-12	ene-19	55.75	170.00	PROCESO 2018-2027	05096270024	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
58	FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA	jun-14	ene-19	52.20	9.00	PROCESO 2018-2027	14096270011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
59	TRIUNFO DE MADERO - PUEBLO VIEJO	feb-12	ene-19	48.17	2,500.00	PROCESO 2018-2027	10096270022	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
60	CHAPINGO-EJIDO MORELOS	ene-12	ene-19	45.90	10.70	PROCESO 2018-2027	11096270053	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
61	CAMINO: FRONTERA HIDALGO-CANTON EL CARMEN	ene-12	ene-19	43.30	14.60	PROCESO 2018-2027	08096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
62	CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA-EJIDO FRANCISCO I. MADERO.	feb-09	ene-19	41.10	10.00	PROCESO 2018-2027	08096270001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
63	E.C. (COPAINALA TECPATAN) RIVERA CAMPECHE	jul-12	ene-19	40.91	883.00	PROCESO 2018-2027	11096270012	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
64	STA. ELOISA - EL ZAPOTE - E.C. (NVO.TEPEYAC - IXTAPILLA); INCLUYE RAMAL A CHITAMA.	jun-12	ene-19	38.11	1,066.00	PROCESO 2018-2027	11096270058	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
65	TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO.	mar-14	ene-19	34.34	1,250.00	PROCESO 2018-2027	11096270055	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
66	YABTECLUM - PUEBLA	ene-12	ene-19	31.72	1,200.00	PROCESO 2018-2027	11096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
67	VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA	mar-12	ene-19	31.30	6.97	PROCESO 2018-2027	12096270002	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
68	SINALOA NICOLAS BRAVO	ene-12	ene-19	30.10	6.00	PROCESO 2018-2027	11096270020	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
69	TEOPISCA NUEVO LEON	mar-13	ene-19	28.80	11.00	PROCESO 2018-2027	13096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
70	E.C. (HUITIUPAN EL BOSQUE) SAN FRANCISCO PORTUGAL EL JARDIN.	may-12	ene-19	24.87	87.00	PROCESO 2018-2027	12096270004	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
71	SIMOJOVEL - LA PIMIENTA	may-12	ene-19	24.66	88.00	PROCESO 2018-2027	12096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
72	SAN VICENTE - SANTUARIO DOS - SANTUARIO - EMBARCADERO.	jun-12	ene-19	15.45	20.46	PROCESO 2018-2027	11096270031	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
73	E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA)-EJ. DR. SAMUEL BRINDIS	oct-13	ene-19	8.18	2.05	PROCESO 2018-2027	13096270007	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
74	E.C. (TUXTLA-VILLAFLORES)-ROBLADA GRANDE	mar-14	ene-19	4.32	11.00	PROCESO 2018-2027	12096270014	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
75	TUMBALA - KHANIL	ene-12	dic-19	118.50	0.60	PROCESO 2018-2027	05096270003	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
76	JOSE MARIA MORELOS - LA RAYA LIM. EDOS. (CHS-TAB)	may-12	nov-20	17.09	2,486.00	PROCESO 2018-2027	12096270001	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
77	COJTMIL - JETJA - EL DIAMANTE CRUCERO PIÑAL	ene-12	dic-25	378.00	11.10	PROCESO 2018-2027	08096270011	---	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
78	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2018	may-18	dic-18	152.00	258.20	CONCLUIDAS 2018	17092100003	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
79	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	abr-15	dic-15	221.76	810.08	CONCLUIDAS 2013-2017	14092100002	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
80	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	mar-16	dic-16	351.49	823.82	CONCLUIDAS 2013-2017	15092100001	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
81	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2017	jul-17	nov-17	20.40	ÑALAMIEN	CONCLUIDAS 2013-2017	16092100004	---	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
82	CG-112, MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN CHIAPA DE CORZO Y EMIL. ZAPATA, PARRAL,	ago-13	dic-13	391.40	70.00	INAUGURADAS 2013-2017	12092100003	PN1246	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES
83	DRAGADO DE MANTENIMIENTO PUERTO MADERO	mar-13	abr-13	19.00	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3C0002	---	PUERTOS
84	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN PUERTO	jul-13	dic-13	63.21	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2017	1309J3C0001	---	PUERTOS
85	PROLONGACION DE LA ESCOLLERA ORIENTE	sep-13	dic-13	100.00	0.16	CONCLUIDAS 2013-2017	1109J3C0003	---	PUERTOS

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT
SUBDIRECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS CENTROS SCT



MES DE DIFUSIÓN: FEBRERO DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD CON CIERRE A: ENERO DE 2018

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Longitud (KM)	Situación actual	Registro de Cartera	PNI Publicado	Sector
86	RED CONTRAINCENDIOS PRIMERA ETAPA	ago-13	sep-14	3.77	CONTRAINCE	CONCLUIDAS 2013-2017	1009J3C0002	---	PUERTOS
87	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA PLAYA PONIENTE DE PUERTO CHIAPAS, PRIMERA Y SE	oct-13	dic-14	115.42	ROMPEOLAS	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
88	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN PUERTO CHIAPAS	nov-17	dic-17	126.30	DRAGADO	CONCLUIDAS 2013-2017	0	---	PUERTOS
89	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO-PORTUARIA EN LA REGIÓN PACÍFICO SUR (PROTECCIÓN LONGITUDINAL COSTERA)	may-18	nov-18	40.00	---	PROCESO 2018	0	---	PUERTOS
90	CENTRO LOGÍSTICO EN PUERTO CHIAPAS	ene-19	nov-19	41.20	CENTRO LOGIST	PROYECTADAS 2019-2024	0	---	PUERTOS
91	ADQUISICIÓN DE UNA ECONOBODEGA EN PUERTO CHIAPAS	ene-19	nov-19	4.04	ECONOBODEG	PROYECTADAS 2019-2024	0	---	PUERTOS
92	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAPACHULA	ene-14	dic-15	6.02	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2013-2017	N/A	---	AEROPUERTOS
93	AEROPUERTO PALENQUE	abr-11	feb-14	1,269.00	2.50	INAUGURADAS 2013-2017	0	PNI207	AEROPUERTOS
