



INFORME TRIMESTRAL

Julio - Septiembre



¿QUÉ ES EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

Es la dignificación de la infraestructura física educativa de México, en un esfuerzo sin precedentes, con una meta total de **atención y mejoramiento de 33 mil planteles** como este y de todos los niveles educativos, bajo el compromiso de garantizar como mínimo por año, la **rehabilitación de 11,000 planteles** escolares, del día 7 de diciembre de 2015 al 1ro de diciembre de 2018.




¿CÓMO ESTA DISTRIBUIDA LA META DE RECURSOS DEL PROGRAMA ?

Contará con una suficiencia de recursos derivado de colocaciones de certificados de infraestructura por:

\$50,000 mdp

3 años efectivos de ejecución

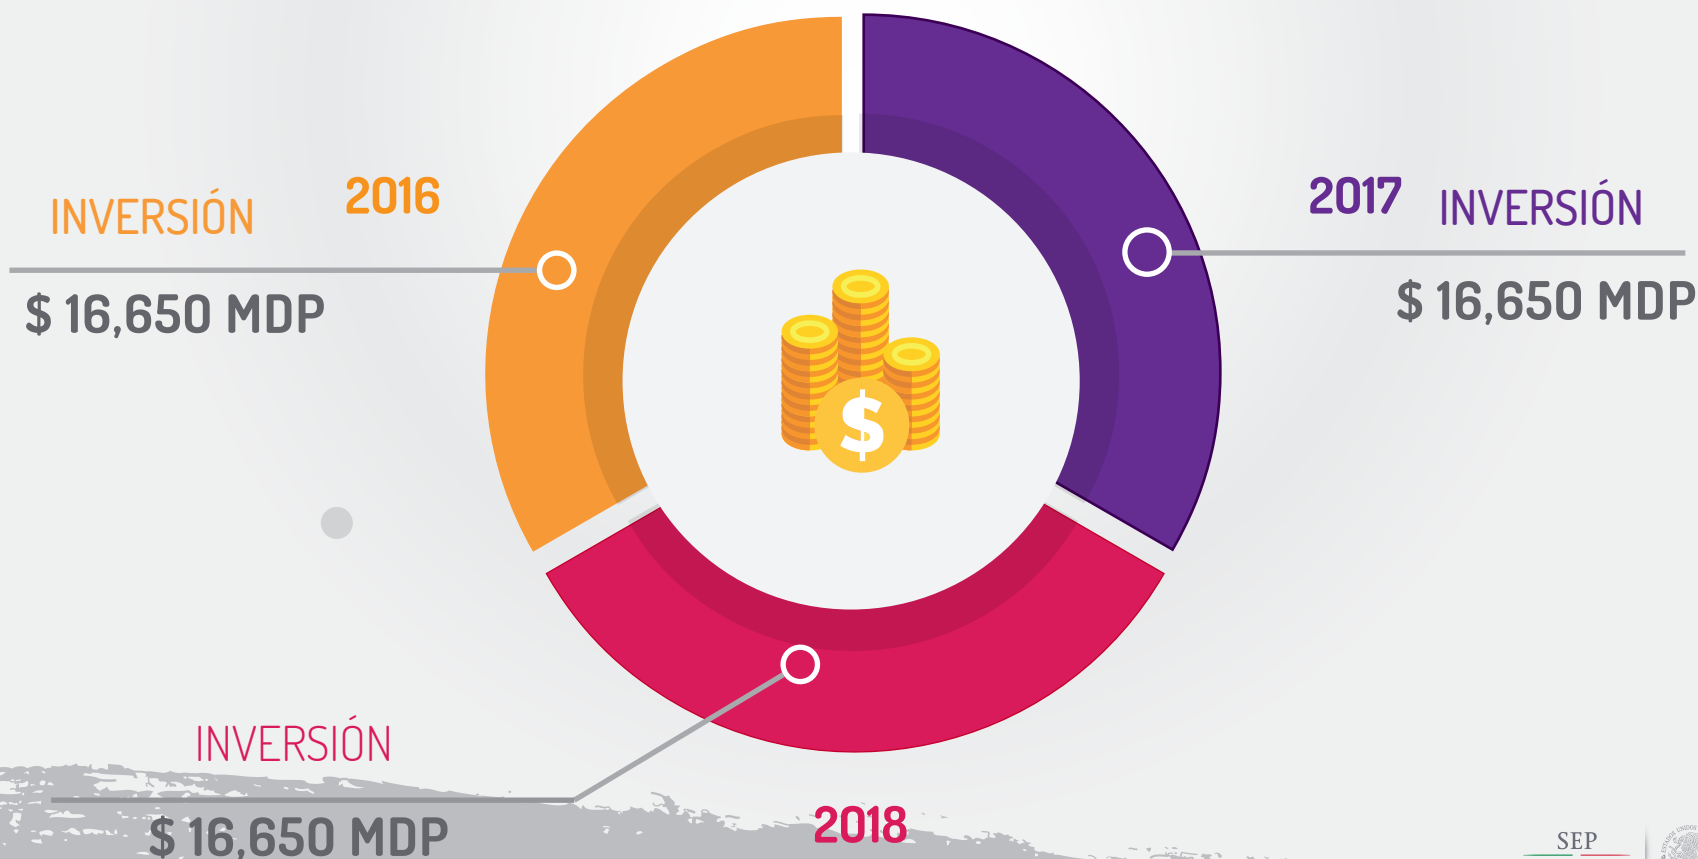

¿CÓMO ESTA DISTRIBUIDA LA META DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA ?

33,000

Planteles en
todo México



3 años efectivos de ejecución



Planteles a
intervenir **2017**


11,000

Planteles a
intervenir **2016**

11,000

Planteles a
intervenir **2018**

11,000



Planteles a intervenir

11,000

mínimo por año

¿CÓMO ESTA DISTRIBUIDA LA MATRÍCULA A BENEFICIAR EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS?


casi

6,000,000

de alumnos
a beneficiar



URBANA
4,238,093



INDÍGENA

705,646

RURAL


898,779

Total urbana
e indígena = **1,604,425**

¿QUÉ NECESIDADES SE ATENDERÁN PRINCIPALMENTE?

¿A dónde va dirigido?

A los planteles con mayores necesidades de atención en su Infraestructura Educativa.



i. Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral.



ii. Servicios Sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de muebles sanitarios.



iii. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano.



iv. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario para maestro.



v. Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas al menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.



vi. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo y administrativo.



vii. Infraestructura para la conectividad. Instalación de cableado interno para contar con internet y telefonía en aulas de medios y áreas de servicios administrativos.



viii. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

MÉXICO

(Estado Mexicano)

- Gobierno Federal
- Gobiernos Estatales- CONAGO
- Poder Legislativo Federal
- Organismos Autónomos
 - ✓ INAI- Convenio
 - ✓ INEE- Convenio
- Portal

<http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/>



PARTICIPACIÓN SOCIAL

Comunidad escolar

- Comités de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa
 - Padres de Familia
- Maestros
- Alumnos
- ONG'S - Transparencia
- UNESCO / OCDE/ BID
- ANUIES



ACTIVACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

- CMIC - Convenio
 - ✓ Mano de obra local
 - ✓ Empresas locales
 - ✓ Compromiso de calidad en la ejecución



¿EN QUÉ MOMENTO YA SE PUEDEN COMPROMETER LOS RECURSOS EN LOS PLANTELES BENEFICIADOS?

1ra Colocación 04-DIC-2015

\$ 8,466,831,311 mdp

2da Colocación 23-MAR-2016

\$ 4,753,897,078 mdp



\$ 13,220,728,389 mdp

Total de recursos derivados de las colocaciones en la BMV,
más **rendimientos financieros** por **300 mdp**

Necesitamos colocar al 1ro de diciembre
de este año un mínimo de:

\$ 3,130 mdp

Total :

\$ 16,650 mdp

¿CÓMO VAMOS AL 30 DE SEPTIEMBRE RESPECTO A LA META 2016?

A 10 meses de iniciado el programa se encuentran en proceso de intervención directa por los Estados aplicando la Ley de Obra Pública Federal

Meta a intervenir 2016

11,000
planteles

85%

respecto
a la meta

9,418

Planteles

Promedio por mes

900
planteles




Inversión total comprometida
de los 9,418 planteles.


\$13,506 MDP

EFICIENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

PLANTELES EDUCATIVOS EN INTERVENCIÓN* POR LOS ESTADOS



537%

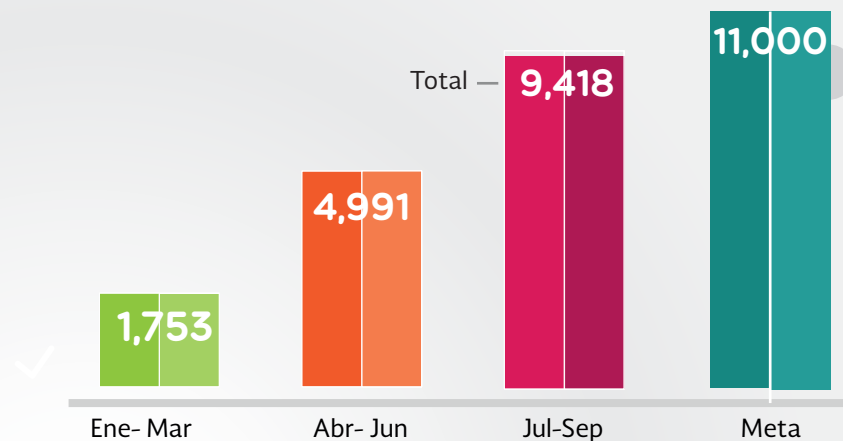


* Planteles en proceso de intervención significa, todas aquellas escuelas que cuentan con suficiencia de recursos aprobada por el INIFED, así como la aprobación del correspondiente proyecto ejecutivo y que se encuentra en alguna de las etapas del proceso de licitación – contratación

MONTO TRANSFERIDO (ANTICIPOS)



1,104%

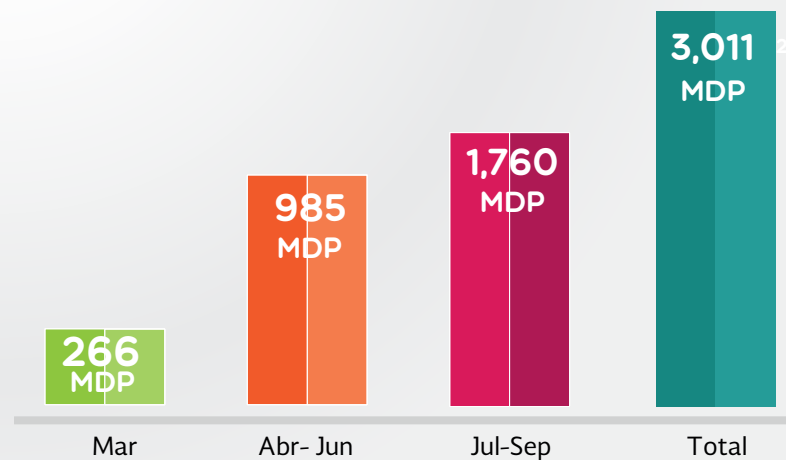

EFICIENCIAS DE EJECUCIÓN POR ESTADO 2015-2016 / NOROESTE



ESTADO	Total Planteles con suficiencia de recursos 2015 - 2016	Total de suficiencias liberadas 2015 - 2016	Planteles en intervención al 30 de septiembre	Inversión aprobada para los planteles en intervención	Calificación 30 junio	Calificación 30 septiembre*
SINALOA	307	\$ 470,823,569.00	307	\$ 470,823,569.00	<u>100</u>	<u>100</u>
SONORA	305	\$ 515,463,672.00	305	\$ 515,463,672.00	<u>100</u>	<u>100</u>
BAJA CALIFORNIA	229	\$ 264,886,881.00	226	\$ 262,186,881.00	58	99
BAJA CALIFORNIA SUR	161	\$ 204,679,936.00	158	\$ 197,779,396.00	84	96
CHIHUAHUA	368	\$ 502,412,528.00	322	\$ 448,412,528.00	82	89

EFICIENCIAS DE EJECUCIÓN POR ESTADO 2015-2016 / NORESTE



ESTADO	Total Planteles con suficiencia de recursos 2015 - 2016	Total de suficiencias liberadas 2015 - 2016	Planteles en intervención al 30 de septiembre	Inversión aprobada para los planteles en intervención	Calificación 30 junio	Calificación 30 septiembre
SAN LUIS POTOSÍ	348	\$ 477,479,022.52	344	\$ 436,679,093.64	100	91
DURANGO	130	\$ 214,628,683.00	128	\$ 212,578,683.00	88	98
NUEVO LEÓN	408	\$ 875,509,477.95	397	\$ 808,527,937.16	88	92
TAMAULIPAS	274	\$ 351,655,424.12	240	\$ 303,141,766.89	58	87
COAHUILA DE ZARAGOZA	209	\$ 313,614,999.61	176	\$ 274,914,999.61	40	87

EFICIENCIAS DE EJECUCIÓN POR ESTADO 2015-2016 / OCCIDENTE



ESTADO	Total Planteles con suficiencia de recursos 2015 - 2016	Total de suficiencias liberadas 2015 - 2016	Planteles en intervención al 30 de septiembre	Inversión aprobada para los planteles en intervención	Calificación 30 junio*	Calificación 30 septiembre
ZACATECAS	187	\$ 295,394,147.00	187	\$ 295,394,147.00	<u>100</u>	<u>100</u>
AGUASCALIENTES	154	\$ 210,138,459.00	150	\$ 202,760,037.00	<u>100</u>	96
NAYARIT	329	\$ 387,275,000.00	322	\$ 356,225,000.00	72	92
COLIMA	144	\$ 209,561,234.65	139	\$ 172,711,005.74	76	82
QUERÉTARO ARTEAGA	160	\$ 367,728,477.50	154	\$ 336,208,490.50	80	91
MICHOACÁN DE OCAMPO	716	\$ 693,410,951.44	646	\$ 628,571,166.98	56	90
GUANAJUATO	285	\$ 635,229,433.33	251	\$ 549,196,100.00	16	86
JALISCO	395	\$ 497,640,943.18	341	\$ 353,097,483.56	32	71

EFICIENCIAS DE EJECUCIÓN POR ESTADO 2015-2016 / CENTRO



ESTADO	Total Planteles con suficiencia de recursos 2015 - 2016	Total de suficiencias liberadas 2015 - 2016	Planteles en intervención al 30 de septiembre	Inversión aprobada para los planteles en intervención	Calificación 30 junio	Calificación 30 septiembre
HIDALGO	425	\$ 441,739,600.00	422	\$ 437,419,600.00	<u>100</u>	99
CIUDAD DE MÉXICO	160	\$ 490,851,975.00	156	\$ 376,901,975.00	92	89
MÉXICO	728	\$ 1,655,860,782.57	684	\$ 1,555,3781,284.72	93	94
MORELOS	149	\$ 352,021,001.00	138	\$ 295,397,113.00	78	83
TLAXCALA	80	\$ 187,219,277.50	70	\$ 155,437,259.50	55	83
PUEBLA	306	\$ 932,532,231.07	234	\$ 691,338,017.41	80	74

EFICIENCIAS DE EJECUCIÓN POR ESTADO 2015-2016 / SUR-SURESTE



ESTADO	Total Planteles con suficiencia de recursos 2015 - 2016	Total de suficiencias liberadas 2015 - 2016	Planteles en intervención al 30 de septiembre	Inversión aprobada para los planteles en intervención	Calificación 30 junio	Calificación 30 septiembre*
TABASCO	354	\$ 628,553,179.50	331	\$ 390,984,205.39	100	65
CHIAPAS	668	\$ 693,178,855.61	667	\$ 687,036,324.29	99	99
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	701	\$ 652,339,918.00	699	\$ 640,639,918.00	67	98
QUINTANA ROO	231	\$ 399,007,662.62	229	\$ 300,830,877.00	28	75
CAMPECHE	242	\$ 322,279,813.00	239	\$ 304,148,253.00	92	94
GUERRERO	456	\$ 580,110,782.00	386	\$ 477,035,782.00	58	82
YUCATÁN	151	\$ 240,745,500.76	107	\$ 171,908,825.00	58	75
OAXACA	696	\$ 541,171,358.13	263	\$ 197,329,718.00	12	36

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES



ZONA ECONOMICA ESPECIAL	ESTADOS Y MUNICIPIOS	INVERSIÓN 201-2018
PUERTO CHIAPAS (7 municipios)	• CHIAPAS	\$ 191.1 MDP
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS (2 municipios)	• MICHOACÁN. • GUERRERO.	\$114.1MDP
CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (20 municipios)	• VERACRUZ • OAXACA	\$204.2MDP
ZONA ECONOMICA ESPECIAL (Reactivación)		
•	• CAMPECHE.	\$790.9 MDP
•	• TABASCO	\$1,653.6 MDP
	TOTAL	\$2,953.9 MDP

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

APOYO EN LA INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANTELES



SECRETARÍA DE MARINA

APOYO EN LA INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICOS



ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Se publica en el portal especializado <http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien> el listado de los planteles educativos que serán beneficiados 2015 y 2016

Se publican además los Convenios, lineamientos y guía operativa



26/11/15

19/11/15



Se publica en el portal especializado <http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien> el listado de los planteles educativos que serán beneficiados 2017 y 2018



22/02/16

18/01/16



Firma del Convenio
INAI-SEP-INI-FED

Instalación del **Primer Comité de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa** en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Presentación del Portal de Transparencia del Programa Escuelas al CIE

- Busca tu escuela
 - Información por Plantel
 - Datos Generales del Plantel y Ubicación
 - Monto Asignado
 - Año Ejecución
 - Supervisor del INIFED
 - Matrícula Beneficiada
 - Diagnóstico del Plantel
- Sistema de Goereferencia
- Datos Abiertos
- Preguntas Frecuentes

