



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
AGUASCALIENTES**


COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

SCT AGUASCALIENTES 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



0 AUTOPISTAS



20 CARRETERAS



5 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO



0 PUERTOS




1 AEROPUERTOS

Programas




ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

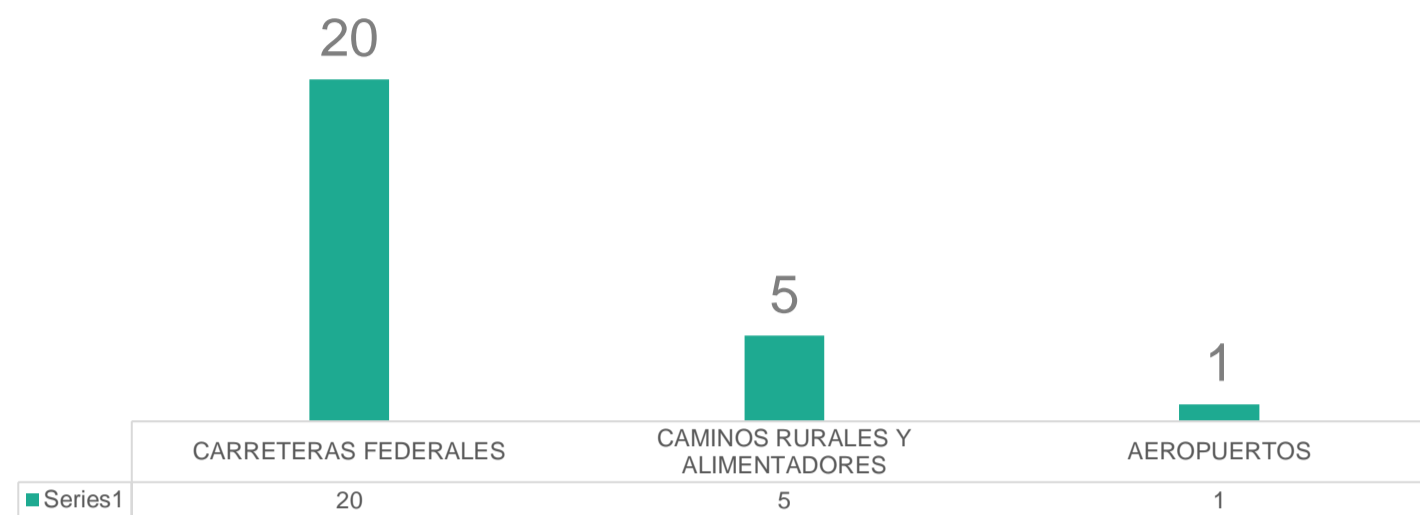

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

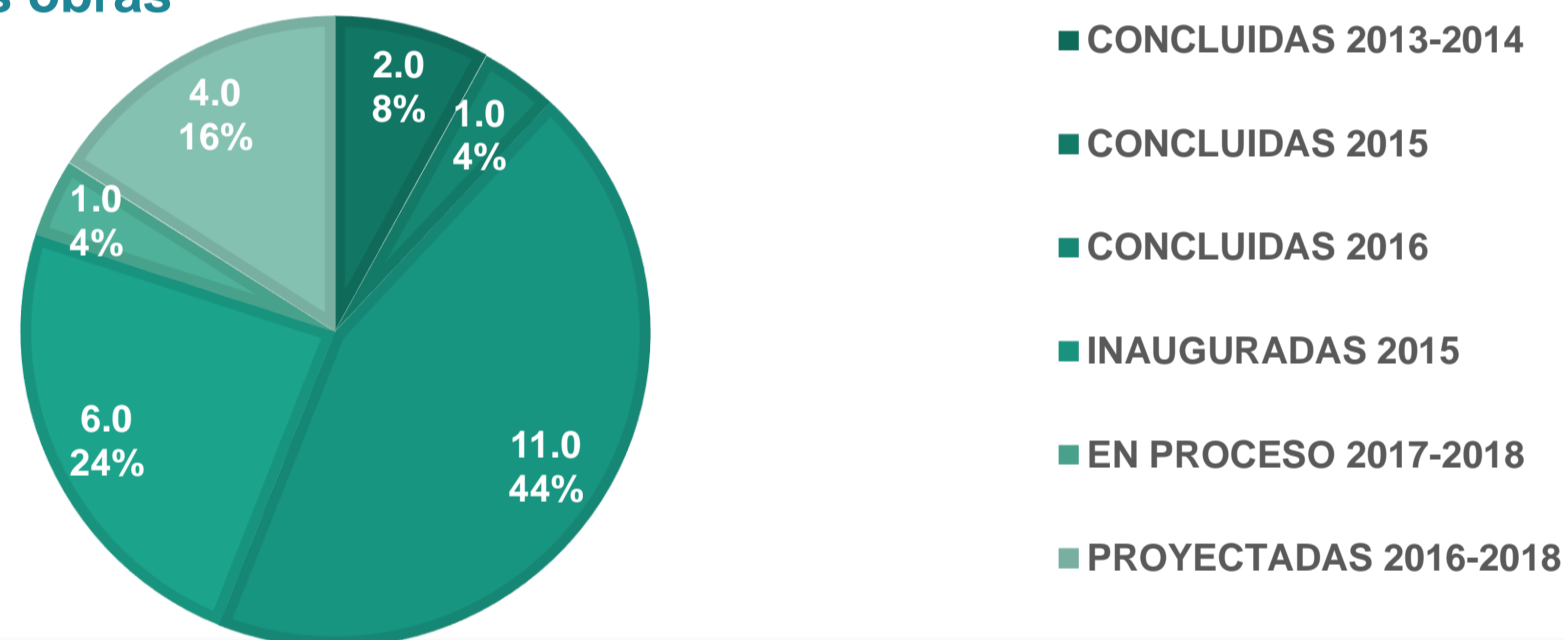

A la fecha, la SCT invierte **26** **Obras**, **2,805.6** **MDP** y **519.7** **Km**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
Etiquetas de fila				
CARRETERAS FEDERALES	20	2582.3	496.26	0
CONCLUIDAS 2013-2014	2	166.6	5.52	0
CONCLUIDAS 2016	9	1136.3	431.00	0
INAUGURADAS 2015	6	276	35.84	0
EN PROCESO 2017-2018	1	273.4	11.20	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	85	-	0
PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	1	645	12.70	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5	146.31	23.40	0
CONCLUIDAS 2015	1	20.47	4.00	0
CONCLUIDAS 2016	2	109.74	12.20	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	16.1	7.20	0
AEROPUERTOS	1	77	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	77	-	0
Total general	26	2,805.61	519.66	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
BENEFICIARIOS TOTALES	---	88,707.0	88,707.0
BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	69,631.0	69,631.0
TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL IN	---	88,121.0	88,121.0
MUNICIPIOS ENTREGADOS	---	11.0	11.0
MUNICIPIOS CONSIDERADOS IV ETAPA	---	11.0	11.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	25.20	20.33	21.40	66.93
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	11	11	11	11
JORNALES	313,955	229,746	211,339	755,040
BENEFICIARIOS	10,690	8,054	8,500	27,244
CAMINOS	---	---	170	68

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2018	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	585	133	718
INMUEBLES ESCOLARES	487	---	---
CENTROS DE SALUD	39	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	36	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	19	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3	---	---
ESPACIO PÚBLICO	1	---	---

Fecha de recepción: lunes, 9 de enero de 2017, mediante Oficio No.: 6.1.411.002/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Viernes, 6 de Enero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1-/ 001 /2017 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	REHABILITACION DE AV. AGS. DE AV. HEROES DE NACUZARI SUR A A. HEROES DE NACUZARI SUR	15/03/2011	29/07/2014	203.00	INAUGURADA 03-MAR-15	24.70	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096210003	0
2	VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS TR. PASO A DESNIVEL F.F.C.C. KM. 1+254	01/05/2013	01/12/2013	35.00	INAUGURADA 03-MAR-15	0.97	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096210005	0
3	SAN VICENTE - CHARCO AZUL.	10/02/2014	09/07/2014	11.38	INAUGURADA 03-MAR-15	3.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096210016	0
4	PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO- EL TARAY	01/07/2013	01/12/2014	9.80	INAUGURADA 03-MAR-15	0.60	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	9096210011	0
5	JILOTEPEC-SAN VICENTE, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON SECCION DE 7.0 METROS (SEC TIPO C)	01/05/2013	28/10/2014	8.99	INAUGURADA 03-MAR-15	3.37	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096210017	0
6	PUERTO DE LA CONCEPCION - TEPEZALA.	01/02/2014	01/07/2014	7.83	INAUGURADA EL 03 MARZO 2015	2.70	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	7096210005	0
7	TERCER ANILLO VIAL DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.	30/05/2013	11/11/2015	645.00	ESTA OBRA FUE PUESTA EN OPERACION POR EL C. SECRETARIO Y EL C. GOBERNADOR EL PASADO DÍA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	12.70	PUESTAS EN OPERACIÓN 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096210010	PE
8	AGUASCALIENTES - JALPA	16/05/2011	01/12/2013	156.80	FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO.	5.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096210006	PE
9	PUENTE CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA	31/07/2014	31/12/2014	9.80	N/A	0.32	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	1209621001	0
10	MODERNIZACIÓN CARRETERA LA TOMATINA - LOS ARQUITOS	11/07/2015	07/12/2015	20.47	OBRA A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES	4.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096210004	0
11	VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS.	01/07/2011	31/12/2016	583.30	PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO	358.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	11096210005	PE
12	NORIAS DE OJO CALIENTE LA LUZ. A SECC. A2 1ER ETAPA.	02/04/2012	30/12/2016	229.20	SE ENTREGO UNA PRIMERA ETAPA EL 3 DE MARZO DE 2015, POR EL C COORDINADOR GENERAL DE CENTROS SCT, PARA EL 2016 SE TIENEN TRES CONTRATOS, DOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% Y UNO SE ENCUENTRA AL 65%	6.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	13096210002	0
13	CONSERVACION RED ESTATAL	01/03/2016	29/07/2016	108.83	N/A	12.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	---	0
14	PASO A DESNIVEL SAN BARTOLO	25/07/2015	30/11/2016	79.92	N/A	1 PIV	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096210009	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
15	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	17/10/2016	16/12/2016	79.22	N/A	5.50	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
16	SAN ISIDRO - EL NOVILLO	01/03/2016	14/10/2016	55.76	OBRA CONCLUIDA EN LA QUE SE REALIZAN ALGUNOS TRABAJOS ADICIONALES	7.80	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	1509621001	0
17	EL NOVILLO - VILLA JUAREZ	01/03/2016	14/10/2016	48.08	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE ALGUNOS TRABAJOS ADICIONALES	11.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096210013	0
18	NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ	01/03/2016	29/12/2016	38.46	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	1309621002	0
19	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	01/03/2016	16/12/2016	19.63	N/A	36.70	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
20	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	15/02/2016	01/07/2016	2.73	N/A	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
21	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	01/03/2016	01/12/2016	0.91	N/A	PUENTES	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	---	0
22	LINEA VERDE EJE VIAL	15/05/2012	13/10/2017	273.40	OBRA INICIADA EN 2012, CONTO CON RECURSOS INERCIALES 2013, EN EL 2014 Y 2015 ESTA OBRA NO SE CONTINUÓ, EL PEF 2016 CONTEMPLA RECURSOS PARA CONSTRUIR EL PUENTE SOBRE EL ARROYO DON PASCUAL Y CONCLUIRLA	11.20	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096210004	0
23	ENTRONQUE EN AGUASCALIENTES – LEON.	15/05/2017	29/12/2017	85.00	ESTA OBRA NO CUENTA CON PROYECTO, NI REGISTRO	ENTRONQUE	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	---	PNI097
24	AMPLIAR EL AEROPUERTO DE AGUASCALIENTES	15/06/2017	01/12/2018	77.00	EL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, CONCESIONARIO DEL AEROPERTO DE AGUASCALIENTES, CONTEMPLA EN SU PLAN MAESTRO DE DESARROLLO LA AMPLIACION DE LAS SALAS DE ESPERA, NO SE TIENE FECHA DE INICIO DE OBRA	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS	---	PE
25	MILPILLAS DE ARRIBA - LOS MUÑOZ.	15/06/2017	29/12/2017	15.10	ESTA OBRA CUENTA CON REGISTRO PERO NO TIENE LOS ELEMENTOS PARA SU LICITACION, FALTA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA	3.80	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096210005	0
26	E.C. (TORTUGAS TUNEL DE POTRERILLOS) - POTRERILLOS.	15/06/2017	29/12/2017	1.00	LA OBRA CUENTA CON REGISTRO VIGENTE, PERO NO TIENE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU LICITACION, FALTA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA	3.40	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096210001	0
