



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
BAJA CALIFORNIA SUR**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

FEBRERO 2017


SCT BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017


Infraestructura de Comunicaciones y transportes

- 1 AUTOPISTAS
- 11 CARRETERAS
- 2 CAMINOS RURALES
- 0 FERROVIARIO
- 0 PUERTOS
- 3 AEROPUERTOS

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

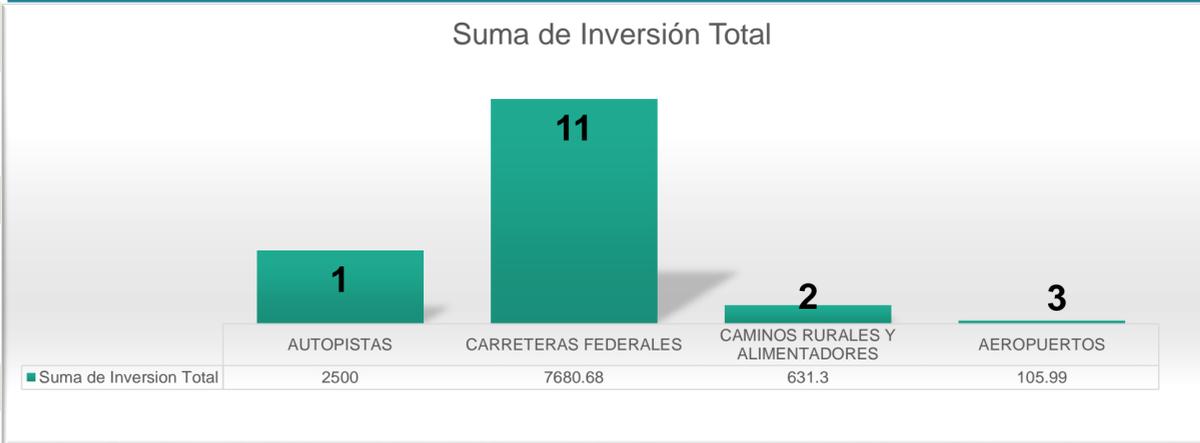

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

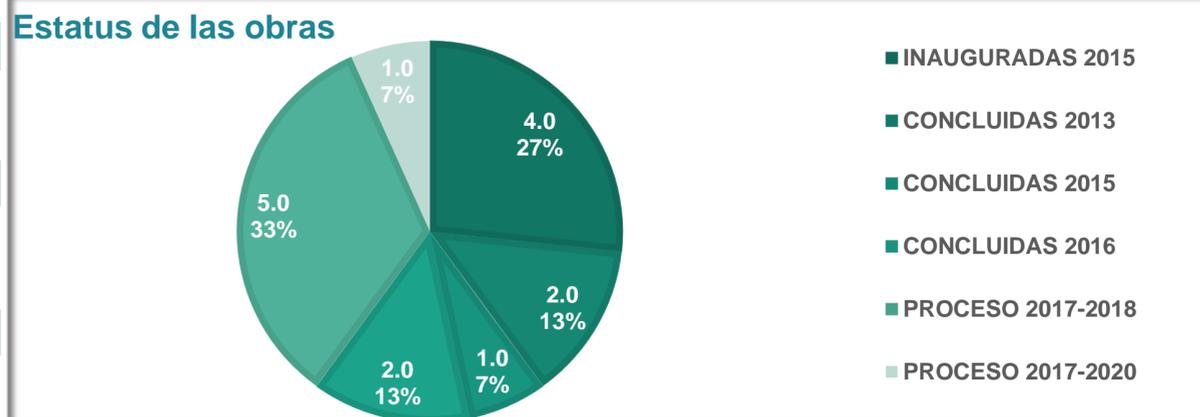

A la fecha, la SCT invierte **17** Obras, **11,063.1** MDP y **13,585.8** Km

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	1	2,500.00	40.00	0
INAUGURADAS 2015	1	2,500.00	40.00	0
CARRETERAS FEDERALES	11	7,680.68	13,223.71	0
INAUGURADAS 2015	3	478.70	147.04	0
CONCLUIDAS 2013	2	115.70	36.00	0
CONCLUIDAS 2015	1	177.99	1,376.50	0
CONCLUIDAS 2016	1	218.70	1,376.43	0
PROCESO 2017-2018	3	3,799.90	10,257.74	0
PROCESO 2017-2020	1	2,889.69	30.00	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	2	223.54	322.12	0
CONCLUIDAS 2016	1	108.03	155.72	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	115.51	166.40	0
AEROPUERTOS	3	658.88	-	0
PROCESO 2017-2018	2	430.30	-	0
PROYECTADAS 2017-2020	1	228.58	-	0
Total general	17	11,063.10	13,585.83	0

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	66,484.0	66,484.0
TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO	---	63,862.0	63,862.0
MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO	---	3.0	3.0
MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	3.0	3.0



MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	399	101	500
INMUEBLES ESCOLARES	308	---	---
CENTROS DE SALUD	23	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	44	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	21	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	---	---	---
ESPACIOS PÚBLICOS	3	---	---

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	29.93	27.31	29.3	86.54
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	4	5	5	5
JORNALES	340,523	277,399	289,235	907,157
BENEFICIARIOS	4,456	5,772	5,382	15,610
LONGITUD	813.34	158.00	---	971.34
CAMINOS	---	---	204	---

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: 6.6.303.063/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/073/2017 enviado por la DGAPDCST.

Programas



LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	LIBRAMIENTO SAN JOSE DEL CABO-CABO SAN LUCAS	01/12/2011	31/08/2015	2,500.00	OBRA A INAUGURAR EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE MODIFICA LA INVERSION A 2,500.00 INCLUYENDO EL PAGO DE DERECHO DE VIA.	40.00	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS	07096230004	PNI511
2	LIBRAMIENTO TODOS SANTOS	01/11/2011	01/10/2013	342.00	INAUGURADA 06-FEB-15	8.24	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	07096230004	PNI224
3	STA. RITA-PUERTO CHALE TRAMO: (KM. 13+000 AL KM 23+000)	02/02/2012	01/12/2013	70.70	INAUGURADA 06-FEB-15	23.00	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	1109630004	---
4	PUENTE CADUAÑO CARRETERA TRANSPENINSULAR LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CABO SAN LUCAS	01/10/2014	01/12/2014	66.00	INAUGURADA 06-FEB-15, LOS RECURSOS PROVIENEN FONDO DE DESASTRES NATURALES, ACUERDO SE.172.03 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014.	115.80	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES		---
5	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (23 OBRAS)	01/01/2015	30/11/2015	177.99	NOTA: DERIVADO DE LA REDUCCION DE RECURSOS POR PARTE DE LA SHCP, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA RGCC TIENE UN ADEUDO DE OBRA EJECUTADA Y AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$ 6'837,851.11	1,376.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110003	---
6	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS (27 OBRAS)	01/02/2016	30/11/2016	218.70	AVANCE FINANCIERO DEL 99.8%. SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS	1,376.43	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
7	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	15/03/2016	16/10/2016	108.03	SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100.00%, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA -RECEPCION DE LAS OBRAS	155.72	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
8	RAMAL A LA CONQUISTA AGRARIA TRAMO: (KM.13+000 AL KM. 26+000)	02/02/2012	01/12/2013	83.80	OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA SU AFECTACION	26.00	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096230005	---
9	E.C. (SANTA ANITA- CADUAÑO) LAS CASITAS DEL KM 0+000 AL 10+000	01/02/2012	01/09/2013	31.90	OBRA DAÑADA POR EL HURACAN ODILE, NO SE RADICARON RECURSOS PARA SU AFECTACION.	10.00	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	12096230001	---
10	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PURISIMA-SAN IGNACIO	01/03/2014	31/12/2018	2,600.00	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 NO SE CUENTA CON RECURSOS	35.74	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096230002	---
11	PUERTO ESCONDIDO - LORETO	01/01/2013	31/12/2018	680.00	NO SE CUENTA CON RECURSO ASIGNADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2017	22.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096230005	PE
12	PUNTA EUGENIA-E.C. VIZCAINO-BAHIA TORTUGAS TRAMO: (KM. 8+000 AL KM. 173+000)	01/02/2006	31/12/2018	519.90	FALTA POR PAVIMENTAR 18.5 KMS., SE CUENTA CON ESTUDIOS Y PROYECTOS., EN LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 NO SE CONTO CON RECURSOS	10,200.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	06096230003	---
13	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO	01/01/2015	07/12/2018	404.80	INFORMACION MODIFICADA DE ACUERDO A INFORMACION ENVIADA	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI002
14	MODERNIZACION AEROPUERTO DE LA PAZ	01/01/2015	01/01/2018	25.50	MODIFICADO DE ACUERDO A INFORMACION ENVIADA	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PE
15	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CIUDAD INSURGENTES	01/03/2014	31/12/2020	2,889.69	PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE TIENE AUTORIZADO 100 MDP	30.00	PROCESO 2017-2020	CARRETERAS FEDERALES	12096230004	---
16	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2017	15/02/2017	30/09/2017	115.51	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIONES	166.40	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16092100004	#N/A
17	CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSE DEL CABO.	03/07/2017	06/12/2020	228.58	SE TIENE SOLICITUD DE REGISTRO EN CARTERA NUM. 46457, ANTE LA SHCP PARA SU AUTORIZACION O EN SU CASO DE OBSERVACIONES PARA SER ATENDIDAS.	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2017-2020	AEROPUERTOS		PE
