




SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
OAXACA**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

FEBRERO 2017


SCT OAXACA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes




ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

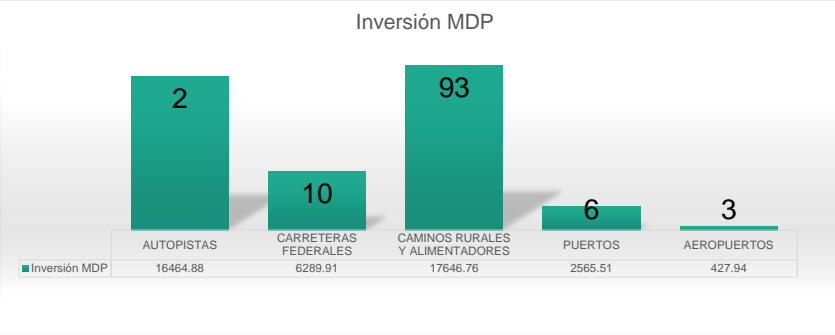

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

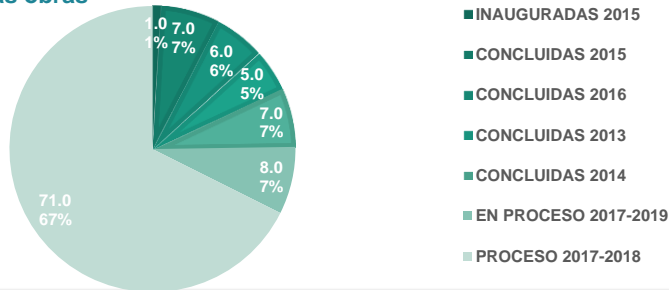

Obras 114 **MDP** 43,395.0 **Km** 7,887.5

A la fecha, la SCT invierte

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	2	16,464.88	1,211.20	2
PROCESO 2017-2018	2	16,464.88	1,211.20	2
CARRETERAS FEDERALES	10	6,289.91	3,637.02	2
INAUGURADAS 2015	1	417.80	15.50	0
CONCLUIDAS 2015	1	37.48	-	0
CONCLUIDAS 2016	2	1,013.23	3,143.09	1
CONCLUIDAS 2014	1	9.00	0.03	0
PROCESO 2017-2018	4	4,592.40	472.20	1
PROYECTADAS 2017-2018	1	220.00	6.20	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	93	17,646.76	3,039.00	0
CONCLUIDAS 2015	4	170.05	25.30	0
CONCLUIDAS 2016	4	242.76	198.76	0
CONCLUIDAS 2013	5	163.03	38.10	0
CONCLUIDAS 2014	6	282.48	69.25	0
EN PROCESO 2017-2019	8	1,834.20	290.74	0
PROCESO 2017-2018	63	14,612.16	2,163.85	0
PROCESO 2017-2020	1	199.14	230.00	0
PROYECTADAS 2017-2018	2	142.94	23.00	0
PUERTOS	6	2,565.51	0.30	0
PROCESO 2017-2018	1	343.71	0.30	0
PROYECTADAS 2017-2018	4	2,111.80	-	0
PROYECTADAS 2017-2019	1	110.00	-	0
AEROPUERTOS	3	427.94	-	1
CONCLUIDAS 2015	2	66.80	-	0
PROCESO 2017-2018	1	361.14	-	1
Total general	114	43,395.00	7,887.52	5

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	524,260.0	524,260.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	492,532.0	492,532.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	190,877.0	190,877.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS	---	287.0	287.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO	---	171.0	171.0

AVANCE EN PROGRAMAS



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	98.02	98.20	103.90	300.12
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	241	241	570	570
JORNALES	1,139,257	1,075,938	1,025,026	3,240,221
BENEFICIARIOS	23,455	22,521	23,295	69,271
LONGITUD	2,449.33	159.00	---	2,608.33
CAMINOS	---	---	---	---

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2018	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	4,249	-64	4,185
INMUEBLES ESCOLARES	2,868	---	---
CENTROS DE SALUD	746	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	584	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	45	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3	---	---
ESPACIOS PÚBLICOS	3	---	---

Fecha de recepción: Jueves, 09 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: 6.19.0032/2017 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/089/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	HUATULCO - ENTRONQUE AEROPUERTO	10/05/2011	31/12/2014	417.80	INAUGURADA 30-ENE-15	15.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	008096400015	PE
2	E.C. KM. 57.5 (TEHUACAN-HUAJUAPAN)-SANTIAGO CHAZUMBA-SAN SEBASTIAN FRONTERA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 INCLUYE PUENTE	15/01/2012	31/12/2015	76.59	SE CONCLUYE LA META HASTA SAN SEBASTIAN FRONTERA, QUEDAN PENDIENTES 2 KM DEL LADO DE PUEBLA POR LO QUE EL ESTADO DE OAXACA DA POR CONCLUIDO ESTE TRAMO.	6.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400017	---
3	(MITLA-TEQUISISTLAN-ENT. TEHUANTEPEC II) - RAMAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000,	01/06/2012	28/02/2015	53.55	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 13.0 MDP PARA SUBTRAMO A MODERNIZAR EN TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 3+150 AL KM. 4+800; TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DEL KM. 1+	12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400007	---
4	AMPLIACION Y MODERNIZACION AEROPUERTO DE HUATULCO	01/01/2014	31/12/2015	47.50	A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V. Y SUPERVISADA POR COMINDE S.A. DE C.V.	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
5	PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA ARENA CON UNA LONGITUD DE 150.0 METROS UBICADO EN EL KM. 21+000 DEL CAMINO: PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN	22/04/2012	15/11/2015	37.48	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.3 MDP PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE COLLANTES Y CHICOMETEPEC	PUENTE	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096400018	---
6	KM. 90+600 E.C. (MITLA-TEHUANTEPEC II) SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	01/06/2014	28/02/2015	29.93	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 5.0 MDP PARA PAGO DE ADEUDOS	5.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400004	---
7	MODERNIZACION AEROPUERTO DE OAXACA	01/01/2013	31/12/2015	19.30	OBRA A CARGO DE ASUR Y LA DGAC	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
8	SANTO DOMINGO YANHUITLAN CBTA 51 SAN PEDRO AÑAÑE TEPOSOLULA.	01/10/2009	15/12/2015	9.98	EN 2016 SE APROBARON 7.5MDP PARA MODERNIZACIÓN DEL KM 3+310 AL 5+000 Y SE TRANSFIRIO EL RECURSO POR QUE EL CAMINO YA ESTABA CONCLUIDO.	2.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096400033	---
9	CG-209 REHABILITAR LA CARRETERA OAXACA - IXTLAN - VALLE NACIONAL - TUXTEPEC.	01/10/2013	31/03/2016	579.10	EN 2015 SE INVIRTIERON 202.0 MDP PARA CONCLUIR LA REHABILITACION TOTAL DE LA CARRETERA FEDERAL, EL RECORTE PRESUPUESTAL NO PERMITIO CONQUIR LO PROGRAMADO Y SE CONCLUYE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2016	212.70	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	PNI279
10	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016	01/02/2016	15/12/2016	434.13	N/A	2,930.39	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	---
11	TECOMAXTLAHUACA - COICCOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	01/04/2009	05/10/2016	144.28	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 41.6 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 34+600 AL KM. 36+600	43.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400002	---
12	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2016	15/02/2016	15/12/2016	50.00	N/A	143.20	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
13	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN PEDRO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+560	01/06/2014	31/10/2016	32.00	EN EL 2016 SE APROBARON 18.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A TRABAJAR DEL KM. 2+500 AL KM. 7+600.	7.56	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400011	---
14	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SANTA CATARINA COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200	15/06/2014	15/12/2016	16.48	EN EL 2016 SE APROBARON 9.50 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+200. EN 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	5.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400008	---
15	LACHIXOVA-HONDURA LUCERO	01/03/2013	20/12/2013	52.50	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	26.80	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400012	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
16	E.C. F. (STA.MA. NATIVITAS ASUNCION NOCHIXTLAN)-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	20/10/2011	01/11/2013	43.90	OBRA CONCLUIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL PEF 2013 A UN CONVENIO DE REASIGNACION.	9.1 kms Y 1 PUENTE (0.03)	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400026	---
17	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIO- NUEVO PROGRESO Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	07/07/2009	31/12/2013	40.84	EL PUENTE FUE CONSTRUIDO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS PROPIOS Y LA MODERNIZACION DEL CAMINO FUE CONCLUIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES A CARGO DE LA SCT AL GOBIERNO ESTATAL	11 kms Y 1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400010	---
18	CAMINO: KM. 263.1 E.C. TEHUANTEPEC - JUCHITAN - ALVARO OBREGON.	01/04/2012	31/10/2013	14.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	9.30	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096400002	---
19	E.C. (SANTA MA. NATIVITAS-ASUNCION NOCHIXTLAN)-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	06/06/2012	30/11/2013	11.79	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL PEF 2013 A UN CONVENIO DE REASIGNACION.	2.00	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400022	---
20	SANTA CATARINA JUQUILA SAN MARCOS ZACATEPEC RIO GRANDE	01/04/2008	01/07/2014	192.48	LA LONGITUD TOTAL DE LA CARRETERA MODERNIZADA PERO FUE DAÑADA POR FENOMENOS METEOROLOGICOS POR LO QUE EN 2015 SE INVIERTEN 6.48 MDP PARA LEVAR A CABO TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN TRAMOS PARCIALES DEL	48.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096400018	---
21	ALVARO OBREGON - SAN PEDRO HUILOTEPEC	01/04/2013	31/12/2014	23.10	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	5.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400012	---
22	GUIGOVELAGA - SANTA ISABEL DE LA REFORMA	06/06/2012	01/07/2014	21.40	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	5.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400020	---
23	E.C.(LA CHIVIXA - TRES CRUCES) - GUICHIXU	01/02/2012	31/07/2014	18.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN AFECTADA CONSTANTEMENTE POR FENOMENOS METEOROLOGICOS CARACTERISTICOS EN LA ZONA	4.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400013	---
24	E.C. 200 - EL FAISAN - LA CAÑADA	06/06/2012	27/07/2014	18.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	4.25	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400010	---
25	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCOTRAMO LA Y BARRANCA LARGA-VENTANILLA YPUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMALPIEDRA CAMPANA DEL KM. 0+000 ALKM5+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 3+000	01/02/2014	31/12/2014	9.50	EN 2016 SE APROBARON 21.00 MDP EL RECURSO APROBADO FUE TRANSFERIDO.	2.50	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400008	---
26	PUENTE COLLANTES UBICADO EN EL KM. 16+981 DEL CAMINO PINOTEPAN NACIONAL- COLLANTES.	01/09/2013	30/06/2014	9.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE FONDEN	0.03	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096400005	---
27	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68	EN 2016 SE APROBARON 6.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 17+000 AL KM 18+200. EN 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	64.00	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096400004	---
28	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68	N/A	64.00	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096400004	---
29	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68	N/A	64.00	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096400004	---
30	E.C. (TLAXIACO-PUTLA)-AGUA ZARCA-SAN JUAN MIXTEPEC.	01/04/2016	31/12/2019	121.20	EN 2016 SE APROBARON 8.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 0+200 AL KM 1+700 EN EL 2017 SE AUTORIZARON 5.00 MDP EN EL PEF.	23.50	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400004	---
31	Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).	04/03/2016	31/12/2019	108.16	EN 2016 SE APROBARON 15.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 2+000 AL KM 5+500. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	18.08	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400003	---
32	KM 161 E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLÁN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA	01/07/2013	31/12/2019	105.40	EL RECURSO 2016 AUTORIZADO NO SE PUEDE EJERCER DEBIDO A QUE SU REGISTRO ANTE LA SHCP ESTA VENCIDO	21.08	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400021	---
33	KM 161 E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLÁN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA	01/07/2013	31/12/2019	105.40	EL RECURSO 2016 AUTORIZADO NO SE PUEDE EJERCER DEBIDO A QUE SU REGISTRO ANTE LA SHCP ESTA VENCIDO	21.08	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400021	---
34	SAN PEDRO MIXTEPEC- BAJOS DE CHILA	01/06/2012	31/12/2019	75.00	EN EL 2016 SE APROBARON 5.0 MDP. PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+100 AL KM 5+900. EN EL 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	15.00	EN PROCESO 2017-2019	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400017	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
35	CG-211 CONCLUIR LA CARRETERA OAXACA - ISTMO	01/07/2012	01/04/2018	11,819.00	PUESTA EN OPERACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE 28.0 KMS, POR EL C. SECRETARIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUNDO TRAMO PUESTO EN OPERACIÓN 4-03-16 POR EL C.SECRETARIO	169.20	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	04096400001	PNI649
36	CG-213 CONCLUIR LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO	01/08/2012	31/12/2017	4,645.88	OBRA CONCESIONADA INVERSION PEF 7.2% FONADIN 21.52% PRIVADA 71.28%	1,042.00	PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	08096400015	PNI593
37	ACAYUCAN-LA VENTOSA	01/08/2007	30/12/2018	2,048.50	PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE ESTA CARRETERA FEDERAL EN 2017 SE APROBARON 400.0 MDP	100.10	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	05096400027	PNI489
38	PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA	01/06/2008	31/12/2018	1,479.90	N/A	70.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096400015	PNI439
39	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - SANTOS REYES TEPEJILLO - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN MARTIN ITUNYOSO E.C. KM 102+00 E.C.(YUCUDAA - PINOTEPANAL.)	01/04/2006	15/12/2018	1,161.70	EN 2016 SE APROBARON 8.0 MDP. PARA LA MODERNIZACION DEL KM 23+200 AL KM 23+600. EN 2017 SE APROBON 5.0 MDP EN EL PEF.	107.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400019	---
40	MIHUATLAN - SAN PABLO COATLAN - SAN JERONIMO COATLAN - PIEDRA LARGA - LA PALMA	01/03/2008	15/12/2018	887.20	EN 2016SE APROBARON 14.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM. 35+300 AL KM.36+000. EN 2017 NO SE APROBARON RECUERSOS EN EL PEF.	105.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400014	---
41	CG-212 MODERNIZAR LA CARRETERA NOCHIXTLAN - YUCUDA - TLAXIACO - PUTLA - PINOTEPANACIONAL	01/06/2014	30/12/2017	824.00	N/A	294.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13092110003	PNI385
42	NOCHIXTLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 90+000	15/04/2006	16/12/2018	625.13	EN 2016 SE APROBARON 8.0 MDP SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 37+000 AL KM.37+200 EN EL PRESENTE 2017 NO SE AUTORIZO RECURSO.	90.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400032	---
43	KM 89+000 E.C. (MITLA - ZACATEPEC) - SANTA MARIA YACOCHI - TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - LIM. EDOS. OAX/VER.	01/03/2008	15/12/2018	581.10	EN 2016 SE APROBARON 23.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 56+500 AL KM 60+200. EN 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	142.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400012	---
44	SANTA MARIA SOLA - TLACOTEPEC - TEOJOMULCO - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	01/03/2006	31/12/2018	564.87	EN EL 2016 SE APROBARON 45 MDP CON LO CUAL SE MODERNIZO DEL 83+000 AL 84+000 Y DEL 94+500 AL 97+100. EN EL 2017 SE APROBARON 35.0 MDP EN EL PEF.	112.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400010	---
45	OJITE CUAUHTEMOC-SANTA CRUZ ITUNDUJIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 64+00	01/02/2006	15/12/2018	535.26	EN 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA LA MODERNIZACION DEL KM 46+500 AL KM 46+800. EL EL PRESENTE 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	64.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	6096400002	---
46	BOCA DEL PERRRO- SAN JUAN TEITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000	01/04/2006	15/12/2018	530.04	EN 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA MODERNIZACIÓN DEL KM 39+750 AL KM 41+000. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBO RECURSO.	65.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400030	---
47	LA VENTA - OZOLOTEPEC	13/10/2014	15/12/2018	480.00	EN 2016 SE APROBARON 41.80 MDP PARA LA MODERNIZACION DEL KM 39+800 AL KM 40+470. DEL KM 47+660 AL KM 48+300 Y DEL KM 48+300 AL KM 50+300. EN 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	90.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400005	---
48	SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTIAGO IXTAYUTLA,TRAMO: SAN JOSE DE LAS FLORES - SAN JOSE DE LAS FLORES IXTAYUTLA (KM. 10+000 AL KM.39+000).	15/04/2009	15/12/2017	430.04	EN EL 2016 SE APROBARON 7.0 MDP. QUE FUERON UTILIZADOS PARA PAGO DE ADEUDOS. EN EL 2017 NO SE APROBARON RECUERSOS EN EL PEF.	33.88	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400031	---
49	SAN JUAN MIXTEPEC - TEJOCOTES - JUXTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000	15/03/2008	15/12/2018	403.24	EN 2016 NO SE APROBO RECURSO EN EL PEF. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 5.00 MDP EN EL PEF.	38.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400009	---
50	E.C. KM. 126+645 (MITLA-ENTR. TEHUANTEPEC II) - SAN JUAN JUQUILA MIXES, DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000	15/06/2014	15/12/2018	375.59	EN 2016 SE APROBARON 16.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+900 AL KM.20+300. EN EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 15.00 MDP.	31.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400003	---
51	MIHUATLÁN - SAN CARLOS YAUTEPEC	01/03/2008	15/12/2018	375.46	EN 2016 SE APROBARON 8.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 67+200 AL KM 65+700. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 12.00 MDP EN EL PEF.	104.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400011	---
52	CG-210 AEROPUERTO EN LA REGION DEL ISTMO	11/11/2014	08/12/2017	361.14	SE TIENE PROGRAMADA LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SEDENA-SCT-ASA EN EL PRESENTE EJERCICIO; MIENTRAS QUE SU PUESTA EN OPERACIÓN SE TIENEN PROGRAMADA PARA 2017 (DGAC)	AEROPUERTO	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	1409JZL0021	PNI175

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
53	CONSTRUCCION DE UN MUELLE DE USOS MULTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA	01/09/2013	31/12/2017	343.71	PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FALTANTES POR 154 MDP DE LO CONTRARIO SE CONCLUIRÁ EN EL 2017	0.30	PROCESO 2017-2018	PUERTOS	01109J3G005	PNI196
54	SANTA MARIA GUIENAGATI - PEÑA BLANCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000	01/02/2012	15/12/2018	331.68	EN EL 2016 SE APROBARON 16 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+700 AL KM. 7+800. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 2.6 MDP.	26.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400014	---
55	E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN BARTOLO YAUTEPEC-QUIEGOLANI DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000	01/03/2012	15/12/2018	319.61	EN 2016 SE APROBARON 11.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 9+800 AL KM. 12+800. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	37.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400019	---
56	SAN PEDRO TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, DEL KM. 0+000 AL 23+500	15/05/2010	15/12/2018	291.66	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000	23.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400007	---
57	E.C. (IXTLAN DE JUAREZ - EL CEREZAL) - SAN MIGUEL DEL RIO	15/07/2012	15/12/2018	276.90	EN 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.3+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+200 AL KM. 5+600 EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 7.00 MDP EN EL PEF.	22.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400010	---
58	SAN FELIPE IXTAPA-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	15/07/2011	15/12/2018	275.67	EN 2016 SE APROBARON 5.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+500 AL KM. 9+500. EN EL 2017 NO SE APROBO RECURSO.	25.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400006	---
59	SANTIAGO TILANTONGO - SAN MIGUEL TECOMATLAN	15/09/2009	15/12/2018	245.08	EN 2016 NO FUE CONSIDERADA DENTRO DEL PEF. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 11.00 MDP EN EL PEF.	22.38	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400018	---
60	E.C. 30+400 (MIAHUATLAN-SAN JOSE LACHIGUIRI) - SAN ANDRES MIXTEPEC - SANTA CATARINA QUIOQUITANI DEL KM. 0+000 AL KM. 22+400	01/04/2006	31/12/2018	242.86	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 20+400 AL KM. 21+700	0.02	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400004	---
61	LIBRAMIENTO PALOMARES	02/02/2016	31/12/2018	240.00	AL SER UNA OBRA PROYECTADA NO SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA YA QUE SE ENCUENTRA EN TERRENOS VIRGENES EN 2016 SE INICIA CON EL ENT PALOMARES I	7.60	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	05096400027	---
62	E.C. (HUAJUAPAN-TEHUACAN)-SANTA CATARINA ZAPOQUILA MEMBRILLOS DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000	15/06/2012	15/12/2018	237.54	EN 2016 SE APROBARON 5 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM.6+400 AL KM. 7+300. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBO RECURSO.	22.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400040	---
63	E.C. (EL AMATE-COSOLAPA)-LA MARGARITA-LA TABAQUERA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000	01/06/2010	15/12/2018	228.02	EN EL 2016 SE APROBARON 14.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+800 AL KM. 3+300. EL EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 20.00 MDP EN EL PEF.	28.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400004	---
64	SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000	15/03/2012	15/12/2018	227.87	EN EL 2016 SE APROBARON 6.00 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 5+100 AL KM 6+100. EN 2017 SE AUTORIZARON 7.00 MDP EN EL PEF.	21.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400005	---
65	SANTIAGO NARANJAS - LAZARO CARDENAS - SANTA MARIA YUCUNICOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	15/04/2010	15/12/2018	224.06	EN 2016 NO FUE CONSIDERADA EN EL PEF. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 5.00 MDP EN EL PEF.	25.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400024	---
66	E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO)-EL CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA	15/03/2009	15/12/2018	212.56	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL 29.42304, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+400 AL KM. 15+000	21.10	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400004	---
67	SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO:SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTA ELENA COMALTEPEC - SAN JOSE DE LAS FLORES (KM. 0+000 AL KM.22+000).	15/04/2009	15/12/2018	207.33	EN EL 2016 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 18+450 AL KM 19+450. EN 2017 SE APROBARON 1.5 MDP EN EL PEF.	22.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	90964000030	---
68	ASUNCION ATOYAQUILLO - PUTLA VILLA DE GUERRERO	01/04/2010	15/12/2018	201.73	N/A	42.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400016	---
69	E.C. KM. 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000	01/03/2006	15/12/2018	191.91	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+900 AL KM. 15+500	44.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400012	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
70	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - CONCEPCION PAPALO - SAN FRANCISCO CHAPULAPA - SAN ANDRES TEOTILALPAM TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 83+260	01/06/2009	15/12/2018	189.58	EN EL 2016 SE APROBARON 5.6 MDP CON LO QUE SE EJECUTO DEL KM 24+800 AL 25+800. EN EL 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	83.26	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096400034	---
71	E.C. (TLAXIACO - SAN JUAN MIXTEPEC) - TRES CRUCES - SAN PEDRO YOSOÑAMA - SAN JUAN DIQUIYU	01/07/2010	31/12/2018	185.00	EN 2016 SE APROBARON 11.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 11+840 AL KM 13+840. EN EL PRESENTE 2017 NO SE AUTORIZO RECURSO.	37.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400016	---
72	SAN FELIPE TINDACO - SAN MATEO SINDIHUI	15/05/2010	15/12/2018	178.15	EN 2016 SE APROBARON 6.0 MDP EL CUAL FUE UTILIZADO PARA PAGO DE ADEUDOS. EN 2017 NO SE APROBO RECURSO.	34.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400008	---
73	JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	15/03/2009	15/12/2018	172.87	EN EL 2016 SE APROBARON 6.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 8+800. EN EL 2017 NO SE APROBARON RECURSOS EN EL PEF.	43.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400012	---
74	E.C. 100+500 (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RIO	01/07/2009	15/12/2018	172.55	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+400	16.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400037	---
75	E.C. (SAN MARCOS ARTEAGA-SANTO DOMINGO TONALA)-SAN JORGE NUCHITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	15/03/2012	15/12/2018	170.44	EN 2016 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 27+100 AL KM. 28+500. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBO RECURSO.	34.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400014	---
76	CAMINO: E.C. CORCOVADO - APANGO (CAMINO VIEJO POCHUTLA-HUATULCO)	01/06/2012	15/12/2018	169.64	EN 2016 SE APROBARON 5.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+700 AL KM. 9+000. EN EL 2017 SE APROBARON 11.4 MDP EN EL PEF.	19.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400001	---
77	CONCEPCION BUENAVISTA-SAN ANTONIO ABAD-SAN MIGUEL ASTATLA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	15/02/2012	15/12/2018	168.90	EN 2016 SE APROBARON 5.0 MDP EL CUAL FUE UTILIZADO PARA PAGO DE ADEUDOS. EN 2017 NO SE AUTORIZO RECURSO.	14.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400015	---
78	EL CAMARON-SAN CARLOS YAUTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	15/07/2011	15/12/2018	157.82	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.5 MDP PARA EL SUBTRAMODEL KM. 13+900 AL KM. 18+000	18.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400005	---
79	GUADALUPE - SAN JUAN LACHIXILA	01/03/2014	31/12/2018	155.00	EN 2016 SE APROBARON 16.00 MDP. POR FALTA DE ELEMENTOS Y AUTORIZACIÓN SE QUEDO SIN RECURSO. EN EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 12.00 MDP.	31.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400017	---
80	SANTA CRUZ DE BRAVO-SANTA BARBARA-EL ZAPOTE	15/07/2010	15/12/2018	154.40	EN 2016 SE APROBARON 7.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+700 AL KM. 5+000. EN EL PRESENTE 2017 NO SE AUTORIZO RECURSO.	12.20	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400020	---
81	SANTA MARIA YOLOTEPEC - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+500	15/08/2011	15/12/2018	153.06	EN EL 2016 SE APROBARON 13.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+460 AL KM. 13+260. EN 2017 SE APROBARON 5.00 MDP EN EL PEF.	14.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400009	---
82	SAN PEDRO TEUTILA - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	01/05/2010	31/03/2018	151.99	EN 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 1+500 AL KM 2+300. EN EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 13 MDP.	29.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400007	---
83	SANTA MARIA COLOTEPEC - LAS CARRETAS - JUNTA DEL POTRERO - EL CAMALOTE	01/03/2012	15/12/2018	148.93	EN EL 2016 SE AUTORIZARON 5.0 MDP QUE FURON UTILIZADOS PARA PAGO DE ADEUDOS. EN EL 2017 NO SE APROBO RECURSO EN EL PEF.	13.27	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400002	---
84	LUNATITLAN DEL PROGRESO -TOTOLTEPEC DE GUERRERO (PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	15/03/2009	15/12/2018	147.90	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+700 AL KM. 13+200	25.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400028	---
85	LOMA BONITA -E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES), TRAMO: KM 11+300 AL KM 35+000	15/04/2012	15/12/2018	134.32	EN EL 2016 SE APROBARON 13.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 31+000 AL KM. 32+000. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 20.00 MDP EN EL PEF.	38.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400035	---
86	SANTA ROSA CAXTLAHUACA - SAN MIGUEL CUEVAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+600	15/03/2012	15/12/2018	128.44	EN EL 2016 SE APROBARON 5.00 MDP EL CUAL FUE UTILIZO PARA PAGO DE ADEUDOS.	11.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400012	---
87	SANTA MARIA COLOTEPEC - LAS CARRETAS - JUNTA DEL POTRERO - EL CAMALOTE	01/08/2009	15/12/2018	124.24	EN EL 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 11+200. EN EL 2017 SE APROBARON 7.0 MDP EN EL PEF.	12.70	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400036	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
88	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - LA CAPILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000	01/06/2010	15/12/2018	115.94	EN EL 2016 SE APROBARON 13.60 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 15+500 AL KM. 18+500. EN 2017 SE AUTORIZARON 18.00 MDP EN EL PEF.	24.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400006	---
89	LUNATITLAN DEL PROGRESO - TOTOLTEPEC DE GUERRERO - PUEBLA	01/07/2009	31/03/2018	115.26	EN 2016 SE APROBARON 5.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 13+100 A L KM 14+000. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 13.6 MDP EN EL PEF.	25.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096400028	---
90	LUNATITLAN DEL PROGRESO - TOTOLTEPEC DE GUERRERO - PUEBLA	01/07/2009	31/03/2018	115.26	N/A	25.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096400028	---
91	E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NÚMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000	15/03/2012	15/12/2018	102.44	EN 2016 SE APROBARON 5.0 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRAMO DEL KM 28+850 AL KM 29+650. EN EL 2017 NO SE APROBO RECURSO.	80.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400011	---
92	E.C. (TLAXIACO - CHALCATONGO) - YOSOYUA	15/03/2012	15/12/2018	95.97	EN 2016 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+200 AL KM. 6+700 EN 2017 SE APROBARON 5.0 MDP EN EL PEF.	7.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400003	---
93	E.C.(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-ZACATEPEC- COYULITO-GUADALUPE NUEVO CENTRO	01/07/2013	31/12/2018	90.00	N/A	18.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096400027	---
94	CAZADERO DE ARRIBA-CERRO IGUANA-SAN DIONISIO DEL MAR DEL KM. 0+000 AL KM. 23+138,	01/04/2008	31/12/2018	80.20	EN EL 2016 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 16+500 AL KM. 18+300. EN EL 2017 NO SE APROBARON RECUERSOS EN EL PEF	23.14	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096400003	---
95	SANTA MARIA CHILCHOTLA-MONTE HOREB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+635	01/04/2009	31/12/2018	62.28	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 4.1 MDP PARA EL SUBTRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 5+980	10.64	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400018	---
96	CHAHUITES RANCHO SALINAS	01/04/2012	15/12/2017	60.10	EN EL 2016 SE APROBARON 7.5 MDP PARA MODERNIZAR EL TRAMO DEL KM. 6+400 AL KM. 8+030. EN EL 2017 NO SE APROBO RECUERSO ENE L PEF.	13.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400003	---
97	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSÉ LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 9+600	01/06/2014	15/12/2017	50.15	EN 2016 SE APROBARON 23.00 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 7+700. EN EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 16.00 MDP.	9.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400003	---
98	E.C. KM. 187 CARRETERA FEDERAL 185 TRANSISMICA (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ)-GUIVICIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	15/02/2014	15/12/2018	38.44	EN EL 2016 SE APROBARON 5.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+180 AL KM. 4+180. EN EL 2017 NO SE APROBO RECUEROSO EN PEF.	12.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400045	---
99	E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEJILLO) TINUMA DE ZARAGOZA	07/04/2016	31/12/2017	36.10	EN 2016 SE AUTORIZARON 5.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+200. EN 2017 SE APROBARON 5.00 MDP EN EL PEF.	7.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400006	---
100	SAN MARTIN DEL ESTADO - SANTIAGO YUCUYACHI - E.C. (TAMAZOLA-CRUZ DE BRAVO).	01/07/2010	15/12/2018	34.25	EN 2016 SE APROBARON 8.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 4+000 AL KM 6+000. EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBO RECURSO.	9.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400002	---
101	OAXACA - PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO - BARRANCA LARGA - VENTANILLA RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN.	01/01/2014	31/12/2018	25.00	EN 2016 SE AUTORIZARON 12 MDP. PARA LA MODERNIZACION DEL KM 4+000 AL KM 5+200. EN 2017 SE APROBARON 18 MDP EN EL PEF.	8.60	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400006	---
102	E.C. KM. 31 (AMATE-COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJIA)-EL LIMON-STA. ANA PROGRESO-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	15/03/2012	15/12/2017	19.18	DEBIDO A QUE HUBO RECORTES PRESUPUESTALESE NO ES POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. ADEMAS QUE EN 2016 NO FUE INCLUIDO EN EL PEF. EN EL PRESENTE 2017 SE APROBARON 6.00 MDP EN EL PEF.	4.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400017	---
103	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN FRANCISCO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+160	01/06/2014	15/02/2018	15.45	EN 2016 SE APROBARON 4.50 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+800 AL KM. 1+700 EN EL PRESENTE 2017 NO SE APROBARON RECURSOS.	3.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400009	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
104	SANTA ISABEL DE LA REFORMA - SANTIAGO IXCUINTEPEC	18/03/2014	14/12/2018	15.00	EN 2015 SE INVIERTEN 6.2 MDP PARA LA MODERNIZACION DEL KM 4+000 AL KM 7+000 Y SU CONCLUSION TOTAL DEPENDERAN DE FUTURAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	32.80	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400016	---
105	E.C. MEXICO 200 - SALINAS DEL MARQUES	06/06/2012	31/12/2018	13.80	FALTAN POR MODERNIZAR FRANJA CENTRAL 2.06 KMS Y 0.7 MTS DE LA FRANJA 3 EN SECCION TIPO BOULEVARD Y SU CONCLUSION TOTAL DEPENDERAN DE FUTURAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	2.06	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400006	---
106	EJE INTERESTATAL MITLA-SAYULA DEL KM. 0+000 AL KM. 230+000 TRAMO: MITLA - AYUTLA - ALOTEPEC - COTZOCON - CANDAYOC	01/04/2006	31/12/2020	199.14	EN EL 2016 SE APROBARON 13.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 61+300 AL KM. 63+800. EN EL PRESENTE 2017 NO SE AUTORIZO RECURSO.	230.00	PROCESO 2017-2020	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400004	---
107	PLATAFORMA LOGISTICA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC	16/03/2017	31/12/2018	1,556.00	N/A	PLATAFORMA	PROYECTADAS 2017-2018	PUERTOS		PNI568
108	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN EL CANAL DE NAVEGACION, EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ.	04/04/2017	31/12/2017	335.00	SE RECALENDARIZÓ LA FECHA DE INICIO DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SHCP	MUELLE	PROYECTADAS 2017-2018	PUERTOS		---
109	LIBRAMIENTO MATIAS ROMERO	28/02/2017	31/12/2018	220.00	AL SER UNA OBRA PROYECTADA NO SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA Y SU TRAZO ES EN TERRENOS VIRGENES	6.20	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	05096400027	---
110	REFORZAMIENTO DEL MUELLE DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA.	30/05/2018	31/12/2018	150.80	N/A	MUELLE	PROYECTADAS 2017-2018	PUERTOS		---
111	MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA E.C. (MITLA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SANTIAGO QUIAVICUSAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000	01/09/2017	31/12/2018	128.37	EN 2016 SE APROBARON 11.00 MDP PARA LA MODERNIZACIÓN DEL KM 23+500 AL 21+000. EN EL PRESENTE 2017 SE AUTORIZARON 15.00 MDP.	23.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096400004	---
112	CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO.	01/03/2017	01/12/2017	70.00	N/A	BODEGAS	PROYECTADAS 2017-2018	PUERTOS		---
113	PUENTE RIO CHIQUITO UBICADO EN EL CAMINO E.C. (TEHUACÁN - TELIXTLAHUACA) - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	01/07/2017	31/12/2017	14.57	RECURSOS NO LIBERADOS POR DUPLICIDAD DE REGISTRO ANTE LA SHCP EN 2016 OBRA CANCELADA POR NO AUTORIZARSE EL FOLIO DE LA SHCP.	1 PUENTE 0.036 KM	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400033	---
114	AMPLIACION DEL PATIO DE CONTENEDORES.	01/04/2019	31/12/2019	110.00	N/A	PATIO DE CONTENEDORES	PROYECTADAS 2017-2019	PUERTOS		---
