



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018
CHIAPAS**

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE CENTROS SCT**

OCTUBRE 2016




SCT CHIAPAS 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes



ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

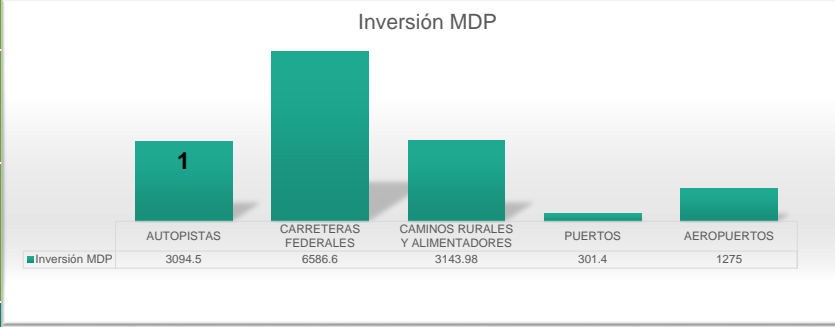

1 AUTOISTAS



19 CARRETERAS



42 CAMINOS RURALES



0 FERROVIARIO




5 PUERTOS



2 AEROPUERTOS

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

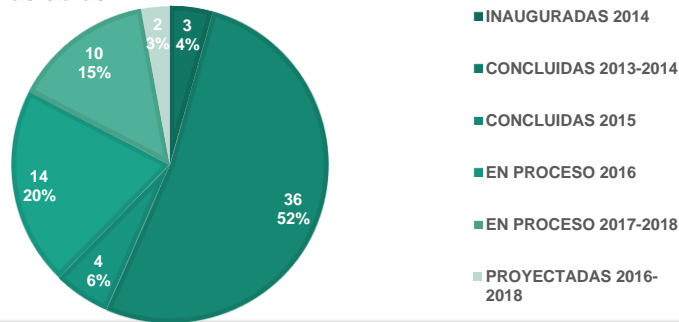

Programas



TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		834,934.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		834,934.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		166,908.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA IV ETAPA		116.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		116.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN	101.42	53.98	91.50	246.90
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	86	86	90	90
JORNALES	1,147,950	1,044,069	912,002	3,104,021
BENEFICIARIOS	21,385	20,805	17,396	59,586
LONGITUD	2,589.57	1,912.00	0.00	4,511.57
CAMINOS			394	394

Fecha de recepción: Miércoles, 5 de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: SCT-707-1.11-086/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-501/2016 enviado por la DGAPDCST

Obras **MDP** **Km**
A la fecha, la SCT **69** **14,401.5** **24,233.5**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOISTAS	1	3,094.50	178.00	1
EN PROCESO 2017-2018	1	3,094.50	178.00	1
CARRETERAS FEDERALES	19	6,586.60	5,696.06	6
INAUGURADAS 2014	2	663.09	156.40	2
CONCLUIDAS 2013-2014	8	311.97	52.50	0
CONCLUIDAS 2015	2	844.05	2,553.18	1
EN PROCESO 2016	4	2,792.58	2,848.98	1
EN PROCESO 2017-2018	1	669.91	-	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	1,305.00	85.00	2
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	42	3,143.98	18,356.80	0
CONCLUIDAS 2013-2014	23	1,514.03	367.60	0
CONCLUIDAS 2015	1	243.21	810.08	0
EN PROCESO 2016	10	628.26	8,812.82	0
EN PROCESO 2017-2018	8	758.48	8,366.30	0
PUERTOS	5	301.40	0.16	0
CONCLUIDAS 2013-2014	5	301.40	0.16	0
AEROPUERTOS	2	1,275.00	2.50	0
INAUGURADAS 2014	1	1,269.00	2.50	0
CONCLUIDAS 2015	1	6.00	-	0
Total general	69	14,401.48	24,233.52	7

* EL CG-233 COATZACOALCOS A TUTXLA GUTIERREZ, . ARRIAGA - ENT. LAS CHOAPAS – OCOZOCOATLA TIENE UNA INVERSIÓN PROYECTADA DE \$1,050.00 POR LO QUE LOS 600 MDP SE EJECUTAN MEDIANTE EL CENTRO SCT VERACRUZ

AVANCE EN PROGRAMAS

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	4,001			4001
INMUEBLES ESCOLARES	2,591			2591
CENTROS DE SALUD	935			935
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	441			441
OFICINAS DE GOBIERNO	27			27
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	4			4
ESPACIOS PÚBLICOS	3			3

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	AEROPUERTO PALENQUE	01/04/2011	01/02/2014	1,269.00		2.50	INAUGURADAS 2014	AEROPUERTOS		PNI207
2	CG-112, MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACION EN CHAPA DE CORZO Y EMIL. ZAPATA, PARRAL,	06/08/2013	30/12/2013	391.37	INAUGURADA 13-NOV-14	70.00	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092100003	PNI246
3	CG-237, REHABILITAR LA CARRETERA MOTOZINTLA - TAPACHULA	01/09/2013	30/12/2013	271.72	INAUGURADA 13-NOV-14	86.40	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	PNI192
4	ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC	01/04/2009	03/08/2014	287.33	N/A	46.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270015	PE
5	VALDIVIA - PALMARCITO.	27/04/2004	01/08/2014	160.29	N/A	43.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270006	--
6	PIJIJAPAN AEROPUERTO. TRAMO: AEROPUERTO (MARIANO MATAMOROS) ZACULAPA.	20/07/2010	04/08/2014	118.08	N/A	23.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096270019	--
7	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA PLAYA PONIENTE DE PUERTO CHIAPAS, PRIMERA Y SE	15/10/2013	31/12/2014	115.42		ROMPEOLAS	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS		--
8	PROLONGACION DE LA ESCOLLERA ORIENTE	27/09/2013	31/12/2013	100.00	N/A	0.16	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS	1109J3C0003	--
9	SESECAPA-LAS SALINAS	15/09/2011	26/10/2014	98.84	N/A	20.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	1109270023	--
10	MOTOZINTLA BELISARIO DOMINGUEZ VILLAHERMOSA - EJIDO BERRIOSABAL	21/10/2011	04/08/2014	95.42	N/A	21.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270034	--
11	HERMENEGILDO GALEANA LAS DELICIAS	28/09/2010	02/09/2014	83.60	N/A	26.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096270007	--
12	BELISARIO DOMINGUEZ - LAS CABAÑAS.	15/09/2005	04/08/2014	82.41	N/A	25.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270009	--
13	CAMINO: E.C. CIUDAD CUAUHTEMOC- CHIHUAHUA-ANGEL ALBINO CORZO.	04/03/2009	01/08/2014	75.54	N/A	18.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270009	--
14	BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC	28/05/2007	09/07/2014	74.49	N/A	13.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096270008	--
15	E.C. (NUEVO MEXICO - SAN JUAN CARRIZAL)	21/10/2011	01/07/2014	73.71	N/A	17.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270035	--
16	ENTRONQUE VIVA MEXICO (FORMA PARTE DEL COMPROMISO 237)	01/08/2013	01/12/2013	72.90	N/A	6 TALUDES, 2 MUROS	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	--
17	DRAGADO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN PUERTO	01/07/2013	01/12/2013	63.21	N/A	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS	1309J3C0001	--
18	ACAPETAGUA-EL ARENAL-EMBARCADERO RIO ARRIBA	07/07/2008	01/07/2014	57.10	N/A	17.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270015	--
19	BOCHIL LUIS ESPINOZA.	08/06/2011	08/09/2014	50.08	N/A	20.25	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270014	--
20	CHAPINGO-EJIDO MORELOS	17/09/2011	11/08/2014	45.90	N/A	10.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270053	--
21	COAPA - CENICEROS, MUNICIPIO PIJIJAPAN	05/10/2009	01/06/2014	44.00	N/A	11.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	09096270011	--
22	CAMINO: FRONTERA HIDALGO-CANTON EL CARMEN	26/11/2008	04/08/2014	43.30	N/A	14.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270007	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
23	CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA-EJIDO FRANCISCO I. MADERO.	21/02/2009	04/08/2014	41.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270001	--
24	E.C. ARRIAGA - TONALA - EL TERRERO - OTOTAL	29/06/2007	01/06/2014	41.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270019	--
25	E.C. ARRIAGA - TONALA - OTOTAL (RAMAL GALEANA CALENTURA)	01/02/2014	01/06/2014	39.10	N/A	10.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270019	--
26	E.C.E. CHIAPAS NO. 230 CUAUHTEMOC	12/03/2014	07/09/2014	35.14	N/A	9.21	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270009	--
27	SINALOA NICOLAS BRAVO	05/09/2011	01/07/2014	30.10	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096270020	--
28	NUEVO PUENTE - IXTAPILLA - NUEVO TEPEYAC	07/06/2012	02/11/2013	27.09	N/A	7.42	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270010	--
29	LA TRINITARIA - PAV. DEL CAMINO JOSE MARIA MORELOS	01/08/2010	01/11/2013	27.07	N/A	5.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	10096270010	--
30	E.C. (LARRAINZAR MITONTIC) ICALUMTIC	01/07/2011	01/11/2013	26.77	N/A	5.58	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270017	--
31	TRES PUENTES BAYALEMO DOS.	24/06/2011	08/09/2014	23.74	N/A	3.20	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270004	--
32	EMILIANO ZAPATA CINTALAPA.	02/04/2012	27/11/2013	19.22	N/A	7.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270039	--
33	DRAGADO DE MANTENIMIENTO PUERTO MADERO	01/03/2013	01/04/2013	19.00	N/A	Dragado	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS	1109J3C0002	--
34	E.C. (VILLAFLORES -OCOZOCOAUTLA) - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	08/06/2012	07/09/2014	17.05	N/A	4.60	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270007	--
35	E.C. HUITIUPAN-SIMOJOVEL-EL OCOTAL.	06/06/2012	30/11/2013	14.35	N/A	5.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270014	--
36	PUENTE VEHICULAR, EJIDO LEON BRINDIS, MAPASTEPEC.	01/10/2013	01/03/2014	10.11	N/A	0.05	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13096270006	--
37	E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA)-EJ. DR. SAMUEL BRINDIS	01/10/2013	01/08/2014	8.18	N/A	2.05	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13096270007	--
38	RED CONTRAINCENDIOS PRIMERA ETAPA	01/08/2013	01/09/2014	3.77	N/A	RED CONTRAINCENDIOS	CONCLUIDAS 2013-2014	PUERTOS	1009J3C0002	--
39	PASO DEL SOLDADO - OJO DE AGUA.	24/04/2014	20/09/2014	2.89	N/A	6.04	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096270005	--
40	CG-113 MODERNIZAR LOS LIBRAMIENTOS NORTE Y SUR DE TUXTLA GUTIERREZ	18/11/2013	20/02/2015	490.20	N/A	172.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096270009	PNI274
41	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES (40 OBRAS)	16/03/2015	01/12/2015	353.85	EL MONTO DE INVERSION FUE DE 353.85 TAL COMO LO MARCA EL DOCUMENTO FUENTE QUE SE ANEXA QUEDANDO UN ADEUDO DE 69 MDP	2,381.18	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001; 14092110003; 14092110004; 14092110005;	--
42	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01/03/2015	31/12/2015	243.21	DERIVADO A QUE LA ADJUDICACIÓN DE DIFERENTES CONTRATOS DE ESTE SUBPROGRAMA SE DIFIRIERON OCASIONO QUE LA FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS SEA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	810.08	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--
43	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TAPACHULA	01/01/2014	31/12/2015	6.00	LA CUAL CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR CO SA-09.2/13 - ACCESIBILIDAD PERSONAS DISCAPACIDAD, CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR CO SA-09.2/13 - ACCESIBILIDAD PERSONAS DISCAPACIDAD, ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
44	SAN CRISTOBAL COMITAN, TRAMO: RANCHO NUEVO - COMITAN	01/05/2011	31/12/2016	1,021.00	SE HA MODERNIZADO 10KM CON REC FED DEL TRAMO 150 - 154 Y DEL 157 - 163. EN PROCESO DEL 125 - 130. SE REASIGNARON 500 MDP A GOB DEL EDO PARA 30 KM EN LOS TRAMOS 130 - 150, 154 - 157 Y 163 - 170	45.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES		--
45	CG-008 MODERNIZACION CARRETERA A LA FRONTERA DESDE COMITAN	31/10/2013	01/12/2016	850.00	N/A	400.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	13096270008	PNI339
46	CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES	01/02/2016	31/12/2016	471.58	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES (53 OBRAS CONTRATADAS; 1 OBRA POR CONTRATAR; 2 OBRAS CANCELADAS).	2,377.18	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004; 15092110005; 15092110006;	--
47	PALENQUE-CATAZAJA.	01/04/2015	31/12/2016	450.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA META 2016	26.80	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	14096270033	--
48	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	02/03/2016	31/12/2016	277.70	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	823.82	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	PE
49	OXCHUC - PLAZA YOCHIB	13/06/2007	01/11/2016	61.76	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER AL CENTRO SCT CHIAPAS	2,255.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270008	--
50	EL PARAISO - EL NOPAL	01/06/2005	01/12/2016	55.75	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER AL CENTRO SCT CHIAPAS	170.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270024	--
51	E.C. (COPAINALA TECPATAN) RIVERA CAMPECHE	11/07/2012	01/12/2016	40.91	LA FECHA DE TERMINO SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL RECURSO PEF 2016	883.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270012	--
52	EL PINAR - E.C. TENEJAPA, TR: KM. 0 + 000 AL 9 + 897.9	01/06/2011	01/12/2016	38.44	LA FECHA DE TERMINO SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL RECURSO PEF 2016	990.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270016	--
53	STA. ELOISA - EL ZAPOTE - E.C. (NVO.TEPEYAC - IXTAPILLA); INCLUYE RAMAL A CHITAMA.	06/06/2012	01/12/2016	38.11	LA FECHA DE TERMINO SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL RECURSO PEF 2016	1,066.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	22096270058	--
54	TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO.	13/03/2014	01/11/2016	34.34	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	1,250.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270055	--
55	YABTECLUM - PUEBLA	24/06/2011	01/11/2016	31.72	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	1,200.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270003	--
56	E.C. (HUITIUPAN EL BOSQUE) SAN FRANCISCO PORTUGAL EL JARDIN.	05/05/2012	01/11/2016	24.87	N/A	87.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270004	--
57	SIMOJOVEL - LA PIMIENTA	05/05/2012	01/12/2016	24.66	LA FECHA DE TERMINO SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACIÓN DEL RECURSO PEF 2016	88.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270003	--
58	CG-234 MODERNIZAR Y AMPLIAR LA CARRETERA PALENQUE-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (PRIMERA ETAPA)	01/04/2016	01/12/2018	3,094.50		178.00	EN PROCESO 2017-2018	AUTOPISTAS	42920	PNI656
59	RIZO DE ORO-LA CONCORDIA 2 PUENTES	01/11/2014	31/08/2018	669.91	N/A	2 PUENTES	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096270038	--
60	COJTO MIL - JETJA - EL DIAMANTE CRUCERO PIÑAL	01/01/2008	30/12/2025	378.00	2008-2012 74.3 MDP. 20.6 KM 2014 - 12+400 AL 13+800 COTJOMIL Y 11+500 AL 13+200 CRUCERO EL PIÑAL - 3.1KM	11.10	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096270011	--
61	TUMBALA - KHANIL	01/01/2004	01/12/2019	118.50	2004-2012 108.8 MDP 32 KM 2013 - 1.1 KM 2014 - KM 33+306 AL 34+100 - 0.794 KM	0.80	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270003	--
62	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CHAPAYAL	26/06/2004	01/11/2017	107.16	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER AL CENTRO SCT CHIAPAS	33.40	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096270002	--
63	SANTA CATARINA - LOS NARANJOS	18/06/2007	01/11/2018	69.79	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	189.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	07096270012	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
64	TRIUNFO DE MADERO - PUEBLO VIEJO	29/02/2012	01/12/2018	48.17	N/A	2,500.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096270022	--
65	JOSE MARIA MORELOS - LA RAYA LIM. EDOS. (CHS-TAB)	05/05/2012	01/11/2020	17.09	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	2,486.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270001	--
66	SAN VICENTE - SANTUARIO DOS - SANTUARIO - EMBARCADERO.	11/06/2012	01/11/2017	15.45	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	2,046.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096270031	--
67	E.C. (TUXTLA-VILLAFLORES)-ROBLADA GRANDE	12/03/2014	01/11/2018	4.32	LOS RECURSOS 2015 NO LE FUERON AUTORIZADOS A EJERCER A ESTE CENTRO SCT CHIAPAS	1,100.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096270014	--
68	CG-111 MODERNIZAR LA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ - VILLAFLORES	01/01/2017	01/12/2017	855.00	SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE ESTA OBRA DEBIDO A QUE NO SE TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE AÑO, POR LO QUE SE CAMBIA AL MES DE ENERO DE 2017 ESPERANDO QUE TENGA EL RECURSO PARA EJECUTARLA	74.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	44359	PNI394
69	CG-233 COATZACOALCOS A TUXTLA GUTIERREZ, . ARRIAGA - ENT. LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA	01/01/2017	01/12/2017	450.00	SE COMPLEMENTA LA INVERSIÓN TOTAL DE 1,050 MDP CON LA OBRA CLAVE OB_SCT_00563. ESTA OBRA AL ESTAR PROYECTADA SE DESCONOCE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL PEF 2016	11.00	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	06096470005	PNI259PNI330
