



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**BALANCE DE OBRAS 2013-2018  
OAXACA**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT**


**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
DE CENTROS SCT**

**NOVIEMBRE 2016**

SCT OAXACA 2013-2018


BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

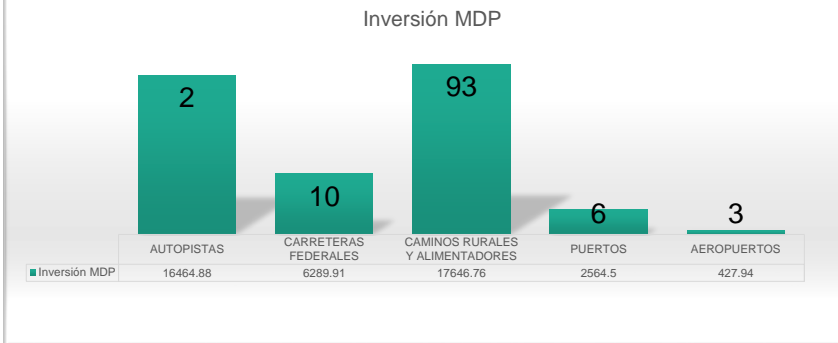

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

Estatus de las obras

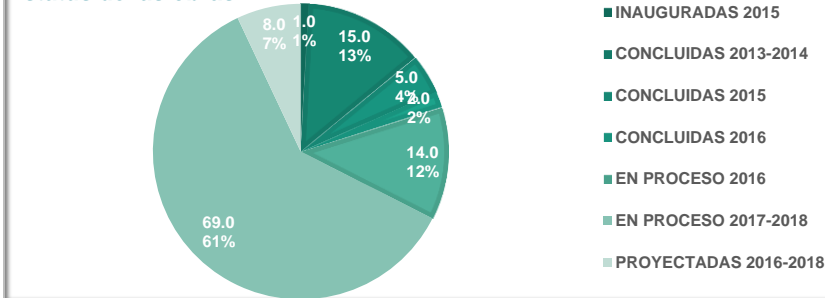

A la fecha, la SCT invierte **Obras 114**, **MDP 43,394.0** y **Km 7,887.5**

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
<b>AUTOISTAS</b>	<b>2</b>	<b>16464.88</b>	<b>1211.2</b>	<b>2</b>
EN PROCESO 2016	2	16464.88	1211.2	2
<b>CARRETERAS FEDERALES</b>	<b>10</b>	<b>6289.91</b>	<b>3637.02</b>	<b>2</b>
INAUGURADAS 2015	1	417.8	15.5	0
CONCLUIDAS 2013-2014	1	9	0.03	0
CONCLUIDAS 2015	1	37.48	0	0
CONCLUIDAS 2016	1	579.1	212.7	1
EN PROCESO 2016	1	434.13	2930.39	0
EN PROCESO 2017-2018	4	4592.4	472.2	1
PROYECTADAS 2016-2018	1	220	6.2	0
<b>CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES</b>	<b>93</b>	<b>17646.76</b>	<b>3039.003</b>	<b>0</b>
CONCLUIDAS 2013-2014	14	549.84	131.853	0
CONCLUIDAS 2015	3	160.07	23.3	0
CONCLUIDAS 2016	1	144.28	43	0
EN PROCESO 2016	9	657.01	410.08	0
EN PROCESO 2017-2018	64	15992.62	2407.77	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	142.94	23	0
<b>PUERTOS</b>	<b>6</b>	<b>2564.5</b>	<b>0.298</b>	<b>0</b>
EN PROCESO 2017-2018	1	342.7	0.298	0
PROYECTADAS 2016-2018	5	2221.8	0	0
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>3</b>	<b>427.94</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
CONCLUIDAS 2015	1	47.5	0	0
EN PROCESO 2016	2	380.44	0	1
<b>Total general</b>	<b>114</b>	<b>43393.99</b>	<b>7887.521</b>	<b>5</b>

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		524,260.0	524,260.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		492,532.0	492,532.0
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		190,877.0	190,877.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS		287.0	287.0
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO		171.0	171.0



PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	98.02	98.20	103.90	300.12
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	241	241	570	570
JORNALES	1,139,257	1,075,938	1,025,026	3,240,221
BENEFICIARIOS	23,455	22,521	25,295	71,271
LONGITUD CAMINOS	2,449.33	159.00		2,608.33

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
<b>INVERSIÓN</b>				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	4,249			4,249
INMUEBLES ESCOLARES	2,868			2,868
CENTROS DE SALUD	746			746
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	584			584
OFICINAS DE GOBIERNO	45			45
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3			3
ESPACIOS PÚBLICOS	3			3

Fecha de recepción: Viernes, 4 de noviembre de 2016, mediante Oficio No.: 6.19.0412/2016 enviado por el CSCT.  
Solicitado para el Lunes, 7 de noviembre de 2016, mediante el Oficio No. 6.0.1-1628/2016 enviado por la DGAPDCST

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

Programas



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	HUATULCO - ENTRONQUE AEROPUERTO	10/05/2011	31/12/2014	417.80	INAUGURADA 30-ENE-15	15.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	8096400015	PE
2	SANTA CATARINA JUQUILA SAN MARCOS ZACATEPEC RIO GRANDE	01/04/2008	01/07/2014	192.48	LA LONGITUD TOTAL DE LA CARRETERA MODERNIZADA PERO FUE DAÑADA POR FENOMENOS METEOROLOGICOS POR LO QUE EN 2015 SE INVIERTEN 6.48 MDP PARA LEVAR A CABO TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN TRAMOS PARCIALES DEL	48.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400018	0
3	CHAHUITES RANCHO SALINAS	01/04/2012	01/11/2013	60.10	SE CONSTRUYERON 3 PUENTES CONCLUIDOS AL 100% Y SE HAN MODERNIZADO 5.8 KMS; FALTA POR MODERNIZAR 7.2 KMS MAS; POR LO QUE EN 2015 SE INVIERTEN 1.9 MDP PARA MODERNIZAR EL TRAMO DEL KM. 5+800 AL KM. 6+400	13.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400003	0
4	LACHIXOVA-HONDURA LUCERO	01/03/2013	20/12/2013	52.50	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	26.80	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400012	0
5	E.C. F. (STA.MA. NATIVITAS ASUNCION NOCHIXTLAN)-SANTO DOMINGO YANHUITLAN	20/10/2011	01/11/2013	43.90	OBRA CONCLUIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL PEF 2013 A UN CONVENIO DE REASIGNACION.	9.1 kms Y 1 PUENTE (0.03)	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400026	0
6	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIO- NUEVO PROGRESO Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	07/07/2009	31/12/2013	40.84	EL PUENTE FUE CONSTRUIDO POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS PROPIOS Y LA MODERNIZACION DEL CAMINO FUE CONCLUIDA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES A CARGO DE LA SCT AL GOBIERNO ESTATAL	11 kms Y 1 PUENTE	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400010	0
7	SAN MARTIN DEL ESTADO - SANTIAGO YUCUYACHI - E.C. (TAMAZOLA-CRUZ DE BRAVO).	01/07/2010	31/07/2014	34.25	FALTAN POR MODERNIZAR 1.5 KMS Y LO YA EJECUTADO PERO FUE DAÑADA POR FENOMENOS METEOROLOGICOS POR LO QUE EN 2015 SE INVIERTEN 1.0 MDP PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL KM 6+000 AL 8+000	9.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400002	0
8	ALVARO OBREGON - SAN PEDRO HUILOTEPEC	01/04/2013	31/12/2014	23.10	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400012	0
9	GUIGOVELAGA - SANTA ISABEL DE LA REFORMA	06/06/2012	01/07/2014	21.40	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400020	0
10	E.C.(LA CHIVIXA - TRES CRUCES) - GUICHIXU	01/02/2012	31/07/2014	18.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN AFECTADA CONSTANTEMENTE POR FENOMENOS METEOROLOGICOS CARACTERISTICOS EN LA ZONA	4.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400013	0
11	E.C. 200 - EL FAISAN - LA CAÑADA	06/06/2012	27/07/2014	18.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	4.25	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400010	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
12	CAMINO: KM. 263.1 E.C. TEHUANTEPEC - JUCHITAN - ALVARO OBREGON.	01/04/2012	31/10/2013	14.00	OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACIÓN	9.30	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400002	0
13	E.C. (SANTA MA. NATIVITAS-ASUNCION NOCHIXTLAN)-SAN BARTOLO SOYALTEPEC	06/06/2012	30/11/2013	11.79	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA POR GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL TRASLADO DE LOS RECURSOS DEL PEF 2013 A UN CONVENIO DE REASIGNACION.	2.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400022	0
14	SANTO DOMINGO YANHUITLAN CBTA 51 SAN PEDRO AÑANE TEPOCOLULA.	01/10/2009	30/07/2014	9.98	EN 2015 SE INVIERTIERON 6.7 MDP PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITIERON FINIQUITAR LA OBRA	2.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400033	0
15	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCOTRAMO LA Y BARRANCA LARGA-VENTANILLA YPUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMALPIEDRA CAMPANA DEL KM. 0+000 ALKM5+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 3+000	01/02/2014	31/12/2014	9.50	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 1.0 MDP PARA EL PAGO DE ADEUDOS	2.50	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400008	0
16	PUENTE COLLANTES UBICADO EN EL KM. 16+981 DEL CAMINO PINOTEPA NACIONAL- COLLANTES.	01/09/2013	30/06/2014	9.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE FONDEN	0.03	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	13096400005	0
17	E.C. KM. 57.5 (TEHUACAN-HUAJUAPAN)-SANTIAGO CHAZUMBA-SAN SEBASTIAN FRONTERA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 INCLUYE PUENTE	15/01/2012	31/12/2015	76.59	SE CONCLUYE LA META HASTA SAN SEBASTIAN FRONTERA, QUEDAN PENDIENTES 2 KM DEL LADO DE PUEBLA POR LO QUE EL ESTADO DE OAXACA DA POR CONCLUIDO ESTE TRAMO.	6.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400017	0
18	(MITLA-TEQUISISTLAN-ENT. TEHUANTEPEC II) - RAMAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000,	01/06/2012	28/02/2015	53.55	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 13.0 MDP PARA SUBTRAMO A MODERNIZAR EN TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 3+150 AL KM. 4+800; TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DEL KM. 1+	12.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400007	0
19	AMPLIACION Y MODERNIZACION AEROPUERTO DE HUATULCO	01/01/2014	31/12/2015	47.50	A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V. Y SUPERVISADA POR COMINDE S.A.DE C.V.	AEROPUERTO	CONCLUIDAS 2015	AEROPUERTOS		PE
20	PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA ARENA CON UNA LONGITUD DE 150.0 METROS UBICADO EN EL KM. 21+000 DEL CAMINO: PINOTEPA NACIONAL - SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	22/04/2012	15/11/2015	37.48	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.3 MDP PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PAVIMENTACION DE ACCESOS EN LA COMUNIDAD DE COLLANTES Y CHICOMETEPEC	PUENTE	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	12096400018	0
21	KM. 90+600 E.C. (MITLA-TEHUANTEPEC II) SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	01/06/2014	28/02/2015	29.93	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 5.0 MDP PARA PAGO DE ADEUDOS	5.30	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400004	0
22	CG-209 REHABILITAR LA CARRETERA OAXACA - IXTLAN - VALLE NACIONAL - TUXTEPEC.	01/10/2013	31/03/2016	579.10	EN 2015 SE INVIERTIERON 202.0 MDP PARA CONCLUIR LA REHABILITACION TOTAL DE LA CARRETERA FEDERAL, EL RECORTE PRESUPUESTAL NO PERMITIO CONCLUIR LO PROGRAMADO Y SE CONCLUYE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2016	212.70	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	PNI279
23	TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	01/04/2009	05/10/2016	144.28	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 41.6 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 34+600 AL KM. 36+600	43.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400002	0
24	CG-211 CONCLUIR LA CARRETERA OAXACA - ISTMO	01/07/2012	31/12/2016	11,819.00	PUESTA EN OPERACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE 28.0 KMS, POR EL C. SECRETARIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUNDO TRAMO PUESTO EN OPERACIÓN 4-03-16 POR EL C.SECRETARIO	169.20	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	4096400001	PNI649

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
25	CG-213 CONCLUIR LA CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO	01/08/2012	31/12/2016	4,645.88	OBRA CONCESIONADA INVERSION PEF 7.2% FONADIN 21.52% PRIVADA 71.28%	1,042.00	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS	8096400015	PNI593
26	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES 2016	01/02/2016	31/12/2016	434.13		2,930.39	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	10092110001	0
27	CG-210 AEROPUERTO EN LA REGION DEL ISTMO	11/11/2014	31/12/2016	361.14	SE TIENE PROGRAMADA LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO SEDENA-SCT-ASA EN EL PRESENTE EJERCICIO; MIENTRAS QUE SU PUESTA EN OPERACIÓN SE TIENEN PROGRAMADA PARA 2017 (DGAC)	AEROPUERTO	EN PROCESO 2016	AEROPUERTOS	1409JZL0021	PNI175
28	E.C. 30+400 (MIAHUATLAN-SAN JOSE LACHIGUIRI) - SAN ANDRES MIXTEPEC - SANTA CATARINA QUIOQUITANI DEL KM. 0+000 AL KM. 22+400	01/04/2006	15/12/2016	242.86	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 20+400 AL KM. 21+700	0.02	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400004	0
29	EJE INTERESTATAL MITLA-SAYULA DEL KM. 0+000 AL KM. 230+000 TRAMO: MITLA - AYUTLA - ALOTEPEC - COTZOCON - CANDAYOC	01/04/2006	15/12/2016	199.14	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 18.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 61+300 AL KM. 63+800	230.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400004	0
30	SANTA MARIA CHILCHOTLA-MONTE HOREB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+635	01/04/2009	15/12/2016	62.28	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 4.1 MDP PARA EL SUBTRAMO DEL KM. 5+200 AL KM. 5+980	10.64	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096400018	0
31	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2016	15/02/2016	31/12/2016	50.00		143.20	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
32	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN PEDRO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+560	01/06/2014	31/10/2016	32.00	EN EL 2015 SE APROBARON 22.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A TRABAJAR DEL KM. 1+500 AL KM. 7+600 Y DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA PROGRAMADA	7.56	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400011	0
33	OAXACA - PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO - BARRANCA LARGA - VENTANILLA RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN.	01/01/2014	31/12/2016	25.00	EN 2015 SE INVIERTEN 7.6 MDP PARA LA MODERNIZACION DEL KM 0+000 AL KM 4+000 Y SU CONCLUSION TOTAL DEPENDERAN DE FUTURAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	8.60	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400006	0
34	MODERNIZACION AEROPUERTO DE OAXACA	01/01/2013	30/12/2016	19.30	OBRA A CARGO DE ASA Y LA DGAC	AEROPUERTO	EN PROCESO 2016	AEROPUERTOS		PE
35	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SANTA CATARINA COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200	15/06/2014	31/12/2016	16.48	EN EL PRESENTE 2016 SE APROBARON 9.50 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000	5.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400008	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
36	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN FRANCISCO COATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+160	01/06/2014	15/12/2016	15.45	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 9.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+160	3.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400009	0
37	E.C. MEXICO 200 - SALINAS DEL MARQUES	06/06/2012	30/12/2016	13.80	FALTAN POR MODERNIZAR FRANJA CENTRAL 2.06 KMS Y 0.7 MTS DE LA FRANJA 3 EN SECCION TIPO BOULEVARD Y SU CONCLUSION TOTAL DEPENDERAN DE FUTURAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	2.06	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400006	0
38	ACAYUCAN-LA VENTOSA	01/08/2007	30/12/2018	2,048.50	PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE ESTA CARRETERA FEDERAL EN 2016 SE INVERTIRAN 230.0 MDP	100.10	EN PROCESO 2017-	CARRETERAS FEDERALES	5096400027	PNI489
39	PUERTO ESCONDIDO - POCHUTLA	01/06/2008	31/12/2018	1,479.90		70.00	EN PROCESO 2017-	CARRETERAS FEDERALES	8096400015	PNI439
40	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - SANTOS REYES TEPEJILLO - SAN JUAN MIXTEPEC - SAN MARTIN ITUNYOSO E.C. KM 102+00 E.C.(YUCUDAA - PINOTEPAL.)	01/04/2006	15/12/2018	1,161.70	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 20.0 MDP	107.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400019	0
41	MIAHUATLAN - SAN PABLO COATLAN - SAN JERONIMO COATLAN - PIEDRA LARGA - LA PALMA	01/03/2008	15/12/2018	887.20	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 32.6 MDP PARA LA CONSERVACION DEL KM. 15+000 AL KM. 23+000 Y ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM. 23+800 AL KM. 30+000	105.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400014	0
42	CG-212 MODERNIZAR LA CARRETERA NOCHIXTLAN - YUCUDA - TLAXIACO - PUTLA - PINOTEPAL NACIONAL	01/06/2014	30/12/2017	824.00		294.50	EN PROCESO 2017-	CARRETERAS FEDERALES	13092110003	PNI385
43	NOCHIXTLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 90+000	15/04/2006	16/12/2018	625.13	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 9.0 MDP SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 35+700 AL KM. 37+000	90.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400032	0
44	KM 89+000 E.C. (MITLA - ZACATEPEC) -SANTA MARIA YACOCHI - TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - LIM. EDOS. OAX/VER.	01/03/2008	15/12/2018	581.10		142.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400012	0
45	SANTA MARIA SOLA - TLACOTEPEC - TEOJOMULCO - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	01/03/2006	15/12/2017	564.87	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 43.0 MDP PARA MODERNIZAR DEL KM. 84+000 AL KM. 88+500 ADEMAS CUENTA CON TRAMOS A CARGO DE CDI Y DEL GOBIERNO ESTATAL	112.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400010	0
46	OJITE CUAUHEMOC-SANTA CRUZ ITUNDUJIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 64+00	01/02/2006	15/12/2018	535.26	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 4.7 MDP PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SUBTRAMO A COMPLEMENTAR DEL KM. 15+000 AL KM. 16+450 Y TRABAJOS POR EJECUTAR TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIE	64.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	6096400002	0
47	BOCA DEL PERRRO- SAN JUAN TEITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 65+000	01/04/2006	15/12/2018	530.04		65.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400030	0
48	LA VENTA -OZOLOTEPEC	13/10/2014	15/12/2018	480.00	EN EL PRESENTE 2015 SE INVIERTE 19.7 MDP PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE ESTA CARRETERA FEDERAL DEL KM. 39+800 AL KM. 43+460	90.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400005	0
49	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68		64.00	EN PROCESO 2017-	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400004	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
50	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68		64.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400004	0
51	AMATE COLORADO - ZARAGOZA ITUNDUJIA	01/06/2005	31/03/2019	439.68		64.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400004	0
52	SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTIAGO IXTAYUTLA, TRAMO: SAN JOSE DE LAS FLORES - SAN JOSE DE LAS FLORES IXTAYUTLA (KM. 10+000 AL KM.39+000).	15/04/2009	15/12/2017	430.04	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 30+000 AL KM. 31+000	33.88	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400031	0
53	SAN JUAN MIXTEPEC - TEJOCOTES - JUXTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000	15/03/2008	15/12/2018	403.24	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 9.5 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 24+100 AL KM. 26+960	38.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400009	0
54	E.C. KM. 126+645 (MITLA-ENTR. TEHUANTEPEC II)- SAN JUAN JUQUILA MIXES, DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000	15/06/2014	15/12/2018	375.59	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 35.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A TRABAJAR DEL KM. 7+000 AL KM. 18+000	31.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096400003	0
55	MAHUATLÁN - SAN CARLOS YAUTEPEC	01/03/2008	15/12/2018	375.46		104.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400011	0
56	CONSTRUCCION DE UN MUELLE DE USOS MULTIPLES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA	01/09/2013	31/12/2017	342.70	PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FALTANTES POR 154 MDP DE LO CONTRARIO SE CONCLUIRÁ EN EL 2017	0.30	EN PROCESO 2017- 2018	PUERTOS	01109J3G005	PNI196
57	SANTA MARIA GUIENAGATI - PEÑA BLANCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000	01/02/2012	15/12/2018	331.68	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 1.2 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+500 AL KM. 4+700	26.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400014	0
58	E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN BARTOLO YAUTEPEC- QUIEGOLANI DEL KM. 0+000 AL KM. 37+000	01/03/2012	15/12/2018	319.61	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 20.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 9+800 AL KM. 12+800	37.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400019	0
59	SAN PEDRO TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, DEL KM. 0+000 AL 23+500	15/05/2010	15/12/2018	291.66	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000	23.50	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400007	0
60	E.C. (IXTLAN DE JUAREZ - EL CEREZAL) - SAN MIGUEL DEL RIO	15/07/2012	15/12/2018	276.90	EN EL 2015 SE APROBARON 18.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+400 AL KM. 4+200 Y DEL KM. 1+500 AL KM. 3+000	22.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400010	0
61	SAN FELIPE IXTAPA-SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	15/07/2011	15/12/2018	275.67	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 8+500 AL KM. 9+860	25.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400006	0
62	SANTIAGO TILANTONGO - SAN MIGUEL TECOMATLAN	15/09/2009	15/12/2018	245.08	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 10.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+300 AL KM. 11+000	22.38	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400018	0
63	LIBRAMIENTO PALOMARES	02/02/2016	31/12/2018	240.00	AL SER UNA OBRA PROYECTADA NO SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA YA QUE SE ENCUENTRA EN TERRENOS VIRGENES EN 2016 SE INICIA CON EL ENT PALOMARES I	7.60	EN PROCESO 2017- 2018	CARRETERAS FEDERALES	5096400027	0
64	E.C. (HUAJUAPAN-TEHUACAN)-SANTA CATARINA ZAPOQUILA MEMBRILLOS DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000	15/06/2012	15/12/2018	237.54	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 10.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+400 AL KM. 6+400	22.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400040	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
65	E.C. (EL AMATE-COSOLAPA)-LA MARGARITA-LA TABAQUERA DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000	01/06/2010	15/12/2018	228.02	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 1+800 AL KM. 3+300	28.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400004	0
66	SAN PEDRO YOLOX - SAN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000	15/03/2012	15/12/2018	227.87		21.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400005	0
67	SANTIAGO NARANJAS - LAZARO CARDENAS - SANTA MARIA YUCUNICOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	15/04/2010	15/12/2018	224.06	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+400 AL KM. 7+160 Y TRABAJOS DE ESTRUCTURAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DEL KM. 5+500 AL KM. 6+400	25.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400024	0
68	E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO)-EL CIRUELO - SANTO DOMINGO ARMENTA	15/03/2009	15/12/2018	212.56	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+400 AL KM. 15+000	21.10	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400004	0
69	SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTIAGO IXTAYUTLA TRAMO:SANTIAGO JAMILTEPEC - SANTA ELENA COMALTEPEC - SAN JOSE DE LAS FLORES (KM. 0+000 AL KM.22+000).	15/04/2009	15/12/2018	207.33	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 17+250 AL KM. 18+450	22.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400030	0
70	ASUNCION ATOYAQUILLO - PUTLA VILLA DE GUERRERO	01/04/2010	15/12/2018	201.73		42.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096400016	0
71	E.C. KM. 179+000 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC) - SANTA MARIA ECATEPEC - SAN JUAN ACALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000	01/03/2006	15/12/2018	191.91	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+900 AL KM. 15+500	44.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400012	0
72	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - CONCEPCION PAPALO - SAN FRANCISCO CHAPULAPA - SAN ANDRES TEOTILALPAM TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 37+000	01/06/2009	15/12/2018	189.58	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 12.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 69+000 AL KM. 73+860	83.26	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400034	0
73	E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosofñama - San Juan Diquiyu	01/07/2010	31/03/2017	185.00	SUS AVANCES DEPENDEN DE APROBACIONES EMITIDAS MEDIANTE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION	37.50	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400016	0
74	SAN FELIPE TINDACO - SAN MATEO SINDIHUI	15/05/2010	15/12/2018	178.15	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL KM. 11+120 AL KM. 12+960	34.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400008	0
75	JALAPA DE DIAZ-SAN FELIPE USILA DEL KM. 0+000 AL KM. 43+000	15/03/2009	15/12/2018	172.87	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 3.5 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+000 AL KM. 9+200	43.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400012	0
76	E.C. 100+500 (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RIO	01/07/2009	15/12/2018	172.55	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+400	16.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400037	0



## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
77	E.C. (SAN MARCOS ARTEAGA-SANTO DOMINGO TONALA)-SAN JORGE NUCHITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000	15/03/2012	15/12/2018	170.44	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 4.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 26+600 AL KM. 27+100	34.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400014	0	
78	CAMINO: E.C. CORCOVADO - APANGO (CAMINO VIEJO POCHUTLA-HUATULCO)	01/06/2012	15/12/2018	169.64	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+000 AL KM. 7+700	19.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400001	0	
79	CONCEPCION BUENAVISTA-SAN ANTONIO ABAD-SAN MIGUEL ASTATLA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	15/02/2012	15/12/2018	168.90	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 6.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+220 AL KM. 5+720	14.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400015	0	
80	EL CAMARON-SAN CARLOS YAUTEPEC TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	15/07/2011	15/12/2018	157.82	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.5 MDP PARA EL SUBTRAMODEL KM. 13+900 AL KM. 18+000	18.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400005	0	
81	GUADALUPE - SAN JUAN LACHIXILA	01/03/2014	31/08/2017	155.00	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 1.2 MDP PARA PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	31.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400017	0	
82	SANTA CRUZ DE BRAVO-SANTA BARBARA-EL ZAPOTE	15/07/2010	15/12/2018	154.40	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 3.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 3+700	12.20	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400020	0	
83	SANTA MARIA YOLOTEPEC - SANTIAGO YOSONDUA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+500	15/08/2011	15/12/2018	153.06	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 10+500 AL KM. 11+660	14.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400009	0	
84	San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz	01/05/2010	31/03/2018	151.99		29.50	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400007	0	
85	SANTA MARIA COLOTEPEC - LAS CARRETAS - JUNTA DEL POTRERO - EL CAMALOTE	01/03/2012	15/12/2018	148.93	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 6.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+100	13.27	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400002	0	
86	LUNATITLAN DEL PROGRESO -TOTOLTEPEC DE GUERRERO (PUEBLA) DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	15/03/2009	15/12/2018	147.90	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+700 AL KM. 13+200	25.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400028	0	
87	LOMA BONITA -E.C. (TUXTEPEC - PALOMARES), TRAMO: KM 11+300 AL KM 35+000	15/04/2012	15/12/2018	134.32	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 9.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 29+000 AL KM. 31+000	38.00	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400035	0	
88	SANTA ROSA CAXTLAHUACA - SAN MIGUEL CUEVAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+600	15/03/2012	15/12/2018	128.44	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 6+700 AL KM. 7+800	11.60	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400012	0	
89	SANTA MARIA COLOTEPEC - LAS CARRETAS - JUNTA DEL POTRERO - EL CAMALOTE	01/08/2009	15/12/2018	124.24	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.5 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+000 AL KM. 4+100	12.70	EN PROCESO 2017- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400036	0	

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
90	E.C. (TLAXIACO-PUTLA)-AGUA ZARCA-SAN JUAN MIXTEPEC.	01/04/2016	31/12/2019	121.20	LA INVERSION AUTORIZADA EN EL PEF 2015 NO FUE LIBERADA POR FALTA DEL FOLIO DE LA SHCP EN 2016 SE HARA DEL KM 0+200 AL 1+700	23.50	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400004	0
91	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - LA CAPILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000	01/06/2010	15/12/2018	115.94	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 14+000 AL KM. 15+500	24.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096400006	0
92	LUNATITLAN DEL PROGRESO - TOTOLTEPEC DE GUERRERO - PUEBLA	01/07/2009	31/03/2018	115.26		25.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400028	0
93	LUNATITLAN DEL PROGRESO - TOTOLTEPEC DE GUERRERO - PUEBLA	01/07/2009	31/03/2018	115.26		25.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400028	0
94	Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec).	04/03/2016	31/12/2019	108.16	2016 CON EMPRESA MODERNIZACIONES, AMPLIACIONES Y PAVIMENTOS, GOLFO-CARIBE-PACIFICO SA DE CV DEL KM 2+000 AL 5+500	18.08	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400003	0
95	KM 161 E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLÁN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA	01/07/2013	31/12/2019	105.40	EL RECURSO 2016 AUTORIZADO NO SE PUEDE EJERCER DEBIDO A QUE SU REGISTRO ANTE LA SHCP ESTA VENCIDO	21.08	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400021	0
96	KM 161 E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLÁN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA	01/07/2013	31/12/2019	105.40	EL RECURSO 2016 AUTORIZADO NO SE PUEDE EJERCER DEBIDO A QUE SU REGISTRO ANTE LA SHCP ESTA VENCIDO	21.08	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400021	0
97	E.C. (YUCUDAA-TLAXIACO)-SANTIAGO NUNDICHE-SAN JUAN NUMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000	15/03/2012	15/12/2018	102.44	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 1.7 MDP PARA EL SUBTRAMO A COMPLEMENTAR DEL KM. 13+000 AL KM. 17+000	80.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400011	0
98	E.C. (TLAXIACO - CHALCATONGO) - YOSOYUA	15/03/2012	15/12/2018	95.97	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 8.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 6+200	7.60	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400003	0
99	E.C.(PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-ZACATEPEC- COYULITO-GUADALUPE NUEVO CENTRO	01/07/2013	31/12/2018	90.00		18.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400027	0
100	CAZADERO DE ARRIBA-CERRO IGUANA-SAN DIONISIO DEL MAR DEL KM. 0+000 AL KM. 23+138,	01/04/2008	15/12/2018	80.20	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 2.6 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 13+000 AL KM. 15+000	23.14	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096400003	0
101	SAN PEDRO MIXTEPEC- BAJOS DE CHILA	01/06/2012	31/12/2019	75.00		15.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096400017	0
102	OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA Y-BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSÉ LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 9+600	01/06/2014	15/12/2017	50.15	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 14.0 MDP PARA EL SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 4+500	9.60	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096400003	0
103	E.C. KM. 187 CARRETERA FEDERAL 185 TRANSISMICA (COATZACOALCOS - SALINA CRUZ)-GUIVICIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	15/02/2014	15/12/2018	38.44	EN EL PRESENTE 2015 SE APROBARON 7.0 MDP PARA EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 2+180 AL KM. 4+180	12.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400045	0
104	E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEJILLO) TINUMA DE ZARAGOZA	07/04/2016	31/12/2017	36.10	LA INVERSION AUTORIZADA EN 2015 NO FUE LIBERADA POR FALTA DE FOLIO DE LA SHCP EN 2016 SE TRABAJA DEL KM 0+000 AL 1+200	7.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15096400006	0
105	E.C. KM. 31 (AMATE-COLORADO-ZARAGOZA ITUNDUJIA)-EL LIMON-STA. ANA PROGRESO-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	15/03/2012	15/12/2017	19.18	DEBIDO A QUE HUBO RECORTES PRESUPUESTALES ENO ES POSIBLE CONCLUIR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, ADEMAS QUE EN 2016 NO FUE INCLUIDO EN EL PEF PARA SU CONCLUSIÓN POR LO QUE SE MODIFICA SU FECHA A DICIEMBRE	4.00	EN PROCESO 2017- 2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400017	0

## LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD NOVIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
106	SANTA ISABEL DE LA REFORMA - SANTIAGO IXCUINTEPEC	18/03/2014	14/12/2018	15.00	EN 2015 SE INVIERTEN 6.2 MDP PARA LA MODERNIZACION DEL KM 4+000 AL KM 7+000 Y SU CONCLUSION TOTAL DEPENDERAN DE FUTURAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	32.80	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096400016	0
107	PLATAFORMA LOGISTICA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC	01/12/2016	31/12/2018	1,556.00	N/A	PLATAFORMA	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		PNI568
108	DRAGADO DE CONSTRUCCION EN EL CANAL DE NAVEGACION,EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ.	01/01/2017	31/12/2017	335.00	SE RECALENDARIZÓ LA FECHA DE INICIO DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SHCP	MUELLE	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
109	LIBRAMIENTO MATIAS ROMERO	28/02/2017	31/12/2018	220.00	AL SER UNA OBRA PROYECTADA NO SE CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA Y SU TRAZO ES EN TERRENOS VIRGENES	6.20	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	5096400027	0
110	REFORZAMIENTO DEL MUELLE DE CONTENEDORES EN EL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA.	30/05/2018	31/12/2018	150.80	N/A	MUELLE	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
111	MODERNIZACIÓN A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA E.C. (MITLA - ENTR. TEHUANTEPEC II) - SANTIAGO QUIAVICUSAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000	01/09/2017	31/12/2018	128.37	LA INVERSION AUTORIZADA EN PEF 2015 NO SE LIBERO POR FALTA DE FOLIO DE REGISTRO DE LA SHCP DE LA MISMA MANERA EL RECURSO APROBADO 2016 FUE OBJETO DE RECORTE PRESUPUESTAL	23.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096400004	0
112	AMPLIACION DEL PATIO DE CONTENEDORES.	01/04/2019	31/12/2019	110.00	N/A	PATIO DE CONTENEDORES	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
113	CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO.	01/03/2017	01/12/2017	70.00	N/A	BODEGAS	PROYECTADAS 2016-2018	PUERTOS		0
114	PUENTE RIO CHIQUITO UBICADO EN EL CAMINO E.C. (TEHUACÁN - TELIXTLAHUACA) - SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	01/07/2017	31/12/2017	14.57	RECURSOS NO LIBERADOS POR DUPLICIDAD DE REGISTRO ANTE LA SHCP  EN 2016 OBRA CANCELADA POR NO AUTORIZARSE EL FOLIO DE LA SHCP	1 PUENTE 0.036 KM	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096400033	0
