SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BALANCE DE OBRAS 2013-2018 GUANAJUATO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

FEBRERO 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT GUANAJUATO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

3 AUTOPISTAS

44 CARRETERAS

26 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

	Obras	MDP	Km
A la fecha, la SCT invierte	75	18,867.4	5,444.7

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

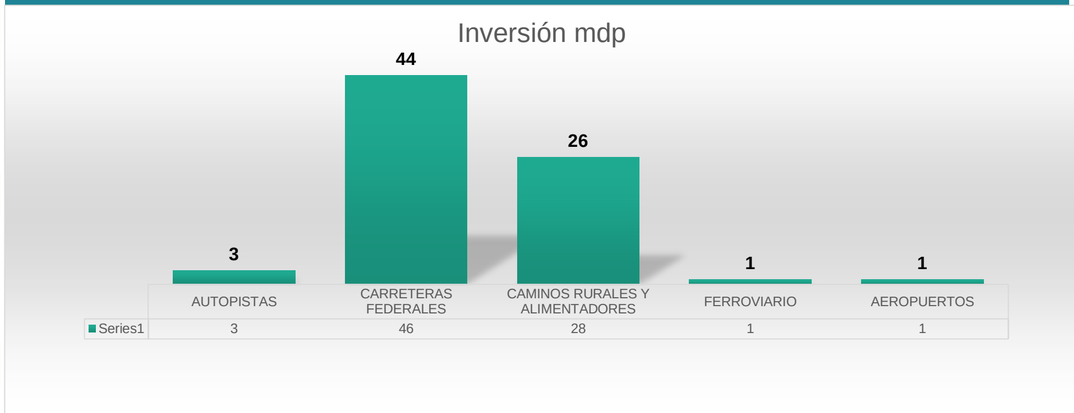

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

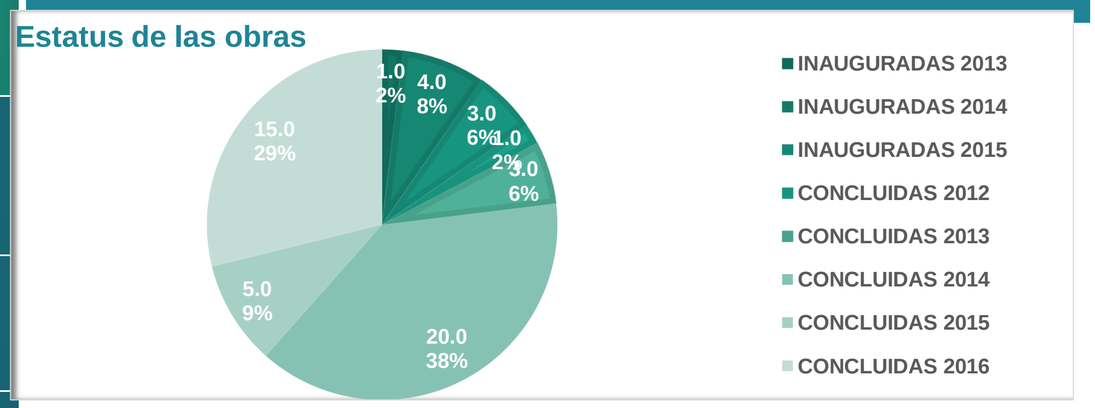

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	**3**	**7,151.80**	**202.53**	**0**
INAUGURADAS 2015	2	3,449.80	132.03	0
PROYECTADAS 2017-2019	1	3,702.00	70.50	0
CARRETERAS FEDERALES	**44**	**5,077.37**	**4,835.36**	**1**
INAUGURADAS 2013	1	237.00	1.80	0
INAUGURADAS 2014	4	461.27	22.58	1
INAUGURADAS 2015	1	130.80	0.71	0
CONCLUIDAS 2012	1	153.00	0.90	0
CONCLUIDAS 2013	3	18.29	10.91	0
CONCLUIDAS 2014	18	322.09	125.77	0
CONCLUIDAS 2015	1	148.72	0.90	0
CONCLUIDAS 2016	6	344.14	4,542.99	0
PROCESO 2017-2018	7	2,678.10	124.70	0
PROYECTADAS 2017-2018	2	583.96	4.10	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	**26**	**863.48**	**359.94**	**0**
CONCLUIDAS 2014	2	15.80	16.30	0
CONCLUIDAS 2015	4	50.80	12.09	0
CONCLUIDAS 2016	9	410.43	263.64	0
PROCESO 2017-2018	4	302.75	49.39	0
PROYECTADAS 2017-2018	7	83.70	18.52	0
FERROVIARIO	**1**	**5,620.00**	**46.00**	**1**
PROCESO 2017-2018	1	5,620.00	46.00	1
AEROPUERTOS	**1**	**154.70**	**0.88**	**0**
PROCESO 2017-2018	1	154.70	0.88	0
Total general	**75**	**18,867.35**	**5,444.71**	**2**

Programas

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	1,526,232.0	**1,526,232.0**
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	1,390,473.0	**1,390,473.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	125.0	**125.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	125.0	**125.0**

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	103.56	32.30	31.10	**166.96**
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	107	32	46	**185**
JORNALES	1,247,584	344,124	306,238	**1,897,946**
BENEFICIARIOS	22,396	9,077	8,650	**40,123**
LONGITUD	2,448.38	167,225.00	---	**169,673.38**
CAMINOS	---	---	248	**248**

MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2017	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	**2,473**	**325**	**2,798**
INMUEBLES ESCOLARES	2,583	---	---
CENTROS DE SALUD	420	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	368	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	84	---	---
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	6	---	---

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017, mediante Oficio No.: SCT.6.11.407.013/2017 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/080/2017 enviado por la DGAPDCST.

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	PUENTE IBARRILLA Y JOSE MA. MORELOS, LEON	06/07/2012	15/09/2013	237.00	INAUGURADA 27-SEP-13	1.80	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096310021	---
2	DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45	10/09/2012	20/11/2013	223.70	FORMA PARTE DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADO INAUGURADA 13-MAR-14	1.80	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12096310007	PE
3	CG-226, PAVIMENTAR 16.5 KMS., DE LA CARRETERA DE LA VALENCIANA A MINERAL DE LA LUZ	02/09/2013	31/12/2013	139.20	INAUGURADA 13-MAR-14	16.50	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12092110016	PNI123
4	PUENTE SUPERIOR VEHICULAR MALVAS	29/04/2013	31/12/2013	86.50	INAUGURADA 13-MAR-14	1.00	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12096310014	---
5	CAMINO INTERIOR A ALCOCER (SAN MIGUEL DE ALLENDE).	20/01/2014	09/04/2014	11.87	INAUGURADA 30-SEP-2014. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	3.28	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310014	---
6	AUTOPISTA SALAMANCA-LEON (TRAMO IRAPUATO LEON)	31/08/2011	18/08/2015	2,158.80	INAUGURADA 21-SEP-15 NO TIENE REGISTRO DE CARTERA. ES OBRA PRIVADA.	50.00	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS		PNI569
7	AUTOPISTA SALAMANCA-LEON (TRAMO ENTR. CERRO GORDO-ENTR. ITESI) Y TRAMO ITESI LEON	01/08/2011	01/12/2014	1,291.00	INAUGURADA 21-SEP-15 NO CUENTA CON REGISTRO DE CARTERA. ES OBRA PRIVADA.	82.03	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS		PNI569
8	PUENTE A DESNIVEL BLVD ANTONIO MADRAZO Y BLVD JOSE MARIA MORELOS	16/07/2013	31/03/2015	130.80	INAUGURADA 15-JUL-15	0.71	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096310020	---
9	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL	01/06/2015	30/09/2015	148.72	LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y LISTA PARA SER INAUGURADA	0.90	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096310022	PE
10	E.C. (SILAO-IRAPUARTO)- SANTA BARBARA-SAN ANTONIO EL RICO	23/07/2015	31/12/2015	17.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	2.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096310008	---
11	MODERNIZACION DE CARRETERA LA CAJA-EL CONEJO	13/04/2015	31/12/2015	15.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	3.66	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096310006	---
12	LA ORDEÑA-COFRADIA DE PERALTA	26/12/2015	26/12/2015	12.80	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	3.18	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096310026	---
13	CAMINO: MOGOTE DE REYES	20/07/2015	07/11/2015	6.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	2.65	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310003	---
14	CONSERVACION PERIODICA DE TRAMOS	23/05/2016	31/12/2016	141.60	N/A	141.60	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	---
15	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CORTAZAR JARAL DEL PROGRESO	21/09/2015	31/07/2016	102.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS.	15.90	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310013	---
16	CONSERVACION DE CAMINOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	24/05/2016	31/12/2016	92.25	N/A	197.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
17	RECONSTRUCCION DE TRAMOS	01/05/2016	31/12/2016	65.38	N/A	20.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110009	---
18	VALLES YURIRIA-LAGUNILLA LOS MOGOTES	19/12/2014	26/10/2016	64.56	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	12.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096310001	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
19	VALLES YURIRIA-LAGUNILLA LOS MOGOTES	19/12/2014	29/10/2016	61.56	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	12.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096310001	---
20	CONSERVACION RUTINARIA DE TRAMOS	23/05/2016	31/12/2016	57.52	N/A	1,151.39	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
21	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL , BARRERA DE PROTECCION	23/05/2016	31/12/2016	51.48	N/A	3,230.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	---
22	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA CLAVELLINAS	05/08/2015	15/03/2016	29.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	6.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310007	---
23	SANTA RITA-MEXICANOS-TRAMO: SANTA RITA-GODOY	30/01/2015	04/02/2016	24.86	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	2 PUENTES VEHICULARES	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	9096310007	---
24	E.C. (COMONFORT-SAN MIGUEL DE ALLENDE)-PALMILLAS	02/03/2015	29/01/2016	24.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	7.52	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096310016	---
25	LA MURALLA DEL CADILLAL-EL GUAJE	22/07/2014	13/02/2016	22.46	N/A	4.73	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310005	---
26	E.C.(OCAMPO SAN FELIPE) LA CALAVERA TR. KM 1+500 KM 3+440	22/09/2015	18/02/2016	7.40	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	3.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096310022	---
27	CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA	24/08/2016	21/11/2016	7.20	OBRA TRANSFERIDA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN 2016 MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS TERMINADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.	3.69	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310002	---
28	CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES	23/05/2016	31/12/2016	3.30	N/A	PUENTE	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	---
29	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA INTERSECCION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. 2 DE ABRIL	01/11/2011	01/12/2012	153.00	N/A	0.90	CONCLUIDAS 2012	CARRETERAS FEDERALES	11096310022	PE
30	MARAVATIO DEL ENCINAL - SANTIAGO MARAVATIO.	23/10/2013	31/12/2013	9.90	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	5.78	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	13096310008	---
31	CUPAREO - PUERTA DEL MONTE - E.C. (SALVATIERRA - YURIRIA).	23/10/2013	31/12/2013	4.65	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	3.33	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	13096310015	---
32	JARAL DEL PROGRESO - VALLE DE SANTIAGO	23/10/2013	06/12/2013	3.74	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	1.80	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	13096310011	---
33	MODERNIZACION DEL CAMINO JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN.	17/02/2014	31/12/2014	82.00	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION.	6.00	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310022	---
34	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN APASEO EL GRANDE.	14/01/2014	29/04/2014	35.00	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	3.83	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310017	---
35	ABASOLO - MARITAS.	11/11/2013	15/03/2014	26.90	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	16.30	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310010	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
36	SAN NICOLAS - E.C. (LA LOMA - VICTORIA DE CORTAZAR).	11/11/2013	21/02/2014	18.16	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	9.60	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310019	---
37	APASEO EL ALTO-JERECUARO.	25/10/2013	31/01/2014	17.50	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	10.04	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310002	---
38	RAMAL A CERANO.	02/11/2013	10/01/2014	17.10	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	11.75	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310013	---
39	CORTAZAR - SALVATIERRA.	01/11/2013	09/01/2014	15.98	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	8.60	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310003	---
40	E.C. (APASEO EL ALTO-JERECUARO) - BELEN.	15/02/2014	30/09/2014	14.50	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION.	5.30	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12096310018	---
41	NUEVA ESPERANZA - GALERA DE LA GRULLA.	15/03/2014	31/08/2014	11.89	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION.	3.61	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	12096310017	---
42	PENJAMO - EL VARAL.	25/10/2013	15/02/2014	11.40	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	4.80	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310005	---
43	LABOR DE VALTIERRA - PUEBLO NUEVO.	02/11/2013	10/01/2014	11.38	CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	9.50	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310007	---
44	CHUPADERO.MESAS DE JESUS-EL REALITO SAN LUIS DE LA PAZ-CHUPADERO	01/11/2013	31/01/2014	10.80	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	15.00	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096310003	---
45	SAN LUIS DE LA PAZ - CHUPADEROS.	01/11/2013	31/01/2014	10.49	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	8.50	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310012	---
46	JARAL DEL PROGRESO - ROSA DE CASTILLA - VALLE DE SANTIAGO.	23/10/2013	28/01/2014	10.09	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	5.10	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310001	---
47	IRAPUATO - SAN CRISTOBAL - RANCHO NUEVO DE LA CRUZ.	01/11/2013	15/02/2014	9.50	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	6.04	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310004	---
48	HUANIMARO - E.C. (IRAPUATO - ABASOLO).	23/10/2013	21/02/2014	9.49	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	6.00	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310006	---
49	RAMAL A JOYA DE CALVILLO	28/11/2013	10/02/2014	7.60	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	4.10	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310018	---
50	RAMAL A LOMA DE FLORES.	13/12/2013	28/02/2014	7.41	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION. CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.	3.90	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310009	---
51	TARIMORO - E.C. (ACAMBARO - CELAYA).	28/11/2013	15/01/2014	5.70	CAMINO CONCLUIDO Y EN OPERACION CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	2.80	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	13096310016	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
52	CAMINO DEL CRUCERO CHICO A LA PURISIMA	20/08/2014	31/10/2014	5.00	N/A	1.30	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310009	---
53	CG-195 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA	10/06/2012	31/12/2017	5,620.00	LA OBRA ES UN COMPROMISO PRESIDENCIAL. LA OBRA EJECUTADA POR PARTE DE LA SCT SERA ENTREGADA A LAS EMPRESAS FERROMEX, SA. DE C.V. Y KANSAS CITY, S.A. DE C.V. COMO CONCESION.	46.00	PROCESO 2017-2018	FERROVIARIO	10093110008	PNI612
54	MODERNIZAR LA CARRETERA SILAO – SAN FELIPE	11/01/2016	31/08/2018	800.00	ESTA OBRA ERA COMPROMISO DE GOBIERNO CG-197, LA CUAL SE CAMBIO POR EL CG-197 AUTOPISTA SALAMANCA-LEON. POR ESTE MOTIVO ESTA INCIERTO LA INVERSION TOTAL Y LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	63.40	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096310017	PNI493
55	VIA RAPIDA BICENTENARIO EN LEON	19/06/2014	31/03/2017	650.00	N/A	1.20	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096310021	PE
56	MODERNIZACION SDU-E.C SAN LUIS DE LA PAZ-DOLORES HIDALGO	16/05/2011	28/02/2017	456.48	LA SEXTA EPATA INICIO LOS TRABAJOS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016.	30.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096310011	---
57	CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION - SAN FELIPE	04/03/2013	31/12/2017	338.90	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. OBRA SUSPENDIDA POR POBLEMAS AMBIENTALES.	5.50	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096310011	---
58	MODERNIZACION DOCTOR MORA-CARR. FED. 57	09/09/2013	31/12/2017	242.00	LA 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA ETAPA ESTAN CONCLUIDAS. LA 5TA ETAPA ESTA EN PROCESO DE LICITACION	21.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096310013	---
59	LA LAGUNITA-SAN JUAN DE DIOS-LOS ALAMOS	27/10/2014	28/03/2017	193.50	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	23.66	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310014	---
60	CUARTO CINTURION VIAL A IRAPUATO	20/01/2015	28/02/2017	171.82	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	2.70	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096310010	---
61	MODERNIZACION DEL AEROPUERTO BAJIO-GUANAJUATO	09/01/2017	30/06/2018	154.70	RECURSOS APROBADOS POR LA DGAC 39.1 Y POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL GAP 115 MDP	0.88	PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PNI073
62	PAVIMENTACION E.C. CARRETERA FEDERAL 57 A MINERAL DE POZOS CON UNA LONGITUD DE 9.53 KM CON UN ANCHO DE 6.0 M PARA CAMINO TIPO D ,E EN EL EDO DE GTO	05/07/2016	01/03/2017	41.60	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. ESTA OBRA SE CAMBIO AL PROGRAMA DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	9.53	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		---
63	ALDAMA-CAÑADA DE LA MUERTE-EL ENCINO	24/08/2016	21/11/2017	37.65	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS	7.50	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096310027	---
64	PENJAMO-TIERRAS NEGRAS	05/08/2016	02/03/2017	30.00	N/A	8.70	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096310025	---
65	BOULEVARD EMILIANO ZAPATA	03/03/2014	28/02/2017	18.90	N/A	0.40	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096310015	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
66	EJE SUR ORIENTE DE CELAYA	01/06/2017	31/12/2017	551.56	NO SE HAN ASIGNADO RECURSOS A ESTA OBRA	4.10	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096310012	---
67	PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL JOFRE	16/01/2017	17/04/2017	32.40	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. ASIGNACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017	1 PUENTE	PROYECTADAS 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	1609310001	---
68	BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA	19/01/2017	31/12/2017	27.50	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. SE RADICO RECURSO DE ASIGNACION EL10 DE ENERO 2017	1.08	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310016	---
69	CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE ESPEJO-SALTO ESPEJO	18/01/2017	30/08/2017	15.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS ASIGNACION DE RECURSOS AUN NO ASIGNADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO	5.04	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES		---
70	BOULEVARD EMILIANO ZAPATA	19/01/2017	31/12/2017	10.90	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS, SE RADICO EL RECURSO DE ASIGNACION EL 10 DE ENERO DE 2017	0.40	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096310015	---
71	CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, MUNICIPIO DE DOLORESHIDALGO	19/01/2017	18/05/2017	9.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE CONVENIO. EL DIA 10 DE ENERO DE 2017 SE LE DEPOSITO	5.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096310003	---
72	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD LOS RIOYOS, SOBRE EL RIO LAJA	19/01/2017	17/07/2017	9.00	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. EL 10 DE ENERO SE LE DEPOSITARON LOS RECURSOS DE ASIGNACION A GOBIERNO DEL ESTADO	1 PIV	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096310004	---
73	PAVIMENTACION EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA	19/01/2017	18/04/2017	6.80	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. ASIGNACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 10 DE ENRO DE 2017	4.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096310002	---
74	PAVIMENTACION DEL CAMINO TREJO-CERRITO PRIMERA ETAPA EN EL MPIO DE SILAO	19/01/2017	18/05/2017	5.50	OBRA DE CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS. EL 10 DE ENERO DE 2017 SE DEPOSITARON AL GOBIERNO DEL ESTADO	3.00	PROYECTADAS 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	16096310005	---
75	AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE	01/06/2017	31/12/2019	3,702.00	A LA FECHA SE ENCUENTRA AJUSTANDO EL PROYECTO, YA QUE EL TRAZO CRUZABA ZONAS INDIGENAS, POR LO QUE NO SE CUENTA CON UNA FECHA PRECISA DE INICIO	70.50	PROYECTADAS 2017-2019	AUTOPISTAS		PNI567
