SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BALANCE DE OBRAS 2013-2018 DURANGO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

FEBRERO 2017

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT DURANGO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD, FEBRERO 2017

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

1 AUTOPISTAS
11 CARRETERAS
20 CAMINOS RURALES
3 FERROVIARIO
0 PUERTOS
1 AEROPUERTOS

Programas

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

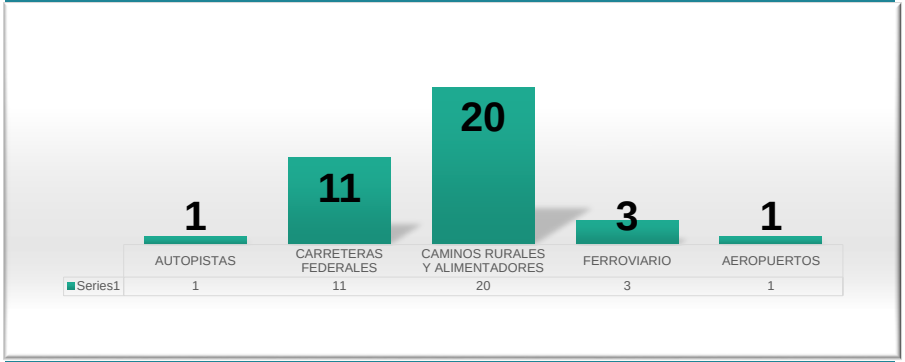

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

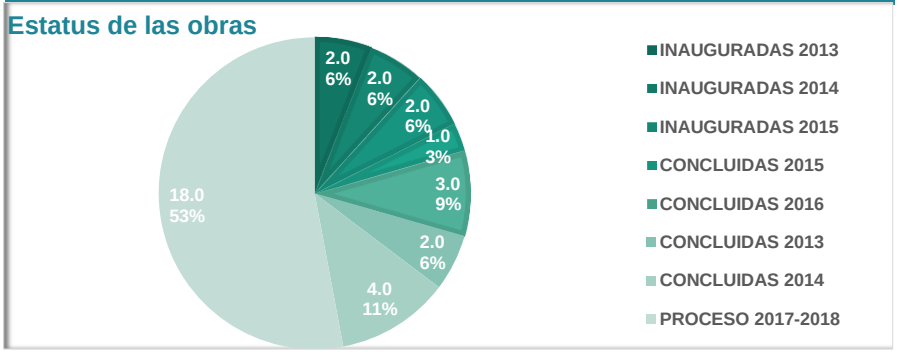

A la fecha, la SCT invierte

Obras	MDP	Km
36	42,248.0	7,052.1

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	**1**	**28600**	**230**	**0**
INAUGURADAS 2013	1	28600	230	0
CARRETERAS FEDERALES	**11**	**4611.76**	**4281.936**	**1**
INAUGURADAS 2014	1	542.6	0	0
INAUGURADAS 2015	1	150	4.5	0
CONCLUIDAS 2015	1	222.7	2048	0
CONCLUIDAS 2016	1	418.8	2048	0
CONCLUIDAS 2013	1	182.48	3.826	0
CONCLUIDAS 2014	1	1208.39	98.61	0
PROCESO 2017-2018	5	1886.79	79	1
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	**20**	**5744.49**	**2457.484**	**0**
INAUGURADAS 2013	1	1083.2	197.6	0
INAUGURADAS 2014	1	14.64	0.09	0
CONCLUIDAS 2016	1	80	125.6	0
CONCLUIDAS 2013	1	16.32	5	0
CONCLUIDAS 2014	3	464	80.81	0
PROCESO 2017-2018	13	4086.33	2048.384	0
FERROVIARIO	**3**	**3247.7**	**82.69**	**1**
INAUGURADAS 2015	1	476.8	23.69	0
CONCLUIDAS 2016	1	860.7	26.5	0
PROYECTADAS 2017-2018	1	1910.2	32.5	1
AEROPUERTOS	**1**	**44**	**0**	**0**
PROYECTADAS 2017-2018	1	44	0	0
Total general	**36**	**42,247.95**	**7,052.11**	**2**

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES	---	149,847.0	**149,847.0**
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA	---	94,184.0	**94,184.0**
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL	---	146,710.0	**146,710.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA	---	26.0	**26.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS	---	26.0	**26.0**

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	40.85	40.44	39.30	**120.59**
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	35	38	39	**39**
JORNALES	497,801	437,007	387,495	**1,322,303**
BENEFICIARIOS	13,302	11,935	12,872	**38,109**
LONGITUD	1,373.02	0.00	---	**1,373.02**
CAMINOS	---	---	185	**185**

Fecha de recepción: Miércoles, 08 de Febrero de 2017 , mediante Oficio No.: 6.9.414.010.17 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 06 de Febrero de 2017, mediante el Oficio No.6.0.1/079/2017 enviado por la DGAPDCST.

MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015-2018	TOTAL
INVERSIÓN	---	---	---
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	**1,202**	**315**	**1,517**
INMUEBLES ESCOLARES	976	---	---
CENTROS DE SALUD	102	---	---
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	97	---	---
OFICINAS DE GOBIERNO	27	---	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE DURANGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
1	AUTOPISTA DURANGO-MAZATLAN (SINALOA-DURANGO)	01/06/2001	01/10/2013	28,600.00	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION INAUGURADA 17-OCT-13 5,300 MDP CORRESPONDE A LA INVERSIÓN EJECUTADA POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN	230.00	INAUGURADAS 2013	AUTOPISTAS		PNI589
2	CARRETERA MEZQUITAL - SANTA MARIA DE HUAZAMOTA, DURANGO	01/09/2012	01/11/2013	1,083.20	INAUGURADA 02-DIC-13	197.60	INAUGURADAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	5096300003	---
3	CARRETERA CORREDOR VIAL NORTE, PUENTES GEMELOS, BULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO	06/06/2012	28/03/2014	542.60	INAUGURADA 09-JUL-14	3 estructuras y 1.74	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	8096300008	---
4	PUENTE EL ZACATE	01/09/2013	01/11/2013	14.64	INAUGURADA 30-JUL-14	0.09	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300007	---
5	CONSTRUCCION DEL NUEVO PATIO FERROVIARIO DE DURANGO	01/05/2012	01/12/2012	476.80	INAUGURADA 13-ENE-15	23.69	INAUGURADAS 2015	FERROVIARIO	11093110027	---
6	CARRETERA LIBRAMIENTO SUROESTE DE DURANGO	01/07/2012	01/10/2013	150.00	INAUGURADA 08-FEB-15	4.50	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	8096300006	---
7	TRABAJOS DE CONSERVACION 2015, EN 2048 KM DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO (25 TRAMOS)	01/03/2015	31/12/2015	222.70	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SE HAN ASIGNADO 38 CONTRATOS	2,048.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	14092110001, 14092110003, 14092110004, 14092110005	---
8	REUBICACION DE LA TERMINAL FERROVIARIA DE DURANGO Y SU INTERCONEXION CON UNA TERMINAL MULTIMODAL	01/06/2013	30/11/2016	860.70	PUESTAS EN OPERACIÓN POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO	26.50	CONCLUIDAS 2016	FERROVIARIO	11093110027	PNI441
9	TRABAJOS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE DE LA RED CARRETERA FEDERAL LIBRE EN EL ESTADO 2016, EN 2048 KM	01/03/2016	31/12/2016	418.80	POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO SE ALCONZÓ EL 100% DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS SE ALCANZÓ EL 86.3% DEL PROGRAMA ORIGINAL	2,048.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	14092110001, 14092110003, 14092110004, 14092110005	---
10	CONSERVACION RUTINARIA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	01/03/2016	15/12/2016	80.00	N/A	125.60	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	---
11	SALIDA A GOMEZ PALACIO KM 5+444 - KM 9+270	01/08/2011	01/12/2013	182.48	N/A	3.83	CONCLUIDAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096300002	---
12	EL VERGEL - LA TORREÑA	01/07/2013	01/09/2013	16.32	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2013	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096300005	---
13	AMPLIACION DE LA CARRETERA DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL	01/06/2008	01/04/2014	1,208.39	FALTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 24.0 KM, LO CUAL INCLUYE: UN LIBRAMIENTO POR LA POBLACIÓN DE “DONATO GUERRA”, DEL KM 70+000 AL KM 73+000, Y LA RECTIFICACIÓN DEL TRAZO DEL KM 79+000 AL KM 100+000, CON LO C	98.61	CONCLUIDAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11096300003; 12096300011	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE DURANGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
14	TEPEHUANES - SAN JUAN DEL NEGRO - E.C.(LOS HERRERA – TAMAZULA)	01/11/2008	01/07/2014	262.40	15 KM FUERON DAÑADOS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS PRESENTADAS EN EL 2014, TRAMO PROPUESTO PARA SER CONSIDERADO EN EL FONDEN 2015	40.59	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096300001	---
15	NAVIOS - CENTENARIO - REGOCIJO	01/06/2007	15/05/2014	170.00	DERIVADO DE LAS INTENSAS LLUVIAS PRESENTADAS TANTO EN NOVIEMBRE DE 2014 Y EN MARZO 2015 LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PRESENTA DAÑOS	40.10	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096300007	---
16	PUENTE ARANAS	01/07/2013	01/05/2014	31.60	LA OBRA PRESENTÓ DAÑOS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ PROPUESTA PARA SER CONSIDERADO EN EL FONDEN 2015	0.12	CONCLUIDAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096300016	---
17	LOS HERRERA-TAMAZULA	01/06/2007	01/12/2018	1,959.89	N/A	101.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096300002	---
18	CG-115 CONCLUIR LA MODERNIZACION DEL SEGUNDO PERIFERICO DE GOMEZ PALACIO - TORREON	01/09/2013	31/12/2017	1,150.00	N/A	54.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096300010	PNI457
19	CARRETERA DURANGO-GÓMEZ PALACIOTRAMO: CUENCAMÉ-GÓMEZ PALACIO DEL KM. 218+000 AL KM. 233+000	01/05/2011	11/12/2018	355.77	N/A	15.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096300006	PE
20	SAN JUAN DEL RÍO – PEÑÓN BLANCO	01/02/2012	31/12/2018	345.13	N/A	67.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096300002	---
21	BUENOS AIRES – EL TARAHUMAR	10/02/2012	31/12/2017	339.97	N/A	102.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300001	---
22	DURANGO-GUANACEVI, TR: J.GUADALUPE AGUILERA-STGO. PAPASQUIARO, KM. 97+000 - 107+00	01/02/2014	11/01/2018	265.82	N/A	10.00	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096300006	PE
23	GÓMEZ PALACIO – GREGORIO GARCÍA	10/02/2010	31/12/2017	243.70	N/A	17.20	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096300008	---
24	SANTO DOMINGO - PIEDRA RAJADA	10/02/2013	31/12/2017	226.55	N/A	44.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300006	---
25	EL SALTO – PUEBLO NUEVO	10/02/2006	31/12/2018	205.90	N/A	64.18	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	6096300001	---
26	CARR. SANTA MA. DEL ORO – CIÉNEGA DE ESCOBAR – GRAL. ESCOBEDO	10/02/2013	31/12/2017	186.44	N/A	38.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300004	---
27	SOMBRERETILLO EL ALTO - SAN JOSÉ DE ZARAGOZA	10/02/2013	31/12/2017	144.23	N/A	27.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300002	---

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE DURANGO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD FEBRERO DE 2017

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Término	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	Sector	Registro de Cartera	PNI Publicado
28	SAN JUAN DE GUADALUPE – LA ESCALERA	10/02/2014	31/12/2017	124.08	N/A	24.30	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096300001	---
29	EL DURAZNO – LOS FRAILES	10/02/2013	31/12/2017	122.08	N/A	28.10	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096300005	---
30	PSV GETSEMANI	01/05/2015	30/04/2017	75.20	N/A	PSV 1.3 km	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096300003	---
31	LÁZARO CÁRDENAS – 16 DE SEPTIEMBRE	10/02/2012	31/12/2017	66.86	N/A	20.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096300013	---
32	FCO. JAVIER MINA - RICARDO FLORES MAGON	01/02/2012	31/12/2017	62.10	LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE DE 2014 AÑO CAUSARON DAÑOS AL CAMINO, YA CONSTRUIDO, OBRA PROPUESTA PARA SER INCLUIDA EN EL FONDEN 2015	1,500.00	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096300004	---
33	CAMINO A GRUTAS DEL ROSARIO	10/02/2013	31/12/2017	59.40	N/A	14.40	PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096300004	---
34	ENTRONQUE EL PUEBLITO KM 4+500 (LIBRAMIENTO SUROESTE)	01/05/2015	30/04/2017	40.00	N/A	Entronque (2.4 km)	PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	08096300006	---
35	CG-116 MODERNIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO URBANO EN LA REGION LAGUNERA	03/04/2017	31/12/2017	1,910.20	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO HIZO EL COMPROMISO DE ENTREGAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU REVISIÓN EL MES DE MARZO 2017	32.50	PROYECTADAS 2017-2018	FERROVIARIO	14093110002	PNI541
36	REMODELACION AEROPUERTO DE DURANGO	01/04/2017	31/12/2018	44.00	N/A	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2017-2018	AEROPUERTOS		PE
