SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BALANCE DE OBRAS 2013-2018
QUERÉTARO

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

OCTUBRE 2016

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT QUERETARO 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

1 AUTOPISTAS

6 CARRETERAS

21 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTO

	Obras	MDP	Km
A la fecha, la SCT invierte	30	53,530.3	1,119.6

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

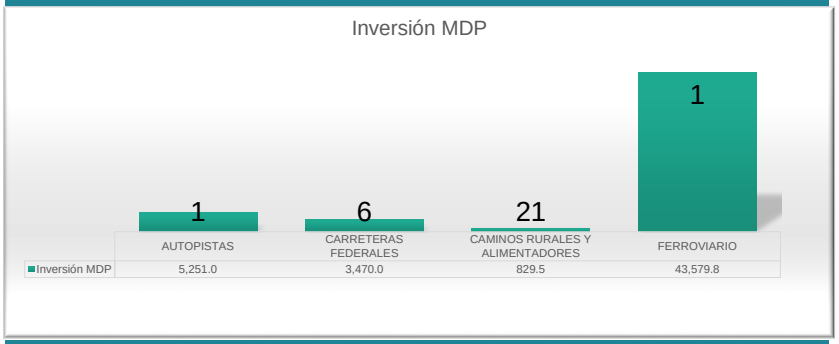

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	**1**	**5,251.00**	**86.00**	**0**
EN PROCESO 2016	1	5,251.00	86.00	0
CARRETERAS FEDERALES	**6**	**3,470.01**	**288.70**	**2**
CONCLUIDAS 2013-2014	2	306.81	6.00	0
EN PROCESO 2016	2	1,633.20	237.70	0
EN PROCESO 2017-2018	2	1,530.00	45.00	2
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	**21**	**829.49**	**534.91**	**0**
CONCLUIDAS 2013-2014	3	131.70	52.00	0
CONCLUIDAS 2015	3	146.99	349.53	0
CONCLUIDAS 2016	2	116.30	39.50	0
EN PROCESO 2016	2	139.50	29.00	0
EN PROCESO 2017-2018	9	256.00	58.20	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	39.00	6.68	0
FERROVIARIO	**1**	**43,579.78**	**210.00**	**1**
PROYECTADAS 2016-2018	1	43,579.78	210.00	1
AEROPUERTOS	**1**	**400.00**	**-**	**0**
EN PROCESO 2017-2018	1	400.00	-	0
Total general	**30**	**53,530.28**	**1,119.61**	**3**

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

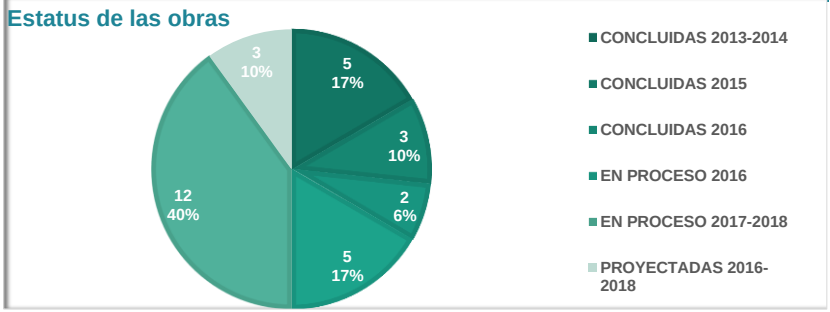

Programas

AVANCE EN PROGRAMAS

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		151,288.0	**151,288.0**
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL		146,280.0	**146,280.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		18.0	**18.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		18.0	**18.0**

MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	**928**			**928**
INMUEBLES ESCOLARES	732			732
CENTROS DE SALUD	60			60
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	88			88
OFICINAS DE GOBIERNO	42			42
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	6			6

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	26.30	26.78	21.70	**74.78**
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	16	17	18	**18**
JORNALES	309,535	296,581	220,976	**827,092**
BENEFICIARIOS	4,494	4,744	3,348	**12,586**
LONGITUD	700.00	59.00		**759.00**
CAMINOS			203	**203**

Fecha de recepción: Martes, 4 de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: C.SCT.721.600.0047/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/517/2016 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	TEQUISQUIAPAN, EZEQUIEL MONTES	17/02/2014	18/10/2014	201.41	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	9096420007	--
2	COLON - FUENTEÑO	16/04/2009	15/12/2014	106.30	ES UNA OBRA DE RELEVANCIA POR TRATARSE DE UN CAMINO RURAL MODERNIZADO CUMPLIENDO ASI EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AL MEJORAR EL ESTADO FISICO DE LA RED RURAL NACIONAL	41.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096420006	--
3	DEPRIMIDO EN PASEO DE LA REPUBLICA KM 12+300	01/12/2011	01/01/2013	105.40	OBRA QUE INICIO ANTES DE LA PRESENTE ADMINISTRACION	DISTRIBUIDOR	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	11096420006	PE
4	EZEQUIEL MONTES-EL CIERVO	01/08/2012	01/08/2013	14.00	N/A	6.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	012096420003	--
5	E.C. (SAN JUAN DEL RIO XILITLA) CHARCO FRIO	06/06/2012	31/12/2013	11.40	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420002	--
6	CAMINO EL MADROÑO-TRES LAGUNAS	01/07/2010	03/03/2015	80.90	N/A	190.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420006	--
7	JALPA-SABINO CHICO.	16/07/2011	30/06/2015	58.40	N/A	157.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096420001	--
8	ACCESO A LA RINCONADA	01/04/2014	03/02/2015	7.69	N/A	2.53	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096420009	--
9	TOLIMAN - PEÑAMILLER	01/09/2004	12/09/2016	107.30	LAS OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	37.00	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	05096420011	--
10	TILACO - OTATES.	18/06/2015	29/04/2016	9.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	2.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	13096420007	--
11	LIBRAMIENTO PALMILLAS – APASEO EL GRANDE	03/06/2013	01/12/2016	5,251.00	O. CONCESIONADA-POR LAS MODIFICACIONES QUE HA TENIDO EL PROYECTO Y LOS PROBLEMAS DEL D.V., LA CONCESIONARIA SOLICITO AMPLIACION DE TERMINACION AL 2017.-NO TIENE REGISTRO EN LA SHCP	86.00	EN PROCESO 2016	AUTOPISTAS		PNI604
12	PORTEZUELO - PALMILLAS (ESTADOS HIDALGO-QUERETARO)	27/09/2010	31/12/2016	1,017.10	OBRA INTERESTATAL, QUERETARO/HIDALGO, LA INVERCION PARA QRO. ES DE 360 MDP Y 657 MDP. PARA HGO.	42.70	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	8096330030	PNI438
13	EZEQUIEL MONTES - CADEREYTA	30/06/2013	31/12/2016	616.10	EL MONTO DE LA INVERCION SE TOMO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	195.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	9096420007	PE
14	E.C. (AMEALCO SANTIAGO MEXQUITITLAN) SAN ILDEFONSO TULTEPEC.	10/09/2013	31/10/2016	94.50	LAS OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	22.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	11096420005	--
15	CAMARGO - RÍO BLANCO	04/07/2015	31/12/2016	45.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION 2015. EL EJERCIDO REPRESENTA RECURSOS RADICADOS A GOBIERNO DEL ESTADO. EL EJERCIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO ES 13.23 MDP	7.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	06096420001	--
16	CG-092, AMPLIAR EL PASEO DE LA REPUBLICA, TRAMO: JURIQUILLA-DESVIACION SAN MIGUEL DE ALLENDE.	01/08/2013	01/12/2017	900.00	DERIVADO DE LOS RECORTES AL PRESUPUESTO SE TIENE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MISMO EN TIEMPO Y MONTO. EL REG. SE ESTA ACTUALIZANDO EN LA SHCP, ATRAVES DE LA DGC	15.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13092100004	PNI414
17	CG-091 AMPLIAR LA CARRETERA ESTATAL NO. 100 A LA SIERRA GORDA	07/06/2013	01/07/2017	630.00	N/A	30.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096420007	PNI336

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
18	AMPLIACION DE AEROPUERTO DE QUERETARO	01/09/2014	01/09/2018	400.00	CON INFORMACION POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE FUTURO PROYECTO, LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL, NO ABRA PARTIDA QUE LO CONSIDERE	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS		PE
19	LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE RUTA EZEQUIEL MONTES	16/11/2015	31/12/2017	75.00	LAS OBRAS EN PROCESO Y PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	10.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420004	--
20	CASA BLANCA- EL HERRERO - PRESITA DE SAN ANTONIO-CHARAPE DE LA JOYA.	31/12/2015	31/12/2017	40.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	12.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420006	--
21	AGUA ZARCA - LA PEÑA.	31/12/2015	31/12/2017	27.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	5.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420005	--
22	AHUACATLÁN - SANTA ÁGUEDA.	31/12/2015	31/12/2017	25.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	5.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420010	--
23	APARTADERO-ÁLAMOS-SAN JOSÉ CARRIZAL-LLANOS DE SANTA CLARA, SAN JOAQUÍN	01/10/2015	31/12/2017	21.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2017 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	6.50	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	09096420005	--
24	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE 185+800 SAN JUAN DEL RIO -XILITLA – MADROÑO	31/12/2015	31/12/2017	20.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO	5.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420002	--
25	SAN JOAQUÍN - SAN CRISTÓBAL.	16/11/2015	31/12/2017	18.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION 2015. EL EJERCIDO REPRESENTA RECURSOS RADICADOS A GOBIERNO DEL ESTADO. EL EJERCIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO ES $0.00	5.20	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420006	--
26	TILACO - SANTA INÉS.	18/06/2015	31/12/2017	15.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION 2015. EL EJERCIDO REPRESENTA RECURSOS RADICADOS A GOBIERNO DEL ESTADO. EL EJERCIDO POR GOBIERNO DEL ESTADO ES 4.39 MDP	4.50	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420001	--
27	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO BOXASNÍ - LA NUEVA UNIDAD.	13/07/2015	31/12/2017	15.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS EN PROCESO QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016 SE MODIFICARON AL 2017 POR NO SALIRT EN EL PEF 2016	5.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096420007	--
28	CG-094 APOYAR EL PROYECTO DE TREN RAPIDO QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO	01/01/2018	01/12/2018	43,579.78	EL VIERNES 30 DE ENERO DE 2015, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, ANUNCIÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE UNA REDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL QUEDABA SUSPENDIDO DE FORMA INDEFINIDA.	210.00	PROYECTADAS 2016-2018	FERROVIARIO	13093110002	PNI716
29	ZAPOTE-HIGUERILLAS	30/12/2016	31/12/2018	30.00	OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO LAS OBRAS PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016, SE MODIFICARON AL AÑO 2018 POR NO SALIR EN EL PEF 2016	6.50	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096420004	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominacion	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversion Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
30	PUENTE VEHICULAR: CARRIZAL.	31/12/2016	31/12/2017	9.00	"OBRA EN CONVENIO DE REASIGNACION DE INVERSION CON GOBIERNO DEL ESTADO. LAS OBRAS PROYECTADAS QUE SE PROGRAMARON PARA TERMINAR EN 2016 SE MODIFICARON AL 2017 POR NO SALIRT EN EL PEF 2016	0.18	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096420001	--
