SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BALANCE DE OBRAS 2013-2018 COAHUILA

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

OCTUBRE 2016

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT COAHUILA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

1 AUTOPISTAS

20 CARRETERAS

14 CAMINOS RURALES

0 FERROVIARIO

0 PUERTOS

1 AEROPUERTOS

	Obras	MDP	Km
A la fecha, la SCT invierte	36	7,801.5	1,646.7

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

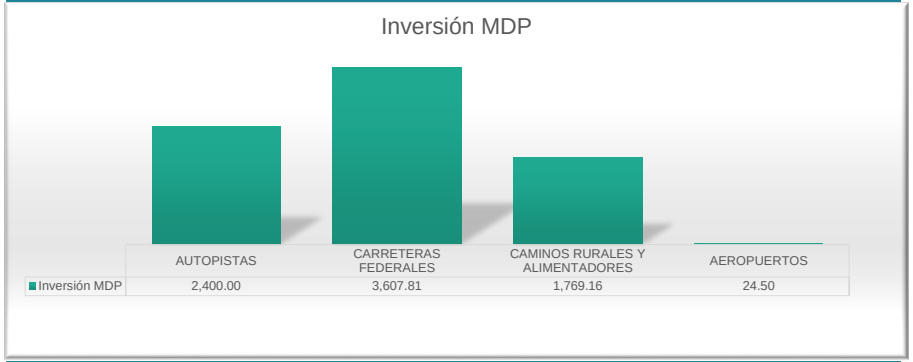

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

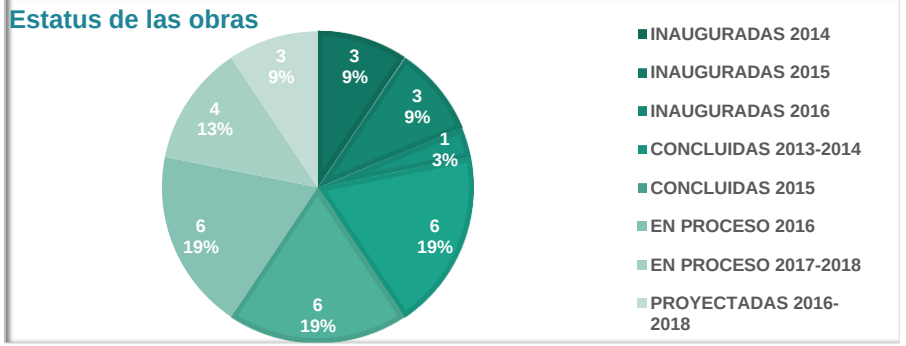

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	**1**	**2,400.00**	**40.70**	**0**
INAUGURADAS 2014	1	2,400.00	40.70	0
CARRETERAS FEDERALES	**20**	**3,607.81**	**876.51**	**3**
INAUGURADAS 2014	1	7.40	0.33	0
INAUGURADAS 2015	3	883.30	218.70	3
CONCLUIDAS 2013-2014	2	1,198.30	128.67	0
CONCLUIDAS 2015	4	106.71	40.10	0
EN PROCESO 2016	5	1,016.92	441.21	0
EN PROCESO 2017-2018	1	88.30	6.30	0
PROYECTADAS 2016-2018	1	180.00	-	0
CONCLUIDAS 2016	3	126.88	41.20	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	**14**	**1,769.16**	**729.46**	**0**
INAUGURADAS 2014	1	42.79	15.80	0
INAUGURADAS 2016	1	105.90	48.00	0
CONCLUIDAS 2013-2014	4	236.48	106.76	0
CONCLUIDAS 2015	2	420.30	407.20	0
EN PROCESO 2016	1	297.48	71.50	0
EN PROCESO 2017-2018	2	312.80	23.00	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	243.32	43.20	0
CONCLUIDAS 2016	1	110.09	14.00	0
AEROPUERTOS	**1**	**24.50**	**-**	**0**
EN PROCESO 2017-2018	1	24.50	-	0
Total general	**36**	**7,801.47**	**1,646.67**	**3**

AVANCE EN PROGRAMAS

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		142,871.0	**142,871.0**
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		137,506.0	**137,506.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		36.0	**36.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		36.0	**36.0**

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	38.69	99.40	36.22	**174.31**
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	22	26	23	**26**
JORNALES	479,522	634,001	357,213	**1,470,736**
BENEFICIARIOS	7,924	12,222	5,285	**25,431**
LONGITUD	1,043.16	1,009.00		**2,052.16**
CAMINOS			142	**142**

MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	**1,453**			**1453**
INMUEBLES ESCOLARES	1,274			1274
CENTROS DE SALUD	100			100
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	40			40
OFICINAS DE GOBIERNO	36			36
CENTROS DE INVESTIGACION	3			3

Fecha de recepción: Martes, 4 de octubre de 2016 , mediante Oficio No.: 6.5.- 1315/2016 enviado por el CSCT.

Solicitado para el Lunes, 3 de de octubre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/503/2016 enviado por la DGAPDCST

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA	01/03/2012	01/10/2014	2,400.00	INAUGURADA 17-OCT-14. BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS MATAMOROS, TORREON, GOMEZ PALACIO	40.70	INAUGURADAS 2014	AUTOPISTAS	N/A	PNI476
2	PAVIMENTACIÓN CAMINO AURA -PIRINEOS	01/09/2010	01/08/2013	42.79	INAUGURADA 26-ABR-14	15.80	INAUGURADAS 2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096250010	--
3	PUENTE "SACRAMENTO"	01/07/2009	01/10/2013	7.40	INAUGURADA 26-ABR-14	0.33	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	06096250001	--
4	CG-186, MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO -CUATROCIENEGAS.	01/09/2011	01/12/2014	575.90	INAUGURADA 19-FEB-15 CG-186: 2013 CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO 102 KM ADICIONAL AL CG. 2011: 9.1 KM, 2012: 16 KM, 2013: 16 KM, 2014: 46 KM. INV TOTAL 768.9. ESTA OBRA SE LIGA CON EL ID OB_SCT_01612	189.10	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11096250001	PNI153
5	CG-055 CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR ABASOLO - LA FRAGUA- PERIFERICO LEA	20/08/2013	17/02/2015	200.00	INAUGURADA 19-FEB-15	PUENTE	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	13096250004	PNI231
6	CG-187, MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO SAN BUENAVENTURA – HERMANAS	01/08/2013	31/12/2014	107.40	INAUGURADA 19-FEB-15. MUNICIPIOS: ESCOBEDO Y ABASOLO. ESTA OBRA SE LIGA CON EL ID OB_SCT_01613	29.60	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	1309625003	PNI087
7	AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ANTIGUO GENERAL CEPEDA-PALMA GORDA.	01/09/2010	10/02/2015	105.90	MUNICIPIOS: GENERAL CEPEDA Y SALTILLO INAUGURADA POR EL DIRECTOR GENERAL EL 30 DE MARZO DE 2016	48.00	INAUGURADAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096250008	--
8	CARRETERA PIEDRAS NEGRAS - CIUDAD ACUÑA	01/05/2009	01/12/2012	720.50	MUNICIPIOS: PIEDRAS NEGRAS Y JIMÉNEZ	77.40	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	07096250009	--
9	MODERNIZACIÓN SALTILLO-TORREON.	01/07/2009	01/10/2013	477.80		51.27	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	09096250006	PE
10	AMPLIACION Y PAVIMENTACION CARRETERA ALIMENTADORA: VIESCA - AHUICHILA	01/01/2009	01/08/2013	68.28	N/A	37.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12092100003	--
11	MODERNIZACION MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: EJIDO HEDIONDA GRANDE	01/09/2010	01/12/2013	62.20	N/A	27.34	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	01009625007	--
12	MODERNIZACION CAMINO RURAL: VIZCAYA - TACUBAYA	01/09/2010	01/09/2013	57.50	N/A	23.42	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096250013	--
13	MODERNIZACION CAMINO RURAL: RAMAL A LA VENTANA	01/05/2009	01/09/2013	48.50	N/A	19.00	CONCLUIDAS 2013-2014	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096250003	--
14	AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN NUEVA ROSITA MUZQUIZ- OJINAGA	01/01/2009	17/12/2015	353.00	ESTA ES UNA CARRETERA INTERESTATAL DENOMINADA TAMBIÉN EJE INTERESTATAL COAHUILA – CHIHUAHUA FRONTERIZA DEL NORTE	279.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	08096250004	--
15	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	23/03/2015	02/11/2015	67.30	MUNICIPIOS: SALTILLO, GRAL CEPEDA, ARTEAGA, TORREÓN, VIESCA,RAMOS ARIZPE, CANDELA	127.60	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
16	RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO TRAMO MONCLOVA-PIEDRAS NEGRAS	01/06/2015	31/10/2015	40.45	N/A	15.20	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	CC14092110003	--
17	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN LA CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA	12/05/2015	15/10/2015	31.89		10.40	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	CC14092110003	--
18	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN LA CARRETERA SALTILLO-TORREÓN	18/05/2015	31/10/2015	23.88		10.00	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	CC14092110003	--
19	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN LA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	12/05/2015	15/07/2015	10.49	N/A	4.50	CONCLUIDAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	CC14092110003	--
20	PAQUETE DE (10)CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	18/02/2016	31/08/2016	110.09		413.50	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	--
21	OBRA COMPLEMENTARIA AL CG-187 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA-EST HERMANAS	10/02/2016	04/08/2016	49.90	2016 INVERSIÓN 49.9 MD DEL KM 3+500 AL 7+500 (4 KM) OBRA COMPLEMENTARIA AL CG-187 OB_SCT_00032	14.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	13096250003	--
22	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN CARRETERA Y TRAMO MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS	15/02/2016	04/08/2016	40.88		15.20	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
23	CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN CARRETERA Y TRAMO TORREÓN SAN PEDRO KM 22+000 AL KM 34+000	15/02/2016	31/08/2016	36.10		12.00	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
24	OBRA COMPLEMENTARIA AL CG 186 MODERNIZACIÓN CARRETERA SAN PEDRO-CUATRO CIÉNEGAS	10/06/2015	31/12/2016	840.70	2015 130.7 MDP, DEL KM 164-177 LONG. 13KM NOTA:10/02/2016 SE INICIO DEL KM 145-164 LONG. 19KM. POR LICITAR DEL KM 145 AL 82 LONG. 63KM. TOTAL 82.1KM. ASIG. 710 MDP.ESTA OBRA SE LIGA CON OB_SCT_00031	95.10	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	11096250001	--
25	MODERNIZACIÓN CAMINO RURAL VIESCA - PARRAS	01/12/2013	01/11/2016	297.48	(2010, 16.22 MDP, 5.7 KM);(2011, 30.64 MDP, 10.3 KM);(2012, 39.90 MDP, 11.5 KM);(2013, 52.94 MDP, 20 KM);(2014, 83.86 MDP, 24 KM);(2015, 33.92 MDP, 3 ESTRUCTURAS);(2016, 40 MDP, 3 ESTRUCTURAS)	71.50	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096250014	--
26	PAQUETE DE (27) CONSERVACIONES RUTINARIAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO	15/02/2016	30/11/2016	135.73	8 CONTRATOS DE SUMINI Y COLOCA DE SEÑALAMIENTO DEL 2016-05-CB-A-001-W-00-2016 AL 2016-05-CB-A-008-W-00-2016.CONS RUTINA LONG TOTAL: 313.66 KMS. CORREDOR CARRETERO 1 CONTR DE SEÑAL SID-15 TIPO PUENTE	313.66	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	--
27	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "PASO SUPERIOR TORREÓN"(VILLA FLORIDA)	23/09/2016	21/12/2016	27.66		PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	16092110002	--
28	RIEGO DE SELLO EN LA CARRETERA Y TRAMO SALTILLO-TORREON	26/09/2016	20/12/2016	9.99		32.45	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	--
29	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES EN CORREDOR FEDERAL	15/02/2016	30/11/2016	2.84		349 PUENTES	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	--

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD OCTUBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
30	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO LA PEÑA BOQUILLAS DEL CARMEN	01/09/2015	01/01/2017	260.00	CONVENIO DE REASIGNACIÓN A GOBIERNO DEL ESTADO. A LA FECHA NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DEL GOB. DEL EDO. SOBRE EL ESTATUS Y AVANCE FÍSICO QUE GUARDE LA OBRA.	18.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096250003	--
31	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS – SALTILLO	28/07/2015	01/01/2017	88.30	NOTA. TOTAL EJERCIDO A LA FECHA 31.4. NOTA: SE AÑADE NUEVO TRAMO DE 4.20 KM, 19 MDP	6.30	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	13096250007	PE
32	MODERNIZACIÓN DE CAMINO A EJIDO MORELOS.	16/07/2015	01/01/2017	52.80	CONVENIO DE REASIGNACIÓN A GOBIERNO DEL ESTADO. A LA FECHA NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DEL GOB. DEL EDO. SOBRE EL ESTATUS Y AVANCE FÍSICO QUE GUARDE LA OBRA.	5.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096250004	--
33	MODERNIZACION AEROPUERTO DE TORREON	01/08/2016	30/12/2017	24.50	INVERSIÓN PRIVADA MODERNIZACION DEL AEROPUERTO CONT DESCRIPCION DE FRANJAS DE PISTAS Y CALLES DE RODAJE (12-30), SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE PLATAFORMA DE AVIACIÓN	AEROPUERTO	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	N/A	PE
34	PSV CARRETERA SALTILLO MONTERREY	01/01/2017	01/12/2017	180.00	OBRA QUE APARECE EN EL PEF 2015, NO OBSTANTE POR FALTA DE REGISTRO NO SE LE ASIGNAN RECURSOS. NO SE CUENTA CON DOCUMENTO OFICIAL DE CANCELACIÓN..	2 PSV	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	S/CVE_00232	--
35	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL N 82 EMILIANO ZAPATA -VIESCA.	01/01/2017	31/12/2017	147.32	OBRA QUE APARECE EN EL PEF 2015, NO OBSTANTE POR FALTA DE REGISTRO NO SE LE ASIGNAN RECURSOS. NO SE CUENTA CON DOCUMENTO OFICIAL DE CANCELACIÓN..	23.20	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE_00223	--
36	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SACRAMENTO - POZUELOS.	01/01/2017	31/12/2017	96.00	OBRA QUE APARECE EN EL PEF 2015, NO OBSTANTE POR FALTA DE REGISTRO NO SE LE ASIGNAN RECURSOS. NO SE CUENTA CON DOCUMENTO OFICIAL DE CANCELACIÓN..	20.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	44010	--
