SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BALANCE DE OBRAS 2013-2018 CHIHUAHUA

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

DICIEMBRE 2016

COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS SCT
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CENTROS SCT

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT CHIHUAHUA 2013-2018

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

Infraestructura de Comunicaciones y transportes

2 AUTOPISTAS

29 CARRETERAS

34 CAMINOS RURALES

1 FERROVIARIO

0 PUERTOS

3 AEROPUERTOS

	Obras	MDP	Km
A la fecha, la SCT invierte en	69	24,900.1	8,120.6

ANÁLISIS INVERSIÓN POR SUBSECTOR

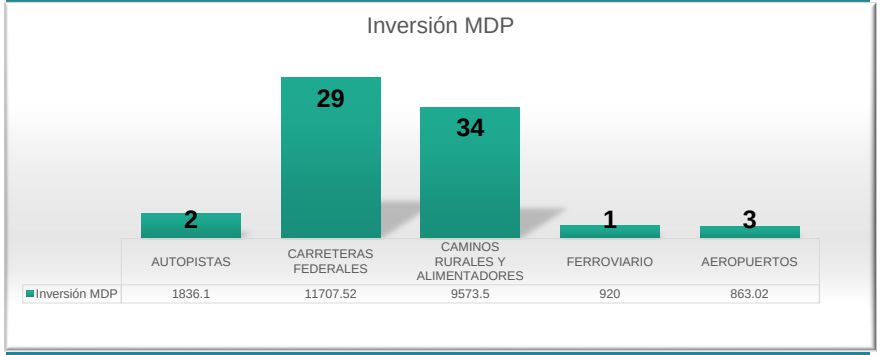

Concepto	No. Obras	Inversión total MDP	Longitud (KM)	CG
AUTOPISTAS	**2**	**1836.1**	**43.71**	**0**
INAUGURADAS 2015	1	1618	42.05	0
INAUGURADAS 2016	1	218.1	1.66	0
CARRETERAS FEDERALES	**29**	**11707.52**	**4653.009**	**0**
INAUGURADAS 2013	1	69.7	0	0
INAUGURADAS 2014	1	52.43	0.251	0
INAUGURADAS 2015	3	1524.13	26.06	0
INAUGURADAS 2016	1	817.2	22.8	0
CONCLUIDAS 2013-2014	2	565.53	83.7	0
CONCLUIDAS 2016	4	35.76	0	0
EN PROCESO 2016	4	1480.51	2658.7	0
EN PROCESO 2017-2018	7	6882.98	1842.2	0
PROYECTADAS 2016-2018	6	279.28	19.298	0
CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	**34**	**9573.5**	**3421.32**	**0**
CONCLUIDAS 2015	17	943.48	2800.24	0
CONCLUIDAS 2016	2	137.3	188.4	0
EN PROCESO 2016	1	82.45	10	0
EN PROCESO 2017-2018	11	8388.27	370.1	0
PROYECTADAS 2016-2018	3	22	52.58	0
FERROVIARIO	**1**	**920**	**0**	**0**
EN PROCESO 2017-2018	1	920	0	0
AEROPUERTOS	**3**	**863.02**	**2.6**	**0**
EN PROCESO 2017-2018	1	628.22	2.6	0
PROYECTADAS 2016-2018	2	234.8	0	0
Total general	**69**	**24900.14**	**8120.639**	**0**

ANÁLISIS ESTATUS DE LAS OBRAS

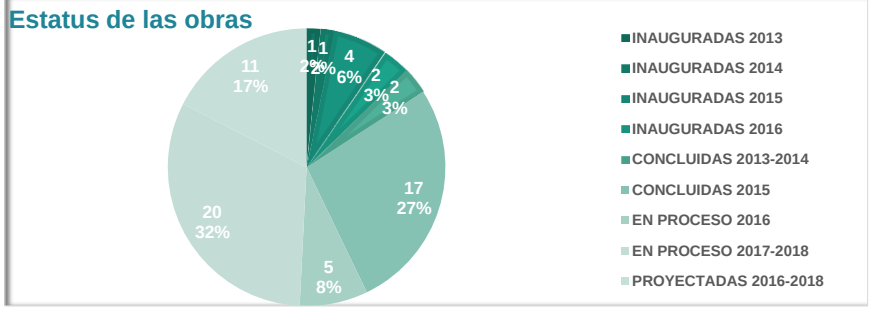

AVANCE EN PROGRAMAS

Programas

TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)	2014	2015	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES		195,035.0	**195,035.0**
NÚMERO DE BENEFICIARIOS IV ETAPA		134,460.0	**134,460.0**
TOTAL DE TELEVISIONES ENTREGADAS ACUMULADAS DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		135,882.0	**135,882.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS DONDE SE HA ENTREGADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA		50.0	**50.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN LA IV ETAPA		50.0	**50.0**
NÚMERO DE MUNICIPIOS TOTALES CONSIDERADOS		53.0	**53.0**

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSION	55.60	45.68	53.70	**154.97**
MUNICIPIOS A CARGO DE LA SCT	36	40	47	**47**
JORNALES	648,208	560,854	529,297	**1,738,359**
BENEFICIARIOS	18,320	18,190	19,020	**55,530**
LONGITUD	1,440.42	1,022.00		**2,462.42**
CAMINOS			296	**296**

MÉXICO CONECTADO

MÉXICO CONECTADO	2014	2015	2016	TOTAL
INVERSIÓN				
TOTAL DE SITIOS CONECTADOS	**1,858**			**1858**
INMUEBLES ESCOLARES	1,573			1573
BIBLIOTECAS Y OTROS SITIOS DE ACCESO COMUNITARIO	135			135
CENTROS DE SALUD	79			79
OFICINAS DE GOBIERNO	38			38
ESPACIOS PUBLICOS	30			30
CENTROS DE INVESTIGACIÓN	3			3

Fecha de recepción: lunes, 05 de diciembre de 2016 , mediante Oficio No.: SCT. 6.8.34 enviado por el CSCT.
Solicitado para el Viernes, 9 de diciembre de 2016 , mediante el Oficio No.6.0.1-/ 657 /2016 enviado por la DGAPDCST

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
1	DISTRIBUIDOR VIAL AV. RIO FLORIDO, EN CD. DELICIAS,CHIH.	01/09/2012	01/10/2013	69.70	INAUGURADA 26-SEP-13	DISTRIBUIDOR 0.95	INAUGURADAS 2013	CARRETERAS FEDERALES	11096280002	0
2	CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR EN AV. RIO CONCHOS Y CRUCE DE LA VIA MEXICO- CIUDAD JUAREZ 1,513+009	01/10/2013	01/08/2014	52.43	INAUGURADA 26-NOV-14	0.25	INAUGURADAS 2014	CARRETERAS FEDERALES	11093110018	0
3	LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA	01/08/2012	20/03/2015	1,618.00	INAUGURADA 15-ABR-15 REGISTRO	42.05	INAUGURADAS 2015	AUTOPISTAS	-	PNI500
4	NONOAVA-NOROGACHI-ROCHEACHI	01/06/2008	30/11/2014	984.80	RECURSOS CDI $446.5 LA SCT MODERNIZÓ DEL KM 0+000 AL KM 26+060, CON UNA INVERSION DE 305.3 MDP OBRA ENTREGADA POR EL C. SECRETARIO EL DIA 9 DE	26.06	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	7096280001	0
5	DISTRIBUIDOR VIAL AV. MUNICIPIO LIBRE, EN CD. JUAREZ,CHIH. (PUENTE SANDERS)	01/09/2012	01/09/2014	273.75	INAUGURADA 14-ENE-15	DISTRIBUIDOR 1.95	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	1109311015	0
6	PIV 16 DE SEPTIEMBRE	01/09/2012	01/09/2014	265.58	INAUGURADA 14-ENE-15	PIV 1.09	INAUGURADAS 2015	CARRETERAS FEDERALES	11093110013	0
7	SAMACHIQUE - BATOPILAS: TRAMO QUIRARE (KM 23+000) - KM 50+000	01/01/2007	31/12/2015	817.20	INAUGURADA EL 01 DE OCTUBRE DE 2016	22.80	INAUGURADAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	11096280004	0
8	LIBRAMIENTO DE CD. JUAREZ Y PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE/TORNILLO	01/01/2014	30/11/2015	218.10	RECURSOS PROVENIENTES DEL FONADIN INVERSIÓN ACUMULADA A 2015 $195	1.66	INAUGURADAS 2016	AUTOPISTAS	12096280024	PNI176
9	PUERTO SABINAL - BADIRAGUATO TR. PUERTO SABINAL - LOS FRAILES (LIM. EDOS. SIN- DGO-CHI)	01/09/2005	01/12/2013	544.20	N/A	83.70	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	5096280005	0
10	DISTRIBUIDOR VIAL EL GRANILLO, SAN FRANCISCO DEL ORO-E. (EL GRANILLO -SANTA BARBARA SANTA BARBARA	01/05/2012	01/05/2013	21.33	N/A	DISTRIBUIDOR	CONCLUIDAS 2013-2014	CARRETERAS FEDERALES	-	0
11	EJE INTERESTATAL CHIHUAHUA – TOPOLOBAMPO TRAMO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO KM 0+000 AL KM 34+200	01/07/2009	28/02/2015	582.30	INVERSION HASTA 2012 $293.8 INVERSION A 2014 $582.3	34.20	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	7096280002	0
12	CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y BARRERA DE PROTECCION EN 2,616.00 KM DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS	19/02/2015	31/12/2015	161.85	SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 96.9%, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL APLICADO POR LA SHCP EN EL MES DE SEPTIEMBRE	2,616.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110003	0
13	CONSERV PER TRAMOS JANOS–LIM DE EDOS. CHIH/SON, JANOS LIM DE EDOS. CHIH/SON Y RAMAL A GPE. Y CALVO	01/07/2015	31/12/2015	78.49	SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 75.9%, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL APLICADO POR LA SHCP EN EL MES DE SEPTIEMBRE	22.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110001	0
14	CONSERVACION DEL CAMINO PUERTO SABINAL - BADIRAGUATO	01/04/2015	31/12/2015	18.98	N/A	30.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
15	JUAM MATA ORTIZ – MESA DEL HURACAN, TRAMO SEÑORITA RITA – MESA DEL HURACAN	18/08/2015	31/12/2015	17.10	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL 2015. AVANCE CONFORME REPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.88	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096280015	0
16	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SISOGUICHI - PANALACHI	01/04/2015	31/12/2015	16.92	N/A	5.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
17	CAMINO EL FRESNO-LA CUADRILLA	01/04/2015	30/09/2015	9.17	OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE	3.34	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
18	BACHIMBA-CIÉNEGA DE LOS PADRES	01/05/2015	31/12/2015	8.52	N/A	3.34	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
19	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO	01/05/2015	30/09/2015	7.28	OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE	19.40	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
20	CONSERVACIÓN DEL CAMINO JUAN MATA ORTIZ - MESA DEL HURACAN	01/07/2015	31/12/2015	6.72	N/A	44.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
21	CAMINO KM. 92 CARR. A CD. JUÁREZ-EL FARO	01/04/2015	30/09/2015	6.65	OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE	3.38	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	-	0
22	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RUIZ CORTINEZ - TESEACHI	01/07/2015	31/12/2015	6.30	N/A	10.70	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
23	CAMINO LA COSTERA-FAVELA-VISTA HERMOSA	01/08/2015	31/12/2015	5.83	N/A	2.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092100002	0
24	ATENCION A PUNTO EN CONFLICTO EN EL TRAMO: SAN BUENAVENTURA - NUEVO CASAS GRANDES EN EL KM 137+500	01/07/2015	13/09/2015	5.00	OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER ADEUDO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL EN SEPTIEMBRE 2015	1 (Punto)	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110006	0
25	CONSERVACION MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE EL PUENTE EL CHARRO	01/07/2015	11/12/2015	4.96	N/A	1 (Puente)	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110005	0
26	CAMINO E.C. KM 68 PARRAL V.C. – EL TORREÓN	01/05/2015	30/09/2015	3.78	OBRA NO SUSCEPTIBLE DE INAUGURARSE POR TENER PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DE SEPTIEMBRE	5.00	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	-	0
27	CONSERVACION RUTINARIA DE 387 PUENTES DE LA RED FEDERAL DE CARRETERAS.	01/09/2015	31/12/2015	3.63	SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 94.64%, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL APLICADO POR LA SHCP EN EL MES DE SEPTIEMBRE	387 (Puentes)	CONCLUIDAS 2015	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14092110005	0
28	PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 2016	01/04/2016	30/11/2016	116.30	N/A	188.40	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100001	0
29	PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2016.	26/04/2016	31/10/2016	21.00	DENTRO DEL PROGRAM DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS, SE RECIBIO UNA AMPLIACION DE RECUROS POR LO QUE SE MODIFICA LA META Y EL AVANCE EN EL REPORTE DE SEPTIEMBRE. SE ADICIONAN 2 CONTRATOS	14 SERVICIOS	CONCLUIDAS 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	15092100002	0

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
30	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2016	11/07/2016	30/11/2016	14.30	REDUCCCION PRESUPUESTAL APLICADA POR LA SHCP POR UN MONTO DE 7.9 MDP, DEBIDO A ESTE RECORTE SOLO SE EJECUTARA EL PUENTE EL ESPIA. SE PAGARON ADEUDOS 2015 POR 5.13 MDP	PSV	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES		0
31	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES 2016	01/10/2016	30/11/2016	11.65	NINGUNA	PUENTES	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES		0
32	ATENCION PUNTO EN CONFLICTO 2016	15/09/2016	29/09/2016	4.91	EL PUNTO EN CONFLICTO UBICADO EN EL KM 93+000, TRAMO EL MORRION-COYAMITO, DE LA CARRETERA CHIHUAHUA-OJINAGA, SE ATENDERA CON RECURSOS DE OB_SCT_02345.	PUNTO DE CONFLICTO	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES		0
33	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	16/07/2016	30/11/2016	4.90	N/A	386 PUENTES	CONCLUIDAS 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110004	0
34	MODERNIZACION DE LA CARRETERA PALOMAS-PARRAL, DEL KM. 92+000 AL KM. AL KM. 180+000.	01/08/2006	31/12/2016	1,029.00	INVERSION HASTA 2012 $457.0 INVERSION HASTA 2015$687.8	22.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	6096280001	PNI188
35	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS	15/03/2016	31/12/2016	219.28	SE APLICO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LA SHCP DE 2.0 MDP	2,616.00	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110008	0
36	PROGRAMA DE CONSERVACION PERIODICA	01/04/2016	15/12/2016	203.14	AMPLIACION DE LA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE $29.78 MDP	20.70	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	15092110007	0
37	E.C. (JUAN MATA ORTIZ MESA DEL HURACÁN) - IGNACIO ZARAGOZA (EL WILLY)	24/03/2014	31/12/2016	82.45		10.00	EN PROCESO 2016	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096280001	0
38	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (2DA ETAPA) RIO OTEROS	12/05/2016	31/12/2016	29.09	$29.09 MDP PROVENIENTES DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, CDI. REDUCIÓN PRESUPUESTAL APLICADA POR $29.09 MDP. SE REVIERTE LA REDUCCION APLICADA	PUENTE	EN PROCESO 2016	CARRETERAS FEDERALES	NO APLICA	0
39	EJE INTERESTATAL: FRONTERIZA DEL NORTE; TRAMO: EL PORVENIR - OJINAGA	01/04/2011	01/12/2020	3,096.00	OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL COBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RN RL 2015	18.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096280004	0
40	NUEVO CASAS GRANDES - PUERTO PALOMAS	01/05/2009	31/12/2018	1,935.04	INVERSION HASTA 2012 $301.5 INVERSION ACUMULADA A 2015 $391.0 SE INCLUYE EN EL PNI AMPLIADO	183.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	8096280008	PE
41	CHIHUAHUA- DELICIAS	01/01/2013	31/01/2018	1,468.54	INVERSION HASTA 2012 $661.1 INVERSION HASTA 2015 $830.1	19.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	8096280004	PE
42	GUACHOCHI – BABORIGAME	01/07/2009	31/12/2022	1,289.80	OBRA INCLUIDA EN EL CUARTO CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DURANTE EL 2015 INVERSION GASTA 2012 114.9	680.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	9096280006	0
43	E.C.E. (GUACHOCHI – BALLEZA) METATITOS – TECORICHI – EL TIGRE – EL VERGEL	01/07/2013	01/12/2020	1,260.00	OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015	6.30	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096280008	0
44	ESTACION CHILICOTE – OJINAGA – EL OASIS	01/04/2010	01/12/2020	997.10	INVERSION HASTA 2012 $201.8 INVERSION HASTA 2015 $271.4 OBRA INCLUIDA EN EL PRIMER CONVENIO DE	65.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096280006	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
45	EJE INTERESTATAL: MADERA - NUEVO CASAS GRANDES, TRAMO: JUAN MATA ORTIZ – MESA DE HURACAN	01/08/2008	01/11/2018	940.00	INVERSION AL 2012 $342.3 INVERSION A 2015 $413.5	94.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096280002	PE
46	CONVIVENCIA URBANA CIUDAD JUAREZ	01/09/2012	31/12/2017	920.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA INVERSION EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANA EN JUAREZ NO SE HA APLICADO , EL PASO A DESNIVEL EN AV 16 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO CON OTRA FUENTE	4 PASOS A DESNIVEL	EN PROCESO 2017-2018	FERROVIARIO		PNI417
47	GUACHOCHI – YOQUIVO	01/09/2008	01/12/2020	825.00	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL TERCER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015	42.20	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	8096280003	0
48	BOCOYNA-SISOGUICHI - CARICHI	30/06/2009	31/12/2020	650.00	EL RECURSO AUTORIZADO EN EL PEF 2015 SERÁ USADO PARA PAGAR ADEUDOS 2014 DEL CSCT EL RECURSO AUTORIZADO PARA 2016 SE UTILIZARÁ EN EL TRAMO SISOGUICHI-CARICHI	867.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	9096280001	0
49	AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL	01/02/2011	30/06/2017	628.22	SE ACTUALIZA AVANCE GLOBAL DE LA OBRA EN EL 2016 NO SE HAN ASIGNADO RECURSOS	2.60	EN PROCESO 2017-2018	AEROPUERTOS	10096280005	0
50	CHIHUAHUA PARRALTRAMO: EST. PALOMAS - SAN FRANCISCO DE SATEVO KM 0+000 AL 48+500	01/06/2012	30/06/2017	626.70	INVERSION ACUMULADA A 2015 $330.1 INVERSION HASTA 2012 $31.4	48.50	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	11096280001	PNI287
51	LIBRAMIENTO SUR DE CUAUHTEMOC	01/04/2010	31/12/2018	552.90	PNI AMPLIADO HASTA 2012 INVERSION $146.5 INVERSION HASTA 2015 $206.9	20.00	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	9096280009	PE
52	DURANGO - PARRAL, TR. T SAN JUAN DEL RIO - MATAMOROS DEL KM 362+300 AL KM 386+960	01/03/2014	31/12/2017	360.00	INVERSION EN LA PRESENTE ADMINISTRACION $162.8	24.70	EN PROCESO 2017-2018	CARRETERAS FEDERALES	12096300011	0
53	ESCALON – ESTACION CARRILLO	01/05/2009	01/12/2018	325.50	OBRAS INCLUIDA EN EL SEGUNDO CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015 INVERSION HASTA 2012 $114.8	28.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096280005	0
54	VALERIO – SAN JOSE DEL SITIO – VALLE DEL ROSARIO	01/05/2014	01/12/2020	290.00	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA EN EL 2015	68.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	14096280001	0
55	TEMOSACHI - COCOMORACHI	01/04/2009	01/12/2018	240.00	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015 INVERSION HASTA 2012 $ 84.2	22.50	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	9096280002	0
56	CARRETERA SAN FERNANDO – HERCULES, TRAMO: SAN FERNANDO – SAN FRANCISCO	01/10/2010	31/12/2017	204.67	INVERSION HASTA 2012 $61.9 INVERSION HASTA 2015 $100.3	13.20	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	10096280004	0
57	E.C. KM. 56 (JANOS AGUA PRIETA) EL BERRENDO – LIM. INTERNACIONAL ANTELLOPE WELL, N.M.	01/09/2013	01/12/2017	120.00	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE REECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTDO DE CHIHUAHUA EN EL 2015	2.90	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096280006	0
58	EL VERGEL - LAGUNA JUANOTA.	01/07/2014	01/12/2018	90.00	ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2015	10.00	EN PROCESO 2017-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	12096280004	0

LISTADO DE OBRAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

BALANCE DE OBRAS EN LA ENTIDAD DICIEMBRE DE 2016

No.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Termino	Inversión Total	Observaciones	Longitud (KM)	Situación actual	SECTOR	Registro de Cartera	PNI PUBLICADO
59	AMPLIACION DEL AEROPUERTO CHIHUAHUA	02/01/2017	31/12/2018	216.50	LA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS DE LA CONCESIONARIA	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS	-	PNI062
60	PASO SUPERIOR VEHICULAR AV. DOSTOIEVSKI, KM. A-1621+669.11 EN CHIHUAHUA, CHIH.	15/12/2016	31/12/2017	90.00	SE CUENTA CON PROYECTO NO SE LE HAN ASIGNADO RECURSOS A LA OBRA LAS FECHAS SON ESTIMADAS	0.51	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14093110015	0
61	PASO SUPERIOR VEHICULAR LA CRUZ, KM. A-1464+165 EN LA CRUZ, CHIH	15/12/2016	31/12/2017	82.28	SE CUENTA CON PROYECTO. NO SE HA ASIGNADO RECURSOS A ESTA OBRA LAS FECHAS SON ESTIMADAS	1 PSV	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	14096280003	0
62	PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA AV. DE LAS INDUSTRIAS A-1614 + 398.91, EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	15/12/2017	31/12/2017	82.00	NO SE HA RECIBIDO LA AUTORIZACION PARA LA MULTIANUALIDAD REQUERIDA LAS FECHAS DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN SON PROYECTADAS"	0.47	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	11093110020	0
63	MODERNIZACION AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ	15/12/2017	01/09/2018	18.30	N/A	AEROPUERTO	PROYECTADAS 2016-2018	AEROPUERTOS		0
64	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN IGNACIO	15/12/2016	31/12/2016	15.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION. LA SHCP APLICO RECORTE DE 15.0 MDP	1 PUENTE	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	S/CVE/2016/22	0
65	PAVIMENTACIÓN CAMINO COYAME-SAN PEDRO LA PAZ	15/12/2016	31/12/2016	12.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE INVERSIONES. LA SCCP APLICÓ RECORTE DE 12.0 MDP	35.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/21	0
66	CAMINO COMUNIDAD LA ANGOSTURA - SAN JOAQUÍN	15/12/2016	31/12/2016	8.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA. LA SHCP APLICÓ RECORTE POR 8.0 MDP	15.58	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/18	0
67	CARRETERA LEBARON - SECCION LOS CHINOS	15/12/2016	31/12/2016	5.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE INVERSION. LA SHCP APLICÓ RECORTE POR 5.0 MDP	9.90	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	S/CVE/2016/19	0
68	CARRETERA CENTRO DE SALUD, COL. LEBARON - AEROPUERTO	15/12/2016	31/12/2016	5.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE INVERSIÓN. LA SHCP APLICÓ RECORTE POR 5.0 MDP	8.42	PROYECTADAS 2016-2018	CARRETERAS FEDERALES	S/CVE/2016/20	0
69	RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL MOLINO - LABORES (AREA AGRICOLA)	15/12/2016	31/12/2016	2.00	NO SE CUENTA CON REGISTRO EN CARTERA DE INVERSION. LA SHCP RCORTO EL RECURSO A 0.0	2.00	PROYECTADAS 2016-2018	CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	S/CVE/2016/23	0
