


PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD (PMI)

Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura

Dirección de Plan Maestro Sectorial

MODELO DEL FLUJO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMI

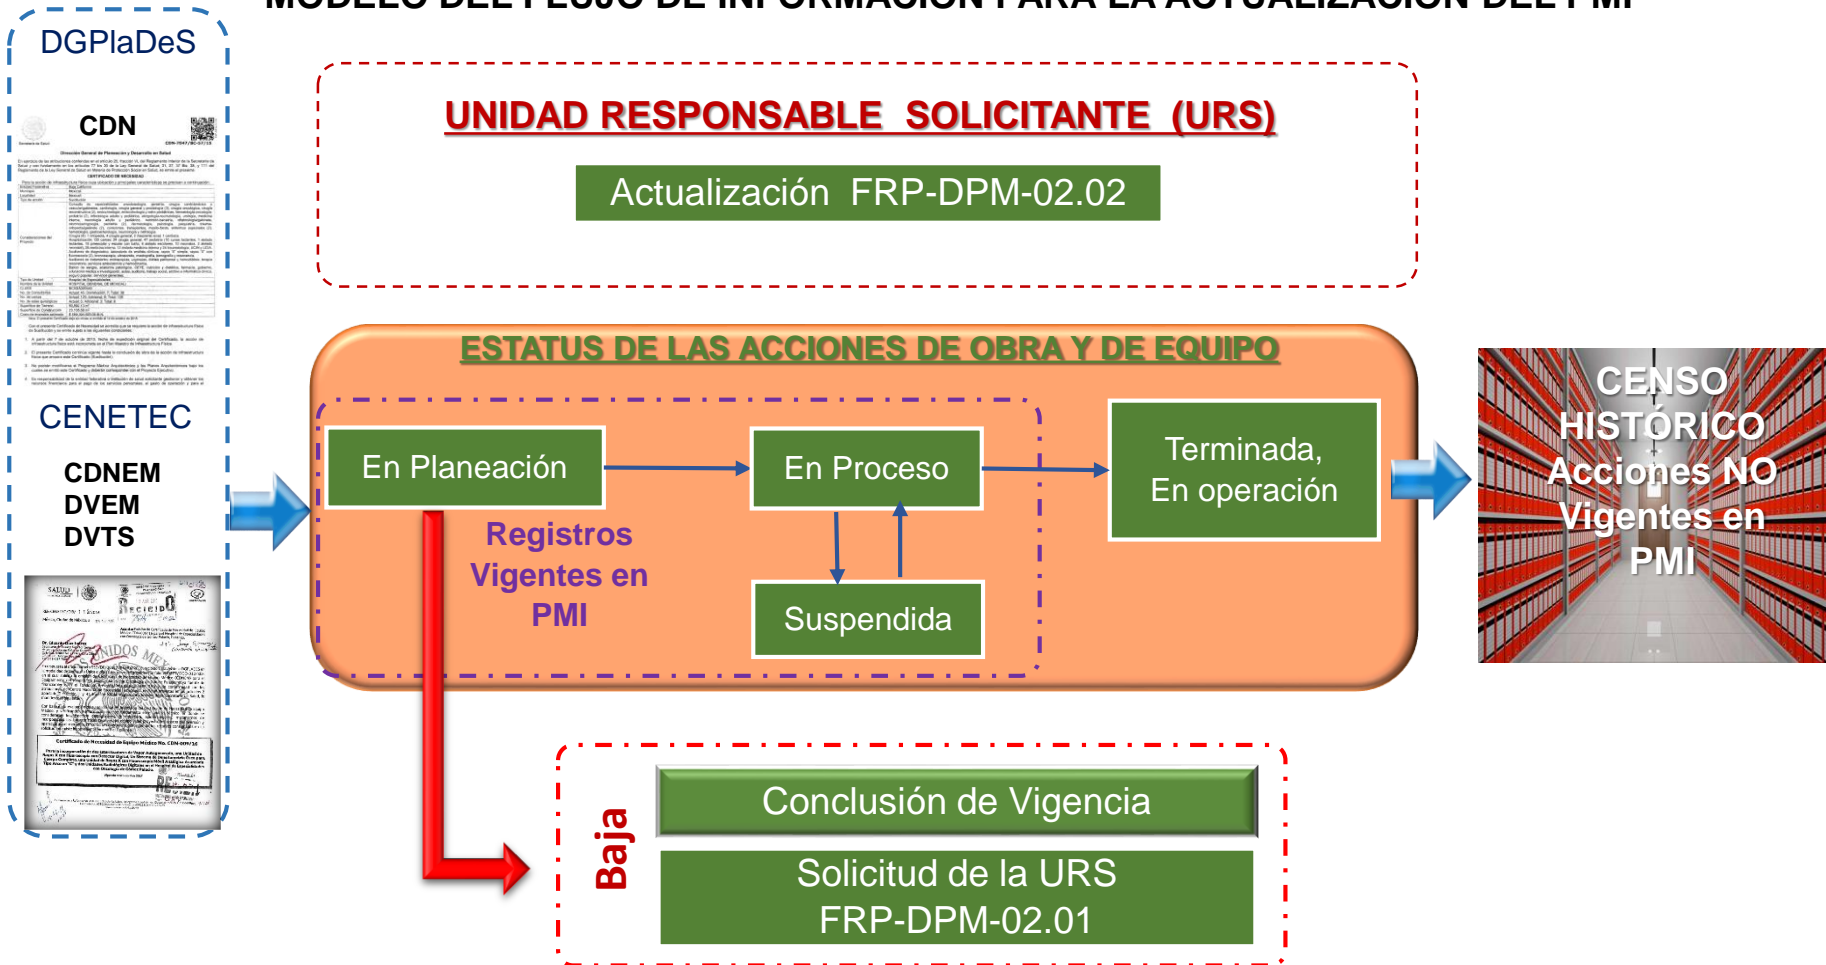

CONSULTAR PMI EN:

<https://goo.gl/pwixLd>

Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud

¿Qué es?

Es la plataforma a través de la cual, a partir de enero de 2018, las Entidades Federativas informan el seguimiento, avances o problemáticas de las acciones de infraestructura en “proceso” (en ejecución o suspendidas), con y sin registro en el PMI.

Objetivo

- Que las E.F. informen el seguimiento, avances, problemáticas, entre otros, de las acciones de infraestructura.
- Que las diferentes áreas (SIDSS, SAF, CNPSS, SSA) a nivel federal, tengan la misma información de las acciones de infraestructura en salud, reportada por los Estados.

¿Cómo funciona?


La plataforma opera en línea <https://goo.gl/wuTviM>, desarrollada por personal de la DGPLADES. Consta de 3 secciones:

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD


ETAPAS DEL SISTEMA

El Sistema comprende cuatro etapas para la actualización de la información, misma que se realiza con periodicidad mensual:

Edición





Validación



Aceptado



Observaciones

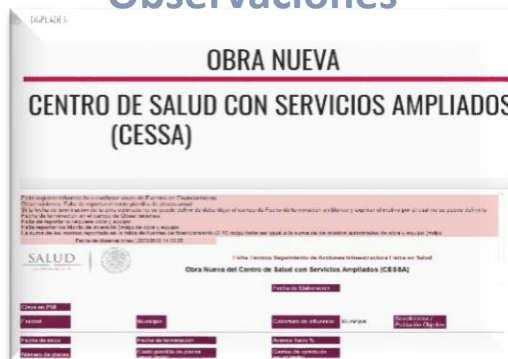

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD


ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ETAPAS/SEMANA DEL MES	4ta	1ra.	2da.	3ra.
EDICIÓN				
VALIDACIÓN				
OBSERVACIONES				
ACEPTADO				

Periodicidad: Mensual

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Ficha Técnica: Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud

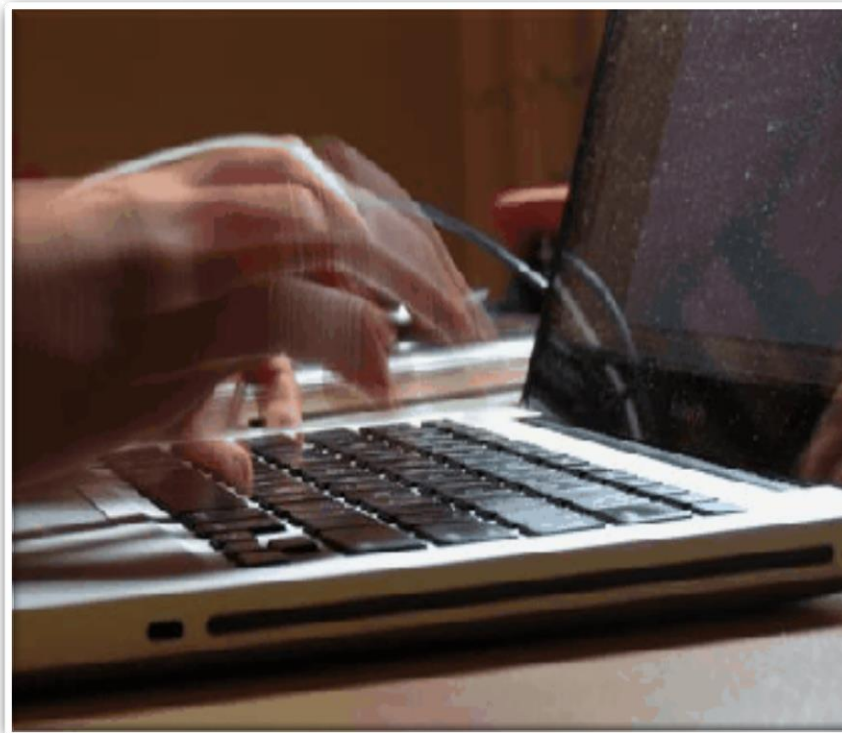

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Plana Técnica Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud
Obra Nueva del Centro de Salud Chihuahua

Fecha de Elaboración: 2/2018 14:11:01
Fecha de Validación: 4/2018 13:48:15

Clave en PAM: CDN-6669/OH-141/14
Entidad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA
Cobertura de Influencia: Municipal Beneficiarios / Población Objetivo: 36,183

Fecha de Inicio: 11/1/2017 Fecha de Terminación: 3/7/2018 Avance físico %: 4
Número de plazas: 16 Costo plantilla de plazas anual (mdp): 5.82 Gastos de operación anual (mdp): 0.67

Obra: SI Tipo de Acción: Obra Nueva Estatus de la obra: En Proceso
Monto de Inversión (mdp): 15.24 Monto de Autorizado (mdp): 15.24

Equipamiento: SI Estatus de equipamiento: En Proceso Monto de Inversión (mdp): 9.76 Monto de Autorizado (mdp): 9.76

Inversión	Monto MDP	%	Fuente de financiamiento	Descripción de la obra
Federal	25.00	100.00%	Anexo IV Seguro Popular, Cuenta Social y Aportación Solidaria Federal, ANEXO IV SEGURO POPULAR/PPP, Fondo de Previsión Presupuesta, CNPSS 2016	EL PROYECTO CONSIDERA CONSULTA EXTERNA; FARMACIA; SALA DE ESPERA; CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR (2); CONSULTORIO DE ESTOMATOLOGÍA (1); CONSULTORIO DE MEDICINA PREVENTIVA (1); AREA DE VACUNACIÓN; URGENCIAS; CURACIONES Y USOS MULTIPLES; AREA DE OBSERVACIÓN; GOBIERNO; ALA DE USOS MULTIPLES; ALMACEN; RESIDENCIA MÉDICA; ESTANCIA DE MÉDICOS Y ENFERMERAS; COCINA; RECAMARA (2); SALA DE CHOQUE; RADIOCOMUNICACIONES Y AMBULANCIAS; ESTERILIZACIÓN; ACCESOS VESTIBULO; VESTIBULO; SANITARIOS PUBLICOS HOMIBRES; SANITARIOS PUBLICOS MUJERES; SANITARIOS PARA PERSONAL NIM.
Estatal				
Municipal				
Privada				
Social				
Otro				
Total	25.00	100.00%		

Situación actual de la obra y equipamiento
LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Problemática
EL ARRANQUE DE LA OBRA ESTA RETRASADO PORQUE FALTA REMEDIACION DE LAS PLATAFORMAS EN LAS QUE SE LEVANTARA LA CONSTRUCCION.
DE PODER EJERCER EL TOTAL DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA POR LA CNPSS (\$3,191,059), SE PODRI APLICAR EN EXTRAORDINARIOS EN BENEFICIO DEL PROYECTO

Observaciones
LA OBRA NO INICIO CON LAS FECHAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO DE OBRA, YA QUE LA PLATAFORMA DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO DE SALUD NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reporte Fotográfico de avance

Reporte Fotográfico de avance

Autorizó Reporte
Nombre: ARG. JULIO CESAR BRIONES ALONSO y DRA. LAURA MARINA BUSTAMANTE CAMPOS
Cargo: SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACION Y SUBDIRECTORA DE PLANEACION

Autorizó Modificaciones
Nombre: ARG. MARIA ANDREA BARCIA GUILLEN
Cargo: SOPORTE ADMINISTRATIVO A

Responsable de Obra
Nombre: ING. JULIO MANUEL HERRERA DIAZ
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud

Datos generales



- Entidad Federativa
- Municipio
- Cobertura de influencia

Del proyecto



- Tipo de acción
- Estatus
- Avance físico
- Fecha de inicio y término
- Reporte Fotográfico
- Problemática, Observaciones

Inversión (obra, equipo)



- Monto de inversión
- Monto autorizado
- Fuentes de financiamiento

Operación




- No. de plazas
- Costo de plantilla
- Gasto de operación

SALUD | DGPLADES

ESPACIO PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE INNOVACIONES DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN MÉXICO.

Desarrollo para el seguimiento de infraestructura prioritaria en salud.

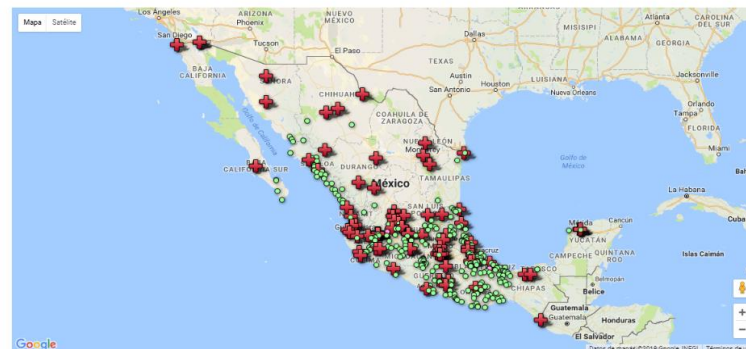

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Ficha Técnica Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud

Nombre del proyecto

Acción de
Infraestructura que la
URS pretende
desarrollar en el Estado

Fecha de elaboración

En (dd/mm/aaaa) Fecha de elaboración de la ficha técnica, cuando se envía la información para su validación.

Clave PMI

Número asignado en el CDN, CDNEM, DVEM y DVTS.

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Ficha Técnica Seguimiento de Acciones Infraestructura Fisica en Salud

Nombre del Proyecto

Entidad

Nombre del Estado solicitante

Municipio

Lugar beneficiado por la acción de Infraestructura

Cobertura de Influencia

Se expresa en la región espacial beneficiaria

Beneficiarios/ Población objetivo

Se expresa numéricamente la población que presenta la necesidad que justifica la existencia de una acción de infraestructura



SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Recursos Humanos

Número de plazas

Recursos humanos necesarios una vez concluida la acción de infraestructura y /o equipamiento

Costo plantilla de plazas anual (mdp):

Monto necesarios en un año, para el pago de la plantilla de recursos humanos en la unidad.

Gastos de operación anual (mdp)

Estimación de recursos financieros (en un año) necesarios para la operación y mantenimiento de la unidad.



SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Obra

Elegir (Si o No)

Tipo de Acción

Obra nueva, ampliación, sustitución, y Fortalecimiento

Estatus de la obra

En Planeación, Proceso, Suspendida o Terminada

Avance Físico

En (%) comparación de los metros avanzados con los del proyecto original

Fecha de Inicio

En dd/mm/aaaa Inician trabajos de obra, preparación del terreno, pago de anticipo.

Fecha de Terminación

En dd/mm/aaaa, termina la acción con la entrega de la acción de infraestructura



SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Obra

Elegir (Si o No)

Monto de inversión (mdp)

Precio del bien que se requiere para la ejecución de la acción de obra.



Monto Autorizado (mdp):

Recursos autorizados por el Ente Financiador, a través de convenio, acuerdo u otro instrumento.

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Equipamiento

Sí o No



Estatus de equipamiento

En “Planeación de la adquisición” “Proceso de adquisición”; y “Operación de Equipo médico”

Monto de inversión (mdp)

Precio de la acción de equipamiento medico


Monto de Autorizado (mdp)

Recursos autorizados por el Ente Financiador, a través de convenio, acuerdo o cualquier otro instrumento.

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Inversión	Monto MDP	%	Fuente de financiamiento	Descripción de la obra
Federal				
Estatad				
Municipal				
Privada				
Social				
Otro				
Total				



%: Porcentaje de recursos que aportan cada uno de los proveedores con respecto al monto total

Monto MDP: cantidad absoluta de financiamiento (en millones de pesos)

Inversión: Aportaciones económicas de diferentes actores, Federal, Estatal, Municipal, Privada, Social, y Otro.

**SISTEMA DE MONITOREO DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD**

Tabla


DESCRIPCION DE VARIABLES

Inversión	Monto MDP	%	Fuente de financiamiento	Descripción de la obra
Federal				
Estatad				
Municipal				
Privada				
Social				
Otro				
Total				

Total: suma de los MONTOS

Fuente de financiamiento: Nombre del financiador, programas, sistemas, ente presupuestal. etc.

Descripción de la obra: Alcances y características de la acción de infraestructura en ejecución.



SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Situación actual de la obra y equipamiento

Problemática

Observaciones

Situación actual de la obra y equipamiento:
Estatus que tiene la acción en el momento de la realización de la ficha

Problemática: Situación que retrasa acción de infraestructura.

Observaciones: Describir el motivo de retraso de acción

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



DGPLADES

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Reporte Fotográfico de avance		
 	  SECRETARÍA DE SALUD	 
Reporte Fotográfico de avance		
 	 SECRETARÍA DE SALUD 	 

Reporte Fotográfico de avance: Se pueden subir hasta 6 Fotografías que sustenta la acción (Máximo 1 MB por fotografía)



SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DESCRIPCION DE VARIABLES

Autorizó Reporte		Autorizó Modificaciones	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
		Responsable de Obra	
		Nombre:	
		Cargo:	

Autorizó Reporte: Nombre y Cargo

Responsable de Obra: Nombre y Cargo

Autorizó Modificaciones: Nombre y Cargo

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

OBSERVACIONES FRECUENTES EN LA INFORMACIÓN

La suma de los montos reportados debe ser igual a la suma de los montos autorizados de obra y equipo

Obra	Sí	Tipo de Acción	Sustitución	Estatus de la obra	Suspendida	Monto de inversión (mdp)	882.48	Monto Autorizado (mdp)	882.48
Equipamiento	Sí	Estatus de equipamiento	En Proceso	Monto de inversión (mdp)	728.66	Monto Autorizado (mdp)	728.66		

Observaciones: La suma de los montos reportado en la tabla de fuentes de financiamiento (882.48 mdp) debe ser igual a la suma de los montos autorizados de obra y equipo (882.48 y 728.66 = 1,611.14 mdp)

Inversión	Monto MDP	%	Fuente de financiamiento	Descripción de la obra
Federal	530.28	60.09%	FPP, Fondo de Previsión Presupuestal, 2012, 2013 y 2017	
Estatad	352.20	39.91%	CRÉDITO ESTADAL BANOBRAS 2015	
Municipal				
Privada				
Social				
Otro				
Total	882.48	100%		

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

OBSERVACIONES FRECUENTES EN LA INFORMACIÓN

Observaciones: La fecha de terminación reportada es el "15 de abril de 2018" que es un dato inválido porque el Estatus de la obra reportado es "Suspendida" con un avance físico del 78%, esto significa que no sea concluido la acción de infraestructura, además la Fecha de Elaboración de la Ficha Técnica Seguimiento es el "11 de abril de 2018" fecha posterior a la fecha de terminación reportada.

Fecha de observaciones: 17/4/2018 18:20:44

Ficha Técnica Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud

Incongruencia entre la Fecha de Elaboración, Fecha de Terminación, Avance Físico y Estatus de la Obra

Clave en PMI		Fecha de Elaboración	11/04/2018		
Entidad	Municipio	Cobertura de influencia	Municipal	Beneficiarios / Población Objetivo	3,717.00
Fecha de inicio	1/10/2016	Fecha de Terminación	15/04/2018	Avance Físico %	78%
Número de plazas	5	Costo plantilla de plazas anual (mdp)	0.42	Gastos de operación anual (mdp)	0.01
Obra	Sí	Tipo de Acción	Ampliación	Estatus de la Obra	Suspendida
		Monto de inversión (mdp)	0.61	Monto Autorizado (mdp)	0.61

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

OBSERVACIONES FRECUENTES EN LA INFORMACIÓN

Observaciones: Inconsistente el Avance físico % reportado de "100%", con el Estatus de la obra reportado como "Suspendida", pues esto significa que no sea a concluido la acción de infraestructura por lo cual el avance no puede ser al 100%

Fecha de observaciones: 15/3/2018 12:48:35

Ficha Técnica Seguimiento de Acciones Infraestructura Física en Salud

Incongruencia entre el Estatus de la obra y el Avance Físico

Fecha de Elaboración 27/3/2018 14:18:03

Clave en PMI					
Entidad	Municipio	Cobertura de influencia	Regional	Beneficiarios / Población Objetivo	1,072.00
Fecha de inicio	1/1/2014	Fecha de terminación	31/3/2018	Avance Físico %	100
Número de plazas	2	Costo plantilla de plazas anual (mdp)	0.65	Gastos de operación anual (mdp)	1.02
Obra	Sí	Tipo de Acción	Rehabilitación	Estatus de la Obra)	Suspendida
		Monto de inversión (mdp)	0.73	Monto Autorizado (mdp)	0.73

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

OBSERVACIONES FRECUENTES EN LA INFORMACIÓN

Observaciones: Avance físico reportado en la Ficha Técnica Seguimiento "91.5%", no puede ser menor a lo reportado anteriormente en el formato de actualización del PMI que fue del "94%"

Fecha de observaciones: 12/4/2018 12:10:10

Incongruencia entre el Avance Físico con lo reportado en el PMI

Fecha de Elaboración 6/4/2018 11:35:29

Clave en PMI				Beneficiarios / Población Objetivo	64,850.00
Entidad	Municipio	Cobertura de influencia	Municipal		
Fecha de inicio	16/12/2014	Fecha de terminación	28/2/2018	Avance Físico %	78%
Número de plazas	100	Costo plantilla de plazas anual (mdp)	31.00	Gastos de operación anual (mdp)	17.00
Obra	Sí	Tipo de Acción	Obra Nueva	Estatus de la obra	En Proceso

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

ACLARACION

El registro va a permanecer vigente hasta que las acciones de infraestructura se reporten como Estatus de Obra “Terminada” y el Equipo “En Operación”

Fecha de inicio	1/01/2008	Fecha de terminación	27/12/2016	Avance físico %	100		
Número de plazas	80	Costo plantilla de plazas anual (mdp)	30,30	Gastos de operación anual (mdp)	144,98		
Obra	Sí	Tipo de Acción	Ampliación	Estatus de la Obra	Terminada		
				Monto de inversión (mdp)	278,70	Monto Autorizado (mdp)	278,70

Equipamiento	Sí	Estatus de la Obra	Planeación	Monto de inversión (mdp)	211,90	Monto Autorizado (mdp)	0,00
--------------	----	--------------------	------------	--------------------------	--------	------------------------	------

Inversión	Monto MDP	%	Fuente de financiamiento	Descripción de la obra
Federal	224,40	80,52%	FOROSS, Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, 2208, 2009, 2010, 2014	
Estatad	54,30	19,48%	Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS) 2012, 2015, 2016	
Municipal				
Privada				
Social				
Otro				
Total	278,70	100,00%		

SISTEMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD



Liga para acceder al Sistema:

<https://goo.gl/wuTviM>

Cualidades del Sistema

- Permite el acceso al sistema en cualquier momento del día.
- La información que maneja es en tiempo real.
- Reduce el tiempo de espera para modificar información o hacer correcciones.
- Se actualiza cada 5 minutos.
- Permite obtener reportes de la información capturada.
- A su vez, se alimenta con ésta información al PMI aportando elementos para su actualización constante.

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



DGPLADES

Gracias

Act. Jorge Gómez Hernández
Jefe de Departamento de Análisis de
Información de Redes

M en C. Tomás Gabino Romero
Palacios



Conmutador:

5563928400

Extensión: 51259

**Correo para enviar y recibir
información:**

dgplades.pmi@gmail.com
