



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

LUGAR, HORA Y FECHA EN LA QUE SE LLEVA A CABO EL ACTO

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veinte de julio de 2022, se reunieron los servidores públicos y demás personas que se citan en el siguiente párrafo, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 68 de su Reglamento, atendiendo a lo señalado en el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la Administración de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del Coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021, con el Objeto llevar a cabo la notificación de fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, relativa a: "objeto del procedimiento de contratación: adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la apertura del camino E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), a nivel de terracerías, en el municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco.

Este acto es presidido por Roberto Bezares Campo, Director de Adquisiciones y Obra Pública, servidor público designado por el convocante Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien es asistido a través de medios electrónicos por Rosa Ísela Chimal Carreón, Subdirectora de Adquisiciones y Raymundo Rodríguez Gasca, adscrito a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, Tania Elizabeth Viveros Nava representante del Órgano Interno de Control, Dalía García Barrera, representante de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, José Hernández Gómez y Vladimir Ortiz Sánchez, con el carácter de representantes de la Coordinación General de Infraestructura Indígena.





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

Asisten a este acto el C. Saúl Jared Blancas López, quien representa al licitante Hidro-Casa Construcciones, S. de R.L. de C.V. y el C. Eder Joaquín Rodríguez Matus representando al Licitante Constructora Melaquias y Gallarza, S. de R.L. de C.V.

RELACIÓN DE LICITANTES

Consta en el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones de la LICITACIÓN citada al rubro, celebrada el día 18 de julio de 2022, que se recibieron las siguientes proposiciones:

No.	LICITANTES
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V.
2	PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ
3	HIDRO-CASA CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V.
4	CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.

FALLO

Ahora bien, una vez evaluadas en forma cualitativa las propuestas de la presente Licitación se determinó el fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto inició con la lectura





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

del fallo, de acuerdo al dictamen Legal-Administrativo y Técnico - Económico, que se agrega a la presente acta, como si a la letra se insertase, consistente en quince fojas, en el cual se expresan a detalle los resultados de la evaluación de las propuestas

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Base Cuarta y Quinta de la CONVOCATORIA, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por EL CONVOCANTE, fue la presentada por la empresa: **CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.**, siendo solvente, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos ofreciendo así las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad a este Instituto, por lo que se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, asignado por Compranet, atendiendo a su proposición por un monto de **\$ 28,899,335.18 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de Ejecución de los trabajos de 140 días naturales, contados a partir de 1 día natural después de la firma del contrato **DAOP-OP-002-2022**.

LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para **CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.** de notificación en forma y por ello se compromete y obliga en esta misma fecha a presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT la cual deberá estar en sentido positivo y vigente, así mismo de conformidad con la normatividad deberá presentar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y constancia vigente expedida por el INFONAVIT, en el que emita opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

patronales y entero de descuentos. Además deberá entregar el Original de la Fianza de Cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) del importe de su propuesta sin IVA y de la Fianza de anticipo por el 30 % (treinta por ciento) del importe de su propuesta con IVA, atendiendo los modelos de fianzas vigentes conforme a las Disposiciones de carácter Generales por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2022, así como lo dispuesto en los artículos 48, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 91 y 94 de su Reglamento, la cual se llevara a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de Administración y Finanzas ubicada en Avenida Revolución número 1279, Tercer Piso, Colonia Los Alpes, Código Postal 01010, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, el día 03 de agosto de 2022, e iniciar los trabajos un día natural después de la firma del contrato, los cuales tendrán una duración no mayor a 140 días naturales.

Cabe señalar que el atraso de la entrega de las garantías correspondientes, el no firmar el contrato en la fecha señalada por causas atribuidas al licitante ganador, no será motivo de Modificación o Diferimiento a la fecha de inicio o plazo de ejecución de los trabajos.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto el día de su inicio, siendo las 15:00 horas, informándose que fijará un ejemplar de esta acta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, sita en Avenida Revolución 1279, colonia Los Alpes, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a las 15:00 horas, por un plazo de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley; el cumplimiento a la disposición establecida en el segundo párrafo del artículo citado, se encuentra condicionado al momento en que el Sistema Compranet recobre la funcionalidad y permita a este convocante difundir el acta, de acuerdo al oficio identificable con números UNCP/700/TU/AD/332/2022 y OM/UPCP/079/2022, expedido por la Unidad de Normatividad de



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

Contrataciones Públicas y por la Unidad de Contrataciones Públicas, ambas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 19 de julio de 2022, por el cual se establecen los Criterios por suspensión temporal del Sistema Compranet.

Esta Acta consta de 6 fojas, 15 fojas anexas correspondientes al dictamen Técnico-Económico Legal Administrativo y 1 foja anexa consistente en captura de pantalla del aviso por la suspensión temporal del sistema Compranet, misma que fue revisada y aprobada por los servidores públicos que aparecen a continuación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de 2021, superada la Contingencia Sanitaria se procederá a recabar las firmas autógrafas de los participantes.

POR LOS LICITANTES

LICITANTES	NOMBRE	FIRMA
HIDRO-CASA CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V.	Saúl Jared Blancas López	Jared S.
CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.	Eder Joaquín Rodríguez Matus	

2022 Flores
Año de Magón
PRELISOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	
Raymundo Rodríguez Gasca	Adscrito a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública	

POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
José Hernández Gómez	Coordinación General de Infraestructura Indígena	
Vladimir Ortiz Sánchez	Coordinación General de Infraestructura Indígena	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Tania Elizabeth Viveros Nava	Profesional Ejecutivo	

POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dalia García Barrera	Jefa de Departamento	

-----FIN DE ACTA-----



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022.

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-202 y LO-047AYB001-E31-2022.


Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que motiva y fundamenta el Fallo de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-202 y LO-047AYB001-E31-2022**, relativa a: **"OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"**.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHAN.

I.I EVALUACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se obtuvieron los siguientes resultados para cada licitante:

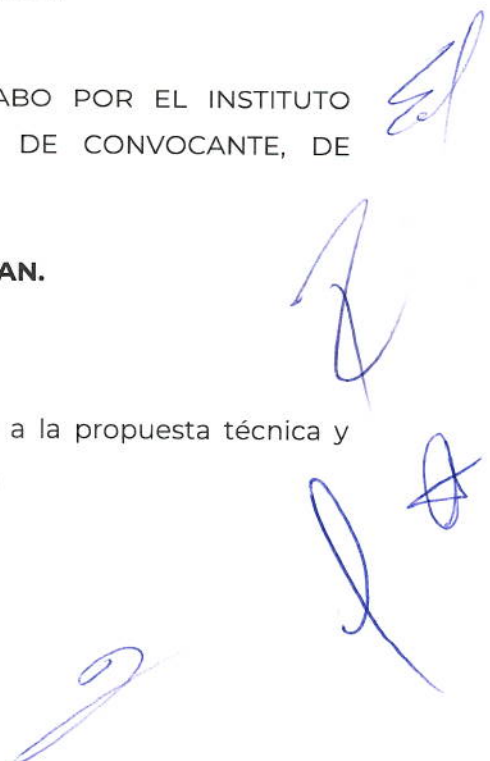

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

No.	PARTICIPANTES	RESULTADO
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. El anexo VII de la documentación distinta no se presenta; no se anexan los siguientes documentos: - manifiesto que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como su opinión vigente. - manifiesto que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS), así como su opinión vigente. - manifiesto que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales materia de aportaciones patronales (INFONAVIT), así como su opinión vigente.
2	PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ	NO CUMPLE. El anexo VII de la documentación distinta, "Constancia vigente expedida por el INFONAVIT, en el que emita opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos se presenta vencido, la fecha de su emisión es del 10 de febrero del 2022.
3	HIDRO-CASA CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V.	CUMPLE. Sin Observaciones
4	CONSTRUCTORA MELQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE. Sin Observaciones

I.2 EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA

Así mismo, del Análisis Técnico - Económico, se hacen constar los siguientes resultados:

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

No.	PARTICIPANTES	RESULTADO
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE. Los Anexos 07, 08 y 12 de la Propuesta Técnica se presentan incompletos. Los Anexos 17, 20 y 21 de la Propuesta Económica presentan inconsistencias. El Anexo 19 de la Propuesta Económica se presenta incompleto. Los Anexos 33, 37 y 38 de la Propuesta Económica no se presentan.
2	PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ	NO CUMPLE. Los Anexos 17 y 19 de la Propuesta Económica se presentan incompletos. El Anexo 26 c de la Propuesta Económica presenta inconsistencias.
3	HIDRO-CASA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	NO CUMPLE. Los Anexos 17, 21 y 22 de la Propuesta Económica presentan inconsistencias.

Conforme a lo anterior, se desechan las propuestas de las empresas en virtud de presentar las siguientes inconsistencias en el análisis detallado:

EMPRESA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V.

El Anexo 07 de la Propuesta Técnica - Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados, de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los estados financieros vigentes a la fecha de presentación de proposiciones, en los términos que establece la Base Quinta, numeral 3. (anexando para ello cédula profesional del Contador Público y su Registro ante el SAT donde se autoriza a Auditar dichos Estados Financieros) se presenta incompleto, solo presenta la declaración anual

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET


OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

2021 con su acuse, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** - **CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 08 de la Propuesta Técnica - Relación de maquinaria y/o equipo disponible, según se establece en la Base Quinta, numeral 5. FORMATO RMEC se presenta incompleto, ya que dentro del formato se enlistan todos los equipos y/o maquinaria a utilizar dentro del proceso constructivo de la obra, no se acredita la propiedad de los mismos con facturas de maquinaria y en la carta de arrendamiento que se anexa solo mencionan tres equipos que serán arrendados (Excavadora Hidráulica Cat, Tractor sobre orugas Cat y Motoniveladora), de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). - **CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 12 de la Propuesta Técnica - Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de EL INSTITUTO. Anexar croquis de ubicación de los bancos y la distancia de los acarreo, de acuerdo al FORMATO 06 se presenta incompleto, ya que no se anexa el croquis de ubicación de los bancos de materiales a utilizar dentro del proceso constructivo de la obra, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). - **CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5, **el precio unitario con la clave 1-01-001/11_010 – Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos (tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo semiárida, incluye carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada, su integración es incorrecta, ya que no considera dentro del rubro de EQUIPO Y HERRAMIENTA los equipos "Motosierra", "Tractor sobre Orugas" y/o "Cargador Frontal" para el desarrollo de los trabajos,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5, **el precio unitario con la clave 1-01-009/11_010 - Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada, su integración es incorrecta, ya que no considera dentro del rubro de EQUIPO Y HERRAMIENTA el equipo "Motoconformadora"**

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.**-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5, **el precio unitario con la clave 1-04-001/03_010 - Revestimiento con material de préstamo lateral, eliminando manualmente las partículas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada. Incluye: carga de material a unidades de transporte, su integración es incorrecta, ya que considera dentro del rubro de EQUIPO Y HERRAMIENTA el equipo "Vibrocompactador VAP 70" para el desarrollo de los trabajos y no se requiere conforme las especificaciones del proyecto,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.**-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

El Anexo 19 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO, (Anexar el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios), **se presenta incompleto, no anexa el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios solicitada en las bases de la convocatoria,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 20 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo, que se empleará en los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y/o equipos nuevos presenta inconsistencias, ya que la tasa de interés anual utilizada en el cálculo de todos los costos horarios no corresponde al indicador económico presentado en el Anexo 22 - Análisis del Financiamiento, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 22.-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 21 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, Anexar el presupuesto detallado del control de calidad (por concepto de trabajo con sus pruebas asociadas de campo y laboratorio) y el programa de actividades del control de calidad de la obra, en hoja membretada del laboratorio, debiendo reflejarse en el citado análisis, en el rubro de Servicios (en un subrubro de Laboratorio), **su integración es incorrecta ya que no se consideran montos y porcentajes para el personal**

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

técnico dentro del rubro HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, inciso d) Cuota Patronal del Seguro Social para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo, inciso e) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo e inciso f) Pasajes y Viáticos, así mismo no presenta el presupuesto detallado del control de calidad (por concepto de trabajo con sus pruebas asociadas de campo y laboratorio) y el programa de actividades del control de calidad de la obra, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 20.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 33 de la Propuesta Económica - Escrito en el cual EL LICITANTE afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) manifieste la conformidad de ceder los derechos de cobro sobre el importe líquido de las estimaciones por trabajos ejecutados del contrato con EL INSTITUTO al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) por el 2 al millar (0.2%). FORMATO LIBRE no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 37 de la Propuesta Económica - Constancia de Situación Fiscal Actualizada y Opinión Positiva del SAT (32-D) actualizada no se presentan, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO


CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

El Anexo 38 de la Propuesta Económica - Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

EMPRESA: PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, (En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos) se presenta incompleto, ya que en los conceptos marcados con las claves 1-01-013/00_030 - Acarreo con equipo PROPIO al 1er kilómetro, de cualquier material excepto roca, por unidad de obra terminada y 1-01-013/00_040 - Acarreo con equipo PROPIO, en kilómetros subsecuentes, de cualquier material excepto roca, por unidad de obra terminada, se utiliza un básico de "Acarreo de Material de Banco al 1er kilometro con unidad de medida en m³" y "Acarreo de Material de Banco de Kilometros subsecuentes con unidad de medida en m³-km" y no se anexan sus análisis de básicos o auxiliares dentro de la Propuesta Económica, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.




DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, (En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos), **el concepto marcado con la clave 1-01-011/11_010 - Relleno con material del banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada incluye: carga de material a unidades de transporte, su integración es incorrecta, ya que considera dentro del rubro MATRICES los básicos de: "Excavaciones prestamos de banco material A (100-0-0)", "Excavaciones prestamos de banco material B (0-100-0)" y "Excavaciones prestamos de banco material C (0-0-100)" los cuales no son necesarios para el desarrollo de los trabajos,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 19 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO, (Anexar el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios), **se presenta incompleto, no anexa el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios solicitada en las bases de la convocatoria,** de acuerdo con lo

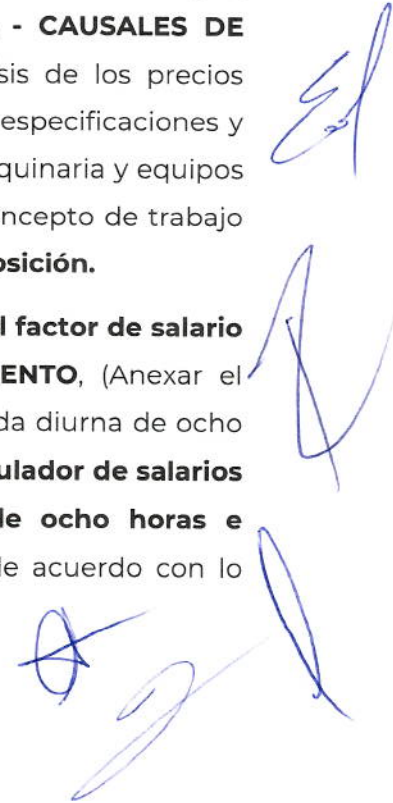

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 26 c de la Propuesta Económica - Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros - c) De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO PUM presenta inconsistencias, ya que no se refleja los insumos de la partida "MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" con los siguientes conceptos: clave A301 - Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del subtramo del km 5+500 al km 7+470.493, por unidad de obra terminada; clave A302 - Dictamen técnico de Daños del subtramo del Dictamen km 5+500 al km 7+470.493, por unidad de obra terminada y clave A303 - Seguimiento a las condicionantes en materia de impacto Ambiental del subtramo del km 5+500 al km 7+470.493, por unidad de obra terminada", de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

EMPRESA: HIDRO-CASA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o


DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **su integración es incorrecta, ya que en el cálculo de la utilidad (Anexo 23) se refleja un porcentaje diferente al utilizado en todas las tarjetas de precios unitarios, afectando el monto total de la proposición;** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 22.**-Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la integran; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 21 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, Anexar el presupuesto detallado del control de calidad (por concepto de trabajo con sus pruebas asociadas de campo y laboratorio) y el programa de actividades del control de calidad de la obra, en hoja membretada del laboratorio **su integración es incorrecta ya que no se considera dentro del rubro HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES montos y porcentajes en la "Cuota patronal del seguro social e impuestos adicionales sobre remuneraciones pagadas" para el Personal Directivo, Personal Técnico (Campo y Oficina), Personal Administrativo y Personal en Transito incisos 1 al 4; así mismo en el rubro de SERVICIOS – Estudios de investigación (Laboratorios) el importe indicado es diferente al presupuesto detallado del control de calidad de los trabajos,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 20.**-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"

El Anexo 22 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que en su caso se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el residente y el indicador económico que se aplicará. Anexar tabulador económico utilizado, **su integración es incorrecta, ya que la tasa de intereses utilizada en dicho cálculo es diferente al indicador económico que se anexa a la proposición, afectando considerablemente el resultado final del porcentaje de financiamiento**, de acuerdo con lo establecido en la **base DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 21.-**Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

II.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTO SOLVENTE.

De la evaluación integral de las proposiciones se determina lo siguiente:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)	% CON RESPECTO A LA MÁS BAJA
CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 28,899,335.18	0%

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"


II.1.- Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos Legal- Administrativo y Técnico - Económico, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA a esta Licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes, conforme a lo establecido en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA .

III.- NOMBRE DEL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por: **CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V., cuyo importe de la proposición es de \$ 28,899,335.18 (veintiocho millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 18/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de Ejecución de los trabajos de 140 días naturales, contados a partir de 1 día natural después de la firma del instrumento contractual.**

Por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por LA CONVOCANTE y garantizar el cumplimiento, en tiempo y forma, del contrato respectivo..

IV.- NOMBRE, FIRMA, CARGO Y FACULTAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE INDICANDO NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.




DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO"



POR EL ÁREA REQUINENTE Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Vladimir Ortiz Sánchez	Director de Área con las Funciones del Programa de Infraestructura Indígena	
José Hernández Gómez	Director de Área Adscrito a la Coordinación General de Infraestructura Indígena	

POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	

Usuarios CompraNet

Por este medio les informamos que por causas ajenas a esta Dependencia y al desempeño de la plataforma de CompraNet, a partir de las 16:00 horas del viernes 15 de julio de 2022, se suscitaron fallas técnicas en la infraestructura que hospeda dicha plataforma, limitando con ello su operación.

Por lo antes descrito, se **SUSPENDE TEMPORALMENTE** hasta nuevo aviso el uso de CompraNet, lo que se informará para el inicio o reanudación de los actos y procedimientos de contratación.

Atentamente:

Unidad De Política De Contrataciones Públicas

GOBIERNO DE MÉXICO

Enlaces

- Participa
- Datos
- Publicaciones Oficiales
- Portal de Obligaciones de Transparencia
- Sistema Infomex
- INAI

¿Qué es gob.mx?

Es el portal Único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](#)

English

- Temas
- Declaración de Accesibilidad
- Aviso de privacidad Integral
- Aviso de privacidad simplificado
- Términos y Condiciones
- Política de seguridad
- Marco Jurídico
- Mapa de sitio

Síguenos en

Handwritten signature in blue ink.
